



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Accordo di programma quadro

‘Area interna Bassa Valle’

Relazione di avanzamento annuale al 31 dicembre 2021¹

¹ Approvata, in data 15 dicembre 2022, dal Comitato per lo sviluppo locale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1669/2021.

Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate
Assessorat de l'éducation, de l'université, des politiques de la jeunesse, des affaires européennes et des
sociétés à participation régionale
Dipartimento politiche strutturali e affari europei
Département des politiques structurelles et des affaires européennes

INDICE

Acronimi	5
Nota metodologica	6
Premessa	8
1. Stato di 'cantierabilità' dei singoli interventi	11
2. Modifiche apportate all'Accordo di programma Quadro	12
3. Stato di attuazione dell'Accordo di Programma Quadro	21
3.1 Stato di attuazione interventi su legge di Stabilità	34
3.1.1 Istruzione	34
3.1.2 Salute	37
3.1.3 Mobilità	40
3.1.4. Associazione e assistenza tecnica	44
3.2 Stato di attuazione interventi su altri fondi	46
3.2.1 FESR	46
3.2.2 FSE	59
3.2.3 FEASR	67
4. Gestione e controllo	77
5. La governance dell'attuazione	78
6. Informazione e Pubblicità	80

INDICE DELLE TABELLE E DEI GRAFICI

Cartina 1: Comuni area interna Bassa Valle	10
Tabella 1: Numero progetti cantierabili per anno.....	11
Tabella 2: Raffronto tra la copertura finanziaria iniziale dell'APQ e quella al 31.12.2021	20
Tabella 3: Progetti derivanti dagli interventi di sviluppo locale per Programma, al 31.12.2021	23
Grafico 1: Avanzamento finanziario dell'APQ per anno (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle).....	24
Grafico 2: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per tipologia degli interventi (servizi essenziali e sviluppo locale), rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle)	25
Grafico 3: Capacità di impegno e di spesa degli interventi (servizi essenziali e sviluppo locale) riconducibili all'APQ, al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle)	25
Grafico 4: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per Programma, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle).....	26
Grafico 5: Capacità di impegno e di spesa dei Programmi riconducibili all'APQ, al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle).....	26
Grafico 6: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per Azione portante, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle).....	27
Grafico 7: Capacità di impegno e di spesa delle Azioni portanti riconducibili all'APQ, al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle)	27
Grafico 8: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per i Settori di intervento dei Progetti relativi ai servizi essenziali, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle)	28
Grafico 9: Capacità di impegno e di spesa dei Settori di intervento dei Progetti relativi ai servizi essenziali riconducibili all'APQ, al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle)	28
Tabella 4: Avanzamento finanziario dell'APQ 'Area interna Bassa Valle' per tipologia degli interventi (servizi essenziali e sviluppo locale), al 31.12.2021	31
Tabella 5: Avanzamento finanziario dell'APQ 'Area interna Bassa Valle' per Programma, al 31.12.2021	31
Tabella 6: Avanzamento finanziario dell'APQ 'Area interna Bassa Valle' per Azione portante, al 31.12.2021	32
Tabella 7: Avanzamento finanziario dell'APQ 'Area interna Bassa Valle' per i Settori di intervento dei Progetti relativi ai servizi essenziali, al 31.12.2021.....	33

Acronimi

ACT	Agenzia per la coesione territoriale (facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)
AGEA	Agenzia per le erogazioni in agricoltura
APQ	Accordo di programma quadro
BDU	Banca dati unitaria (dell'IGRUE)
CIPE	Comitato interministeriale per la programmazione economica
CTAI	Comitato tecnico aree interne (della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
DGR	Deliberazione della Giunta regionale (della Regione Autonoma Valle d'Aosta)
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
FESR	Fondo europeo per lo sviluppo regionale
FSE	Fondo sociale europeo
GAL	Gruppo di azione locale (della Valle d'Aosta)
GURI	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
IGRUE	Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze)
ISILTP	Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale (di Verrès)
LS	Legge di stabilità
PUC	Protocollo unico di colloquio (con la Banca dati unitaria dell'IGRUE)
RAA	Relazione di avanzamento annuale
RAVA	Regione Autonoma Valle d'Aosta
RUA	Responsabile unico dell'attuazione (dell'Accordo di programma quadro)
RUP	Responsabile unico del procedimento
RUPA	Responsabile unico delle parti (uno per la parte regionale - Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei – e uno per la parte locale – Segretario dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose)
SIAN	Sistema informativo agricolo nazionale
SISPREG2014	Sistema informativo della Politica regionale di sviluppo 2014/20 (della Valle d'Aosta)
SNAI	Strategia nazionale per le aree interne
SNM	Sistema nazionale di monitoraggio

Nota metodologica

La presente Relazione di avanzamento annuale (RAA) è elaborata in attuazione dell'art. 11, comma 1 dell'Accordo di programma quadro 'Area interna Bassa Valle', ove è previsto che la Regione trasmetta, annualmente, all'Agenzia per la coesione territoriale, un Rapporto di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e sui risultati raggiunti, che viene anche inoltrato anche al Comitato tecnico aree interne, ai fini del rispetto della previsione di cui al punto 5 della delibera CIPE n. 9 del 2015.

Le informazioni utilizzate nella RAA sono reperite, tramite un apposito modello predisposto dal RUA, presso i beneficiari degli interventi e dal sistema informativo regionale 'SISPREG2014'.

Nella Relazione sono rappresentati i dati di attuazione al 31.12.2021 e, in alcuni casi, è presente un raffronto con i dati contenuti nelle precedenti Relazioni.

Per una corretta comprensione dei dati inseriti nella RAA, è utile riassumere, in breve, il significato e le specificità dei seguenti termini ricorrenti con particolare riferimento all'attuazione finanziaria.

- **Dotazione finanziaria iniziale APQ:** corrisponde alle risorse finanziarie nominali disponibili per l'insieme degli interventi dell'APQ al momento della sottoscrizione dello stesso.
- **Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2021:** corrisponde alle risorse finanziarie nominali disponibili al 31.12.2021 per l'insieme degli interventi dell'APQ. Tale dotazione tiene conto, perciò, di eventuali variazioni intervenute a seguito della sottoscrizione dello stesso.
- **Finanziamento:** è la somma di tutte le fonti di finanziamento (pubbliche e, talvolta, private) che contribuiscono alla copertura finanziaria di un Progetto. Coincide, di norma, con il costo ammesso, tranne i casi in cui vi siano finanziamenti aggiuntivi.
- **Costo ammesso:** è il costo pubblico totale del Progetto approvato e ammesso al finanziamento del Programma di riferimento. Nella maggior parte dei casi l'importo del costo ammesso coincide con quello del finanziamento.
- **Impegni:** rappresentano la quota parte del finanziamento di un Progetto approvato che si è tradotta in obbligazioni giuridicamente vincolanti (per il FESR, affidamento della realizzazione di lavori, servizi e forniture; per il FSE, affidamenti di servizi e concessioni di contributi agli enti di formazione, alle istituzioni scolastiche e alle imprese), a seguito delle relative procedure. In quanto tali, rappresentano un indicatore utile a monitorare l'effettivo avvio delle attività di un Progetto.
- **Impegni ammessi:** rappresentano la quota parte degli impegni di un Progetto che risulta ammissibile a valere sul Programma di riferimento. Nella maggior parte dei casi l'importo del singolo impegno ammesso del Progetto coincide con l'importo del corrispondente impegno del Progetto, ma in alcuni casi può essere inferiore (si tratta, ad esempio, del caso in cui l'impegno giuridicamente vincolante del beneficiario è riferito all'importo complessivo del

contratto stipulato con il soggetto realizzatore del Progetto, di cui solo una quota parte è finanziata, e quindi risulta ammissibile, a valere sul Programma di riferimento).

- **Pagamenti:** sono le spese effettivamente pagate dal beneficiario di un Progetto e indicano, di norma, l'avanzamento effettivo della realizzazione delle attività.
- **Pagamenti ammessi:** rappresentano la quota parte dei pagamenti di un Progetto che risulta ammissibile a valere sul Programma di riferimento. Nella maggior parte dei casi l'importo del singolo pagamento ammesso del Progetto coincide con l'importo del corrispondente pagamento del Progetto, ma in alcuni casi può essere inferiore.

Si precisa che tutti i valori riportati nella presente RAA sono da intendersi al netto dei Progetti oggetto di rinuncia, operazione eventualmente effettuata da parte dei beneficiari prima o dopo l'istruttoria dei progetti, oppure dopo l'approvazione degli stessi.

Visto che negli allegati all'APQ si fa riferimento sia al costo complessivo degli interventi, sia al costo degli stessi nella sola area interna Bassa Valle, nella presente RAA sono solitamente riportati – oltre ai dati di attuazione riferiti alla sola area interna – anche i dati complessivi riferiti alle eventuali ricadute degli interventi su un territorio più ampio rispetto all'area interna Bassa Valle. Nel caso in cui non sia stato possibile disaggregare i dati complessivi di un intervento per determinare le ricadute sull'area interna Bassa Valle, tali ricadute sono state stimate applicando, in assenza di elementi più attendibili, il peso percentuale derivante dal rapporto tra il costo stimato dell'intervento attribuibile all'area interna e il costo complessivo dello stesso (con riferimento ai costi riportati nell'allegato 2a all'APQ e, in particolare, al punto 3 della pertinente scheda intervento).


Premessa

Titolo dell'APQ	Accordo di programma quadro Regione Autonoma Valle d'Aosta 'Area interna Bassa Valle'.
Data approvazione Strategia d'Area	La Strategia dell'area interna Bassa Valle è stata approvata contestualmente all'APQ in data 16 febbraio 2020 (data di sottoscrizione dell'APQ da parte dell'ultimo firmatario – Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute – mentre il primo firmatario – Direttore dell'Area progetti e strumenti dell'Agenzia per la coesione territoriale – ha apposto la propria firma in data 20 dicembre 2017). A livello regionale, la Strategia è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1678, in data 27 novembre 2017, contestualmente all'approvazione della stipula del relativo APQ.
Programmi coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strategia Aree interne Regione Valle d'Aosta – Linea Bassa Valle (2018AREAINVALD); ▪ Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) – (2014IT16RFOP020); ▪ Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE) – (2014IT05SFOP011); ▪ Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR) – (2014IT06RDRP013).
RUA e RUPA regionale	Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Soggetto capofila e RUPA locale	Segretario dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.
LS di riferimento per gli interventi relativi ai servizi essenziali	Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (LS 2014) e successive modifiche ed integrazioni (art. 1, commi 13-17).
Delibera CIPE di assegnazione delle risorse statali per gli interventi riconducibili ai servizi essenziali	Delibera CIPE n. 9, del 28 gennaio 2015 (GURI n. 91, del 20 aprile 2015).

Attivazione delle procedure di erogazione finanziaria su LS	<p>In data 27 febbraio 2019 il RUA ha inviato ai competenti Uffici dell'IGRUE la richiesta di anticipazione delle risorse statali per il trasferimento diretto ai beneficiari degli interventi relativi ai servizi essenziali delle risorse statali di cui all'art.1, comma 13, della legge di stabilità n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Nel dettaglio, rispetto alla quota totale di risorse riferite alla linea di finanziamento 'legge di stabilità' assegnata all'APQ 'Area interna Bassa Valle', pari a 3.740.000,00 euro, è stato chiesto all'IGRUE di rendere disponibile un'anticipazione corrispondente a circa il 17% di tale importo, pari a 636.059,00 euro, di cui 140.000,00 euro per il settore 'Istruzione', 183.200,00 euro per il settore 'Sanità', 242.859,00 euro per il settore 'Mobilità' e 70.000,00 euro per 'Assistenza tecnica'. A seguito della suddetta richiesta, la Banca d'Italia ha provveduto, in data 22 marzo 2019, ad accreditare ai singoli beneficiari l'importo dell'anticipo richiesto.</p> <p>Alla data di riferimento della presente RAA non sono ancora stati richiesti pagamenti intermedi.</p>
Popolazione	<p>L'area interna Bassa Valle, situata all'estremità orientale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, si estende su 812 km², con una popolazione complessiva di 22.446 unità (dati ISTAT 2020) e comprende 23² comuni ripartiti in tre Unités des Communes (cfr. Cartina 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unités des Communes valdôtaines Mont-Rose: comuni di Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset e Pont-Saint-Martin; ▪ Unités des communes valdôtaines Walser : comuni di Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité; ▪ Unités des Communes valdôtaines Evançon : comuni di Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Emarèse, Issogne, Montjovet, Verrès.
Quadro copertura finanziaria al 31.12.2021 delle sole risorse riconducibili all'area interna Bassa Valle (per il raffronto con la dotazione iniziale cfr. Tabella 2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3.740.000,00 euro – Legge di stabilità n. 147/2013 sui servizi essenziali; ▪ 3.758.000,00 euro – Risorse aggiuntive regionali sui servizi essenziali; ▪ 3.379.866,89 euro – Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR); ▪ 803.000,00 euro – Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE); ▪ 5.497.068,47 euro – Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR); ▪ 17.177.935,36 euro – Totale risorse area interna Bassa Valle.

2 Dal 1° gennaio 2017, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 2016, n. 621, il Comune di Emarèse, già facente parte dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, è entrato a far parte dell'Unité des Communes valdôtaines Evançon, facendo, così, salire il numero di comuni a 23 rispetto ai 22 comuni riportati nella Strategia dell'Area interna Bassa Valle.

Cartina 1: Comuni area interna Bassa Valle

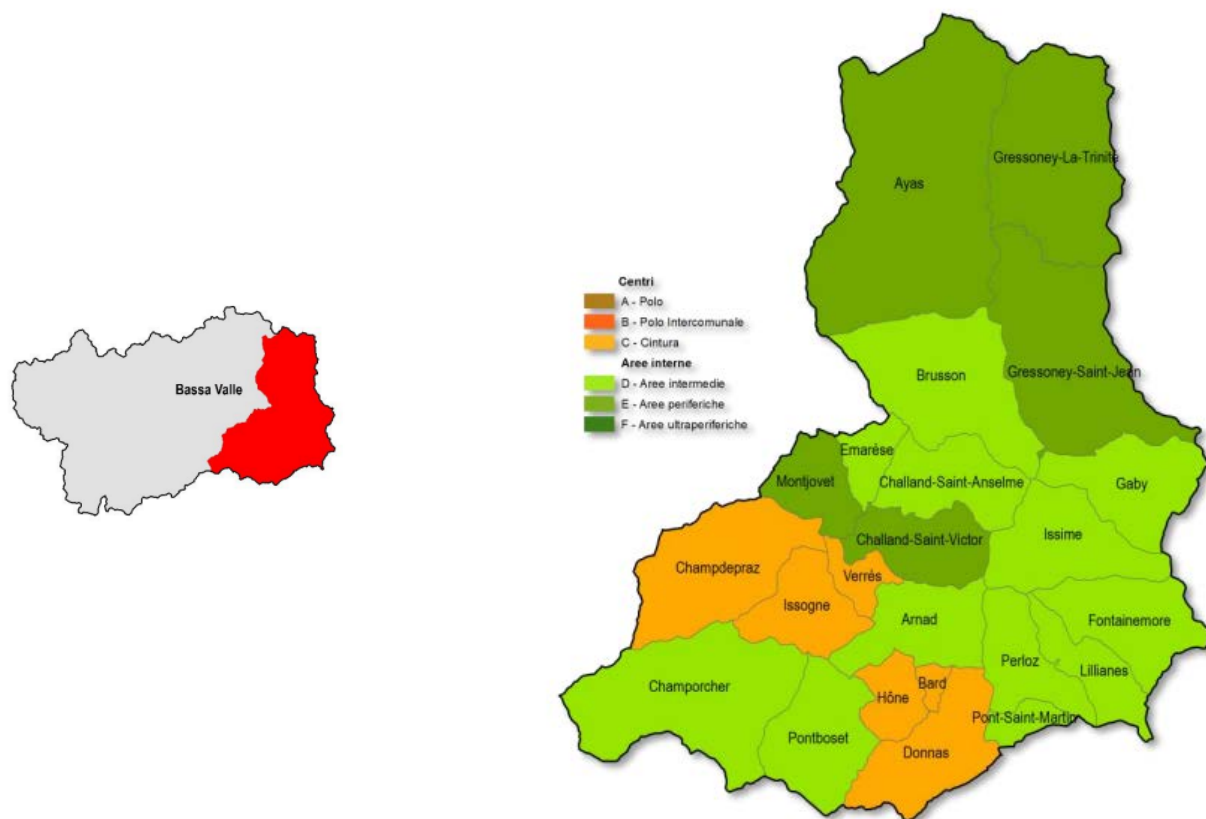

1. STATO DI 'CANTIERABILITÀ' DEI SINGOLI INTERVENTI**Tabella 1: Numero progetti cantierabili per anno**

Anno	N. Interventi cantierabili (All. 3)*	N. Interventi non cantierabili	N. Totale Interventi
2021	25	5	30
2020	25	5	30
2019	23	6	29
2018	19	9	28
2017** (Anno di sottoscrizione APQ)	3	24	27

* All'atto della sottoscrizione dell'APQ si erano intesi cantierabili i soli 3 interventi inerenti opere pubbliche riconducibili ai servizi essenziali. A partire dall'anno 2018, invece, sono stati considerati cantierabili:

- per gli Interventi intesi come 'Scheda Azione' (dalla quale derivano i singoli Progetti, selezionati tramite un avviso ad evidenza pubblica), gli interventi con almeno un progetto approvato nell'ambito dell'area interna Bassa Valle;
- per gli interventi definiti fin dall'origine come singoli Progetti, i soli interventi approvati.

** Il 2017 è l'anno in cui è stata apposta la firma del primo firmatario dell'APQ (in data 20 dicembre 2017, a cura del Direttore dell'Area progetti e strumenti dell'Agenzia per la coesione territoriale). Il processo di sottoscrizione digitale dell'APQ, invece, si è concluso in data 16 febbraio 2018 con la sottoscrizione dell'ultimo firmatario (Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute).

2. MODIFICHE APPORTATE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Si riportano, di seguito, in ordine cronologico, le modifiche apportate alle schede intervento di cui all'allegato 2a dell'APQ, formalmente approvate.

- **Intervento 'Ciclovia intercomunale della media Valle del Lys (MB.3)' – Prima modifica**
 - **Data invio proposta modifica all'ACT da parte del RUA:** 1° marzo 2019, con nota prot. n. 655 del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
 - **Principali modifiche proposte:** a seguito delle valutazioni effettuate durante la prima fase di avvio dell'attuazione dell'intervento e dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 2 '*Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*' – che all'art. 2, comma 2 ha definito le 'ciclovie' – il Responsabile dell'attuazione dell'intervento ha proposto di realizzare una ciclovia, che meglio si adatta al particolare territorio montano, in luogo della pista ciclo-pedonale prevista in origine. Sono stati anche proposti: la parziale revisione del tracciato (anche a causa di episodi di erosione del suolo in località Guillemore, dove era inizialmente previsto il percorso ciclo-pedonale); l'allungamento del tracciato da 11 km a 14 km a parità di stanziamento economico (grazie ai costi inferiori rispetto alla realizzazione di una pista ciclo-pedonale); lo slittamento dei tempi previsti per la conclusione dell'intervento (dal 30.11.2019 al 31.12.2020) e la conseguente rimodulazione del Cronoprogramma finanziario per anno.
 - **Iter di condivisione della proposta di modifica:** con nota prot. n. 5719, in data 8 aprile 2019, dell'ACT è stata avviata la consultazione del Tavolo dei sottoscrittori, conclusasi con parere positivo (in considerazione dei pareri favorevoli forniti dalle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), come comunicato dalla stessa ACT con nota prot. n. 8195, in data 22 maggio 2019.
- **Intervento 'Pista ciclabile della Bassa Valle (MB.2)' – Prima modifica**
 - **Data invio proposta modifica all'ACT da parte del RUA:** 6 febbraio 2020, con nota prot. n. 441 del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
 - **Principali modifiche proposte:** a causa della presenza di ambiti inedificabili sede di frana nel tratto di pista ciclabile concernente il territorio del Comune di Bard, il Responsabile dell'attuazione dell'intervento ha proposto di ridurre il percorso originariamente previsto da Pont-Saint-Martin a Hône al solo tratto Pont-Saint-Martin/Donnas, pur mantenendo uno sviluppo complessivamente invariato, in termini di lunghezza, in quanto il percorso principale della pista ciclabile sarà integrato con tratti secondari di raccordo a mete e servizi posti nei comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas e/o con il collegamento con la pista ciclabile piemontese in corrispondenza del confine con il comune di Carema. Ad avvenuta ultimazione delle indagini geologiche sul versante in sponda sinistra della Dora Baltea, in esito alle quali vi sarà maggior chiarezza sul tracciato preferibile e sui relativi costi di realizzazione, l'intendimento della Regione è di proseguire l'intervento nel tratto compreso fra Donnas e Hône (anche con l'obiettivo di dare continuità al più ampio progetto di pista ciclabile da Pont-Saint-Martin a Courmayeur), proponendo una seconda scheda intervento. Sono stati anche proposti: la marginale integrazione delle voci di spesa; lo slittamento dei tempi previsti per la conclusione dell'intervento (dal

30.11.2020 al 31.12.2022) e la conseguente rimodulazione del Cronoprogramma finanziario per anno.

- **Iter di condivisione della proposta di modifica:** con nota prot. n. 9855, in data 31 luglio 2020, dell'ACT è stata avviata la consultazione del Tavolo dei sottoscrittori, conclusasi con parere positivo (in considerazione dei pareri favorevoli forniti dalle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), come comunicato dalla stessa ACT con nota prot. n. 13044, in data 21 ottobre 2020.

▪ **Intervento 'La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – Accademia e bottega (IS.1.1.1)' – Prima modifica**

- **Data invio proposta modifica all'ACT da parte del RUA:** 12 marzo 2021, con nota prot. n. 1037 del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
- **Principali modifiche proposte:** l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha fortemente modificato il contesto scolastico in cui l'intervento avrebbe dovuto svilupparsi, comportando, conseguentemente, anche una riprogrammazione delle attività previste. In particolare, il Responsabile dell'attuazione dell'intervento ha proposto di sopprimere le attività rivolte alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1° grado e di rivedere parte dei percorsi formativi previsti per la scuola secondaria di 2° grado. Le modifiche proposte non incidono sulla spesa complessiva dell'intervento, che rimane pari ad euro 350.000,00, ma impattano unicamente sulla rimodulazione del cronoprogramma finanziario (ora articolato nelle annualità 2021, 2022 e 2023) e sullo slittamento dei tempi previsti per la conclusione dell'intervento (dal 31.12.2019 al 31.12.2023).
- **Iter di condivisione della proposta di modifica:** con nota prot. n. 7157, in data 8 aprile 2022, l'ACT ha trasmesso alle Amministrazioni competenti la proposta di modifica dell'intervento ai fini della presa d'atto da parte del Tavolo dei sottoscrittori. Le modifiche proposte si intendono, pertanto, approvate in tale data.

▪ **Intervento 'Un territorio a tutta salute - Medicina d'iniziativa, IFeC e empowerment di comunità (SN.1)' – Prima modifica**

- **Data invio proposta modifica all'ACT da parte del RUA:** 31 marzo 2021, con nota prot. n. 1278 del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
- **Principali modifiche proposte:** l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – oltre a provocare pesanti effetti sull'organizzazione sanitaria, imponendo di ripensare a modelli di intervento e strategie – ha avuto un impatto diretto anche su questo Progetto provocando, tra l'altro, la sospensione del servizio dell'Infermiera di Famiglia e di Comunità (IFeC). Vi è stata, inoltre, la necessità di adeguare le attività di formazione e animazione del territorio (prevedendo una nuova metodologia che metta al centro la comunità e il suo ruolo nel favorire la diffusione di corretti stili di vita) e di rafforzare il sistema di emergenza attraverso l'acquisto di 2 ambulanze da assegnare ad associazioni di volontari del soccorso operanti nel territorio dell'area interna Bassa Valle. Tali modifiche hanno anche reso necessario: l'adeguamento dei risultati attesi, delle voci di spesa e dei target degli indicatori di realizzazione; lo slittamento dei tempi previsti per la conclusione dell'intervento (dal 31.12.2020 al 28.02.2022) e la conseguente rimodulazione del Cronoprogramma finanziario per anno.

- **Iter di condivisione della proposta di modifica:** con nota prot. n. 7157, in data 8 aprile 2022, l'ACT ha trasmesso alle Amministrazioni competenti la proposta di modifica dell'intervento ai fini della presa d'atto da parte del Tavolo dei sottoscrittori. Le modifiche proposte si intendono, pertanto, approvate in tale data.
- **Intervento 'Supporto alla progettazione, gestione, monitoraggio e controllo della Strategia dell'area interna Bassa Valle (AT.1)' – Prima modifica**
 - **Data invio proposta modifica all'ACT da parte del RUA:** 25 giugno 2021, con nota prot. n. 2175 del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
 - **Principali modifiche proposte:** l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto un impatto diretto anche su questo Progetto rendendo necessario prevedere: una nuova voce di spesa finalizzata ad utilizzare le risorse dell'intervento non impegnate (pari a 47.633,59 euro) per finanziare gli oneri di una risorsa umana dedicata in via esclusiva alla gestione e coordinamento tecnico-amministrativo della Strategia; lo slittamento dei tempi previsti per la conclusione dell'intervento (dal 31.12.2021 al 31.12.2024) e la conseguente rimodulazione del Cronoprogramma finanziario per anno.
 - **Iter di condivisione della proposta di modifica:** con nota prot. n. 7157, in data 8 aprile 2022, l'ACT ha trasmesso alle Amministrazioni competenti la proposta di modifica dell'intervento ai fini della presa d'atto da parte del Tavolo dei sottoscrittori. Le modifiche proposte si intendono, pertanto, approvate in tale data.
- **Intervento 'Servizio di trasporto flessibile nell'area interna Bassa Valle (MB.1)' – Prima modifica**
 - **Data invio proposta modifica all'ACT da parte del RUA:** 21 settembre 2021, con nota prot. n. 2918 del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
 - **Principali modifiche proposte:** viste le difficoltà riscontrate nell'attuazione dell'intervento originariamente previsto, il Responsabile dell'attuazione dell'intervento, al fine di offrire un servizio effettivamente fruibile dalla popolazione e dai frequentatori della Bassa Valle, ha proposto la variazione dei destinatari del servizio 'sociale' (studenti anziché anziani) e il reindirizzamento del servizio 'generalista' alla fruizione delle aree naturali protette della Bassa Valle. Di conseguenza, è stato necessario prevedere la revisione dei target relativi agli indicatori di realizzazione, posticipare i tempi previsti per la conclusione dell'intervento (dal 30.09.2021 al 31.12.2025) e rimodulare il Cronoprogramma finanziario per anno.
 - **Iter di condivisione della proposta di modifica:** con nota prot. n. 7157, in data 8 aprile 2022, l'ACT ha trasmesso alle Amministrazioni competenti la proposta di modifica dell'intervento ai fini della presa d'atto da parte del Tavolo dei sottoscrittori. Le modifiche proposte si intendono, pertanto, approvate in tale data.
- **Intervento 'Realizzazione di un convitto annesso al polo scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado, a Verrès (IS.1.3)' – Prima modifica**
 - **Data invio proposta modifica all'ACT da parte del RUA:** 12 ottobre 2021, con nota prot. n. 3105 del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
 - **Principali modifiche proposte:** i contenuti dell'Intervento non hanno subito modifiche, ma le ripercussioni indotte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui tempi di attuazione dello stesso e il riconoscimento per il fabbricato oggetto di recupero di un

interesse locale per aspetti architettonico-tipologici e storico-sociali – che ha vincolato il soggetto attuatore a ricorrere all'affidamento del servizio di progettazione mediante la procedura del 'concorso di progettazione', anziché tramite le consuete modalità di affidamento (procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) – hanno reso necessario prevedere: lo slittamento dei tempi previsti nel Cronoprogramma delle attività (in particolare, la data di conclusione dell'Intervento è passata dal 5 ottobre 2021 al 1° dicembre 2025); la conseguente rimodulazione del Cronoprogramma finanziario per anno (rispetto al quale sono stati aggiunti anche 700.000,00 euro di risorse finanziarie regionali sull'annualità 2025, portando l'ammontare di tali risorse da 3.058.000,00 euro a 3.758.000,00 euro, per un totale complessivo pari a 5 milioni di euro, considerando anche le invariate risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato, pari a 1.242.000,00 euro); la rimodulazione degli importi finanziari per singola voce di spesa.

- **Iter di condivisione della proposta di modifica:** con nota prot. n. 7157, in data 8 aprile 2022, l'ACT ha trasmesso alle Amministrazioni competenti la proposta di modifica dell'intervento ai fini della presa d'atto da parte del Tavolo dei sottoscrittori. Le modifiche proposte si intendono, pertanto, approvate in tale data.

▪ **Intervento 'Supporto e potenziamento delle organizzazioni del terzo settore in ambito socio-sanitario e sociale (SN.2)' – Prima modifica**

- **Data invio proposta modifica all'ACT da parte del RUA:** 4 novembre 2021, con nota prot. n. 3367 del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
- **Principali modifiche proposte:** le difficoltà procedurali e contenutistiche emerse nel corso dell'attuazione dell'intervento nonché le problematiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno reso necessario prevedere: la sostituzione delle attività inizialmente previste (salvo le attività di formazione già realizzate) con l'acquisto di un'ambulanza e di ecografi portatili corredati dalla strumentazione necessaria per il loro funzionamento; la revisione dei risultati attesi nonché degli indicatori di realizzazione e di risultato; lo slittamento dei tempi previsti per la conclusione dell'intervento (dal 30.06.2021 al 31.12.2022) e la conseguente rimodulazione del Cronoprogramma finanziario per anno; l'incremento del costo totale dell'intervento (da 80.000,00 euro a 95.000,00 euro), grazie a 15.000,00 euro di risorse finanziarie messe a disposizione dalle Unités des Communes valdôtaines Evançon, Mont-Rose e Walser per contribuire all'acquisto degli ecografi portatili.
- **Iter di condivisione della proposta di modifica:** con nota prot. n. 7157, in data 8 aprile 2022, l'ACT ha trasmesso alle Amministrazioni competenti la proposta di modifica dell'intervento ai fini della presa d'atto da parte del Tavolo dei sottoscrittori. Le modifiche proposte si intendono, pertanto, approvate in tale data.

▪ **Intervento 'Ciclovía intercomunale della media Valle del Lys (MB.3)' – Seconda modifica**

- **Data invio proposta modifica all'ACT da parte del RUA:** 22 novembre 2021, con nota prot. n. 3574 del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
- **Principali modifiche proposte:** slittamento dei tempi previsti per la conclusione dell'intervento (dal 31.12.2020 al 31.12.2023) e conseguente rimodulazione del Cronoprogramma finanziario per anno per: problematiche dovute alla pandemia;

necessità di attivare procedure espropriative al fine di acquisire alcune aree per la realizzazione della ciclovia; ritardi alla messa in sicurezza della frana in località Theilly, per la quale sono state attivate le progettazioni da parte del Comune di Fontainemore.

- **Iter di condivisione della proposta di modifica:** con nota prot. n. 7157, in data 8 aprile 2022, l'ACT ha trasmesso alle Amministrazioni competenti la proposta di modifica dell'intervento ai fini della presa d'atto da parte del Tavolo dei sottoscrittori. Le modifiche proposte si intendono, pertanto, approvate in tale data.

Si riportano, altresì, in ordine cronologico, le modifiche proposte alle schede intervento di cui all'allegato 2a dell'APQ non ancora formalmente approvate.

▪ **Interventi 'La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – Alternanza scuola-lavoro (IS.1.1.2)' e 'La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – Imprenditorialità giovanile (IS.1.1.3)'**
– Prima modifica

- **Data invio proposta modifica all'ACT da parte del RUA:** 19 luglio 2021, con nota prot. n. 2416 del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
- **Principali modifiche proposte:** nel trasmettere all'ACT l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi in argomento, il RUA ha precisato che le attività di 'Alternanza scuola-lavoro' (IS.1.1.2) e di 'Imprenditorialità giovanile' (IS.1.1.3) sono iniziate nel corso dell'anno scolastico 2017/18 (come previsto dalle relative schede intervento allegate all'APQ) con la prima sessione di presentazione dei progetti che ha visto, limitatamente all'area interna Bassa Valle, l'approvazione di 2 progetti riconducibili all'intervento IS.1.1.2 e un progetto riconducibile all'intervento IS.1.1.3. Le successive sessioni di presentazione dei progetti, previste per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, non sono, invece, state avviate con le modalità e le risorse individuate dall'APQ, poiché le attività di alternanza scuola-lavoro e di imprenditorialità giovanile – entrate a far parte del curriculum scolastico ai sensi della legge 13 luglio 2005, n. 107 – sono state finanziate, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 29 marzo 2018, n. 4, con fondi regionali. Nonostante l'utilizzo di una fonte finanziaria diversa rispetto a quella prevista dall'APQ, gli interventi sono stati attuati perseguendo le stesse finalità inizialmente previste, con la sola differenza che i fondi regionali, essendo stati erogati cumulativamente, non consentono di dar conto dell'avanzamento finanziario per singolo intervento. Pertanto, il RUA, al fine di poter valorizzare le attività realizzate anche a valere sui fondi regionali, ha proposto – pur mantenendo inalterate le schede intervento IS.1.1.2 e IS.1.1.3 allegate all'APQ – di dar conto dell'attuazione dei due interventi nell'ambito delle prossime Relazioni di avanzamento annuale dell'APQ aggiornando il quadro d'insieme delle risorse complessivamente destinate agli stessi.
- **Iter di condivisione della proposta di modifica:** l'ACT ha comunicato informalmente alla struttura di riferimento del RUA, via email in data 2 e 16 novembre 2021, la necessità di modificare anche le singole schede intervento (lasciandole distinte) aggiornando il quadro finanziario, i tempi di attuazione ed ogni altra modifica effettuata rispetto alle stesse schede allegate all'APQ, al fine di poter avviare la procedura di consultazione del Tavolo dei sottoscrittori, fermo restando la possibilità di dar conto dell'attuazione degli interventi in argomento nell'ambito delle prossime Relazioni di avanzamento annuale.

A seguito della suddetta comunicazione informale dell'ACT, il RUA ha provveduto a formalizzare la richiesta di modifica delle 2 schede intervento, come di seguito rappresentato.

- **Data invio proposta modifica all'ACT da parte del RUA:** 2 settembre 2022, con nota prot. n. 2233 del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
 - **Principali modifiche proposte:**
 - scheda intervento IS.1.1.2 'Alternanza scuola-lavoro': all'interno del punto 3 e del cronoprogramma finanziario sono state ridotte le risorse afferenti al Programma FSE 2014/20, poiché ricondotte ai soli 2 progetti finanziati nell'area interna Bassa Valle nell'anno scolastico 2017/18, mentre sono state inserite le risorse regionali erogate, dall'anno scolastico 2018/19 all'anno scolastico 2021/22, in via cumulativa per le attività di 'Alternanza scuola-lavoro' e di 'Imprenditorialità giovanile', che hanno portato alla conseguente ridenominazione della scheda intervento in '*IS 1.1.2 - La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo - Alternanza scuola-lavoro*' e '*Imprenditorialità giovanile (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO)*';
 - scheda intervento IS.1.1.3 'Imprenditorialità giovanile': all'interno del punto 3 e del cronoprogramma finanziario sono state ridotte le risorse afferenti al Programma FSE 2014/20, poiché si è dato conto delle sole risorse relative all'unico progetto finanziato nell'area interna Bassa Valle nell'anno scolastico 2017/18;
 - per entrambe le schede intervento: sono stati rimodulati i cronoprogrammi delle attività ed è stata aggiornata la denominazione del Soggetto attuatore indicato al punto 14, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale.
 - **Iter di condivisione della proposta di modifica:** con nota prot. n. 19251, in data 16 settembre 2022, dell'ACT è stata avviata la consultazione del Tavolo dei sottoscrittori invitando gli stessi ad esprimersi entro 30 giorni.
- **Interventi 'La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – Studenti in movimento – Stage aziendali all'estero (IS.1.1.4.1)' e 'La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – Studenti in movimento – Mobilità linguistica all'estero (IS.1.1.4.2)' – Prima modifica**
- **Data invio proposta modifica all'ACT da parte del RUA:** 5 ottobre 2021, con nota prot. n. 3041 del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
 - **Principali modifiche proposte:** la scheda intervento IS.1.1.4 'La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – Studenti in movimento - Stage all'estero', inserita nell'allegato 2a dell'APQ 'Area interna Bassa Valle', è stata suddivisa, sin dalle prime fasi di attuazione, nei 2 interventi sopra citati (IS.1.1.4.1 e IS.1.1.4.2), rispetto ai quali il Responsabile dell'attuazione degli stessi, di concerto con i soggetti interessati (Soggetto capofila, RUA e Dipartimento politiche del lavoro e della formazione), ha proposto di convertirli in due nuovi interventi, vista la mancata risposta delle istituzioni scolastiche afferenti all'area interna Bassa Valle rispetto agli avvisi pubblici per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 a valere sull'intervento IS.1.1.4.1 e la mancata pubblicazione dell'avviso per l'anno scolastico 2019/20, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sull'intervento IS.1.1.4.2. Pertanto, anche alla luce delle nuove esigenze manifestate dall'area interna Bassa Valle, sono state proposte due

nuove schede intervento – denominate SL.5.1 '*Interventi per la formazione di giovani e adulti*' e SL.5.2 '*Interventi per la formazione continua interaziendale dei dipendenti e/o titolari delle micro, piccole, medie e grandi imprese*' – sostitutive degli interventi IS.1.1.4.1 e IS.1.1.4.2, che comporterebbero l'inserimento di una nuova Azione portante all'interno della Strategia dell'area interna Bassa Valle denominata '*Formazione per la crescita del potenziale umano*', già prevista nella Strategia dell'area interna Grand-Paradis per analoghi interventi. Per i due nuovi interventi si manterrebbe l'impegno finanziario a carico del Programma FSE, per un importo complessivo di 130.000,00 euro, quale ricaduta stimata sull'area interna Bassa Valle.

- **Iter di condivisione della proposta di modifica:** con nota prot. n. 17165, in data 10 agosto 2022, dell'ACT è stata avviata la consultazione del Tavolo dei sottoscrittori invitando gli stessi ad esprimersi entro 30 giorni.

▪ **Intervento 'Supporto e potenziamento delle organizzazioni del terzo settore in ambito socio-sanitario e sociale (SN.2)' – Seconda modifica**

- **Data invio proposta modifica all'ACT da parte del RUA:** 27 aprile 2022, con nota prot. n. 1195 del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
- **Principali modifiche proposte:** al fine di far fronte all'aumento dei costi previsti per l'acquisto dell'autoambulanza, il Responsabile dell'attuazione dell'intervento ha proposto: l'inserimento, tra i soggetti attuatori, dell'ANPAS – Comitato Regionale Valle d'Aosta – Federazione Regionale del Soccorso VDA-ODV, che interverrà nell'acquisto dell'autoambulanza potendo beneficiare del contributo previsto dall'art. 76, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (pari all'importo dell'IVA sul prezzo complessivo di acquisto della stessa); l'incremento del costo totale dell'intervento (da 95.000,00 euro a 110.000,00 euro), grazie a ulteriori 15.000,00 euro di risorse finanziarie messe a disposizione dalle Unités des Communes valdôtaines Evançon, Mont-Rose e Walser, che portano il contributo complessivo delle stesse a 30.000,00 euro. Da tale incremento di risorse consegue una revisione degli importi riportati nelle tabelle 'Tipologie di spesa' e 'Cronoprogramma finanziario'.
- **Iter di condivisione della proposta di modifica:** con nota prot. n. 17165, in data 10 agosto 2022, dell'ACT è stata avviata la consultazione del Tavolo dei sottoscrittori invitando gli stessi ad esprimersi entro 30 giorni.

▪ **Intervento 'Servizio di trasporto flessibile nell'area interna Bassa Valle (MB.1)' – Seconda modifica**

- **Data invio proposta modifica all'ACT da parte del RUA:** 11 maggio 2022, con nota prot. n. 1360 del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.
- **Principali modifiche proposte:** viste le criticità emerse nell'espletamento del servizio 'generalista', indirizzato alla fruizione durante il periodo estivo delle aree naturali protette della Bassa Valle, il Responsabile dell'attuazione dell'intervento ha proposto: la revisione delle tratte del servizio 'generalista' (stralcio della tratta Champorcher/Parco Naturale del Mont Avic località Dondena, estensione della tratta Champdepraz/Parco Naturale del Mont Avic località Chevrère, parziale ridefinizione della tratta Fontainemore/Riserva Naturale Mont Mars); un lieve incremento del target dell'indicatore di realizzazione relativo alle corse annuali riconducibili al servizio 'generalista' (da 600 a 610); la rimodulazione dei

tempi previsti per la fase 'Stipula contratto' (da 01.02.2022 a 01.06.2022 per la 'Data inizio prevista' e da 01.06.2022 a 01.06.2023 per la 'Data fine prevista').

- **Iter di condivisione della proposta di modifica:** con nota prot. n. 17165, in data 10 agosto 2022, dell'ACT è stata avviata la consultazione del Tavolo dei sottoscrittori invitando gli stessi ad esprimersi entro 30 giorni.

Nella seguente Tabella 2 si riporta il raffronto tra la copertura finanziaria iniziale dell'APQ e quella al 31.12.2021³, sia per quanto concerne i dati complessivi (che registrano un incremento di poco più di 4,5 milioni di euro, pari al +16,8%), sia per quelli riferiti alla sola area interna Bassa Valle (che registrano un incremento di quasi 1,8 milioni di euro, pari al +11,5%).

Prendendo a riferimento le sole variazioni relative all'area interna Bassa Valle, si evidenzia che:

- il maggior incremento di risorse è attribuibile al Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR (+1,27 milioni di euro, pari a +60,3%), dovuto, principalmente, alle risorse degli interventi '*SL.1.3 bis – Bassa Via della Valle d'Aosta - Banca dati turismo*' (+83 mila euro) e '*SL.4.1 bis – Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta - Rafforzamento servizi offerti presso l'incubatore di impresa e creazione di un acceleratore di impresa*' (+1,1 milioni di euro), inizialmente non previsti nell'APQ (cfr. paragrafo 3.2.1);
- le risorse aggiuntive regionali sui servizi essenziali hanno registrato un incremento di 700 mila euro (+22,9%), riconducibile esclusivamente all'intervento '*IS.1.3 – Realizzazione di un convitto annesso al polo scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado, a Verrès*' (cfr. paragrafo 3.1.1);
- la sola fonte di finanziamento che registra una marginale diminuzione di risorse (-196 mila euro, pari a -3,4%) è il Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR), dovuta alla riduzione delle risorse previste per gli interventi '*SL.2.1 – Supporto alla cooperazione tra piccoli operatori agroalimentari e turistici*' (-403 mila euro) e '*SL.3.3 – Gestione e sfruttamento delle risorse forestali - Elaborazione di piani di gestione forestale*' (-20 mila euro), parzialmente compensate dall'incremento delle risorse per gli interventi '*SL.3.1 – Investimenti non produttivi - Recupero e manutenzione dei tradizionali muretti a secco*' (+171 mila euro) e '*SL.2.2 – Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie*' (+56 mila euro) (cfr. paragrafo 3.2.3).

3 Non sono comprese le variazioni derivanti da modifiche approvate dopo tale data (nonostante siano state riportate in questo Capitolo) o non ancora approvate formalmente.

Tabella 2: Raffronto tra la copertura finanziaria iniziale dell'APQ e quella al 31.12.2021

Fonti di finanziamento	Copertura finanziaria complessiva			Copertura finanziaria area interna Bassa Valle		
	iniziale	al 31.12.2021	Variazione %	iniziale	al 31.12.2021	Variazione %
Legge di stabilità n. 147/2013	3.740.000,00	3.740.000,00	-	3.740.000,00	3.740.000,00	-
Risorse aggiuntive regionali sui servizi essenziali	3.058.000,00	3.758.000,00	22,9	3.058.000,00	3.758.000,00	22,9
Subtotale Servizi essenziali	6.798.000,00	7.498.000,00	10,3	6.798.000,00	7.498.000,00	10,3
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	6.373.600,00	8.821.521,80	38,4	2.109.084,00	3.379.866,89	60,3
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)	3.470.000,00	3.470.003,60	0,0	803.000,00	803.000,00	-
Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR)	10.272.979,00	11.648.098,98	13,4	5.692.979,00	5.497.068,47	- 3,4
Subtotale Sviluppo locale	20.116.579,00	23.939.624,38	19,0	8.605.063,00	9.679.935,36	12,5
Totale	26.914.579,00	31.437.624,38	16,8	15.403.063,00	17.177.935,36	11,5

3. STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Il monitoraggio degli interventi riconducibili all'APQ 'Area interna Bassa Valle' è assicurato, a livello regionale, attraverso i seguenti sistemi informativi:

- per gli interventi sui 'servizi essenziali' afferenti al Programma 'Strategia Aree Interne Regione Valle d'Aosta – Linea Bassa Valle', mediante il sistema informativo regionale denominato 'SISPREG2014' (accreditato presso il SNM);
- per gli interventi di 'sviluppo locale' afferenti ai Programmi FESR e FSE 2014/20, mediante il sopra citato sistema 'SISPREG2014';
- per gli interventi di 'sviluppo locale' afferenti al Programma FEASR 2014/22, mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

In generale, 'SISPREG2014' consente la gestione informatizzata delle procedure e delle attività, a livello di Programma e di singolo Progetto, da parte di tutti i soggetti coinvolti ed è deputato, fra l'altro, alla trasmissione bimestrale, al SNM dell'IGRUE, delle informazioni previste dall'apposito Protocollo unico di colloquio, oltre che a rendere disponibili e ad elaborare le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione della Politica regionale di sviluppo e dei relativi Programmi e Progetti.

Si riportano, di seguito, le principali criticità riscontrate nell'alimentazione della BDU dell'IGRUE:

- i dati degli interventi di 'sviluppo locale' finanziati dal Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR) sono inviati alla BDU dell'IGRUE da AGEA attraverso SIAN che, ad oggi, non contiene ancora i campi 'Progetto complesso' e 'Strumento attuativo' necessari per ricondurre i progetti alla SNAI. Tale problematica non riguarda esclusivamente la Regione Valle d'Aosta, ma tutte le regioni che hanno quale organismo pagatore AGEA. Per tali progetti, pertanto, si ha contezza dello stato di avanzamento finanziario solo con le informazioni al 31 dicembre di ogni anno rese disponibili dai responsabili dei singoli interventi per la predisposizione delle Relazioni di avanzamento annuale;
- ci sono degli interventi trasversali ai 2 APQ concernenti le aree interne della Regione Autonoma Valle d'Aosta ('Bassa Valle' e 'Grand-Paradis') che riguardano potenzialmente l'intero territorio regionale (come, a titolo esemplificativo, gli interventi SL.4.3 BV e SL.2.3 GP concernenti l'animazione territoriale per la diffusione della cultura d'impresa) e che corrispondono ad un unico progetto che è stato possibile ricondurre solo ad uno dei 2 APQ (la riconduzione è stata effettuata in base alla maggior ricaduta finanziaria stimata sulla singola area interna), in quanto per uno stesso progetto il PUC dell'IGRUE non prevede la possibilità di attribuire né 2 codici 'Progetto complesso' né una percentuale di contribuzione. Nel caso portato ad esempio, il Progetto è stato ricondotto all'APQ 'Area interna Bassa Valle', pertanto nella BDU dell'IGRUE i relativi dati di avanzamento finanziario risultano interamente attribuiti a tale Area, nonostante l'effettiva ricaduta sia inferiore, visto che parte del Progetto riguarda comuni non inclusi nell'Area interna Bassa Valle;
- ci sono degli interventi ricondotti ad una sola area interna ma che riguardano un territorio più ampio rispetto alla perimetrazione della stessa (come, a titolo esemplificativo, gli interventi SL.1.2, SL.1.3, SL.1.3 bis, SL.4.1 e SL.4.1 bis finanziati dal FESR nell'ambito dell'APQ 'Area interna Bassa Valle'), per i quali nella BDU dell'IGRUE i relativi dati di avanzamento finanziario risultano interamente attribuibili all'Area di riferimento, nonostante l'effettiva ricaduta sia inferiore. Per tali progetti i dati di avanzamento finanziario per la predisposizione del relativo Rapporto annuale di monitoraggio sono calcolati applicando il peso percentuale

derivante dal rapporto tra il costo stimato del Progetto attribuibile all'area interna di riferimento e il costo complessivo dello stesso;

- rispetto a quanto previsto nel 'Documento tecnico per il monitoraggio della SNAI' – il cui aggiornamento è stato trasmesso dall'IGRUE con nota prot. n. 277366, in data 4.11.2021 – l'obbligatorietà della valorizzazione dell'indicatore di risultato comune (TC42) va in contrasto con quanto previsto dalla lettera dell'IGRUE prot. n. 198959, in data 3.11.2017, che prevede per la struttura 'IN00-Indicatori di Risultato' di dover associare al progetto almeno un indicatore scelto indifferentemente in una delle due Tabelle di contesto '*TC42-Indicatori di Risultato comuni*' e '*TC43-Indicatori di Risultato definiti dal Programma*'. Per la maggior parte dei progetti riconducibili all'APQ 'Area interna Bassa Valle' gli indicatori, che erano stati inseriti rispettando le specifiche della prima lettera dell'IGRUE, sono stati allineati a quanto previsto dall'ultima lettera dell'IGRUE, ma per alcuni progetti FSE ('*Divento imprenditore*' e '*Interventi di animazione territoriale per la diffusione della cultura d'impresa*') questo non è stato possibile, in quanto, nonostante il Programma FSE preveda per le priorità di investimento dei 2 Progetti sia l'indicatore di risultato comune 4003 '*Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*' (TC42), sia l'indicatore di risultato da Programma R75 '*Partecipanti che acquisiscono le competenze chiave alla fine della loro partecipazione all'intervento*' (TC43), la scelta è ricaduta su quest'ultimo visto che per i suddetti 2 progetti i partecipanti non ottengono una qualifica.

Per quanto concerne l'attuazione degli interventi al 31 dicembre 2021, si evidenzia che rispetto ai 30 interventi attualmente previsti⁴, in relazione alla sola quota riferita all'area interna Bassa Valle, ne risultano:

- 4 conclusi (interventi IS.1.2, SL.1.3, SL.4.1 e SL.4.3);
- 21 in fase di realizzazione, con differenti gradi di avanzamento e problematiche, come evidenziato nel prosieguo di questa Relazione;
- 5 non ancora avviati, 3 legati al tema dell'istruzione (interventi IS.1.1.1, IS.1.1.4.1 e IS.1.1.4.2) e 2 riconducibili alla gestione e sfruttamento delle risorse forestali (interventi SL.3.2 e SL.3.3).

Alla stessa data, tutti gli interventi relativi ai servizi essenziali di cittadinanza (istruzione, sanità e mobilità) – finanziati a valere su risorse statali autorizzate dalla legge di stabilità 2014 – risultano avviati, mentre quelli legati allo sviluppo locale – finanziati a valere sulle risorse dei Programmi operativi regionali cofinanziati dai Fondi FESR, FSE e FEASR – hanno visto la presentazione nella sola area interna Bassa Valle di 71 progetti (pari al 38,6% del totale complessivo), di cui 64 approvati (con un tasso di approvazione pari al 90,1%, superiore a quello complessivo di circa 13 punti percentuali – cfr. Tabella 3).

4 L'APQ prevedeva inizialmente 27 interventi, diventati poi 28 nel corso del 2018, a seguito della suddivisione in 2 Azioni dell'intervento IS.1.1.4 (come meglio specificato nel paragrafo 3.2.2), 29 nel corso del 2019, a seguito dell'approvazione di un intervento a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) per lo sviluppo di una banca dati (cfr. paragrafo 3.2.1, intervento SL.1.3 bis) e 30 nel corso del 2020, a seguito dell'approvazione di un intervento a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) per il rafforzamento di servizi offerti presso l'incubatore di impresa e la creazione di un acceleratore di impresa (cfr. paragrafo 3.2.1, intervento SL.4.1 bis).


Tabella 3: Progetti derivanti dagli interventi di sviluppo locale per Programma, al 31.12.2021

Programma	Progetti presentati	Progetti in istruttoria	Progetti non approvati	Progetti approvati	Tasso di approvazione
Totale complessivo					
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	65	0	19	46	70,8%
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)	20	0	2	18	90,0%
Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR)	99	6	15	78	78,8%
Totale	184	6	36	142	77,2%
di cui area interna Bassa Valle					
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	24	0	1	23	95,8%
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)	4	0	0	4	100,0%
Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR)	43	2	4	37	86,0%
Totale	71	2	5	64	90,1%

Con riferimento all'avanzamento finanziario dell'APQ per anno (cfr. Grafico 1, all'interno del quale sono rappresentati i soli dati di attuazione relativi all'area interna Bassa Valle. Per i dati complessivi, si vedano le tabelle 4, 5, 6 e 7 riportate in fondo al Capitolo 3), si evidenziano, in particolare, le seguenti variazioni rilevate raffrontando i dati al 31 dicembre 2021 con quelli relativi all'anno precedente:

- lieve decremento della dotazione finanziaria dell'APQ (-275 mila euro, pari a -1,6%), passata dai 17,5 milioni di euro al 31.12.2020 ai 17,2 milioni di euro al 31.12.2021, a causa della riduzione delle risorse previste per i seguenti 4 interventi finanziati dal Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR): SL.2.1, SL.2.2, SL.3.3 e SL.3.4;
- incremento del 16% del finanziamento (pari, in valore assoluto, a quasi 2,3 milioni di euro), che ha così raggiunto i 16,6 milioni di euro. La differenza rispetto ai 17,2 milioni di euro della dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021 (pari a circa 560 mila euro) è prevalentemente attribuibile ad interventi non ancora avviati o avviati parzialmente;
- incremento del 15,6% del costo ammesso (pari a oltre 1,6 milioni di euro), che ha così raggiunto gli 11,9 milioni di euro. Quest'ultimo importo è inferiore di quasi 4,7 milioni di euro rispetto al finanziamento al 31.12.2021, prevalentemente a causa delle risorse aggiuntive regionali (pari a quasi 3,8 milioni di euro) imputabili all'intervento IS.1.3 e alle risorse private (pari a circa 850 mila euro) imputabili all'intervento SL.1.4, in quanto tali risorse non sono riconducibili al costo ammesso, ma solo al finanziamento;
- incremento del 49,4% degli impegni, che hanno così raggiunto i 9,3 milioni di euro (+3,1 milioni di euro);
- incremento del 40,4% degli impegni ammessi (inferiore di 9 punti percentuali rispetto all'incremento fatto registrare dagli impegni), con una variazione in termini assoluti di 2,5 milioni di euro;
- incremento di oltre l'80% dei pagamenti, che hanno così superato i 2,5 milioni di euro (+1,1 milioni di euro). L'andamento dei pagamenti ammessi riflette quello dei pagamenti, sia in termini percentuali, che in valore assoluto.

Grafico 1: Avanzamento finanziario dell'APQ per anno (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle)

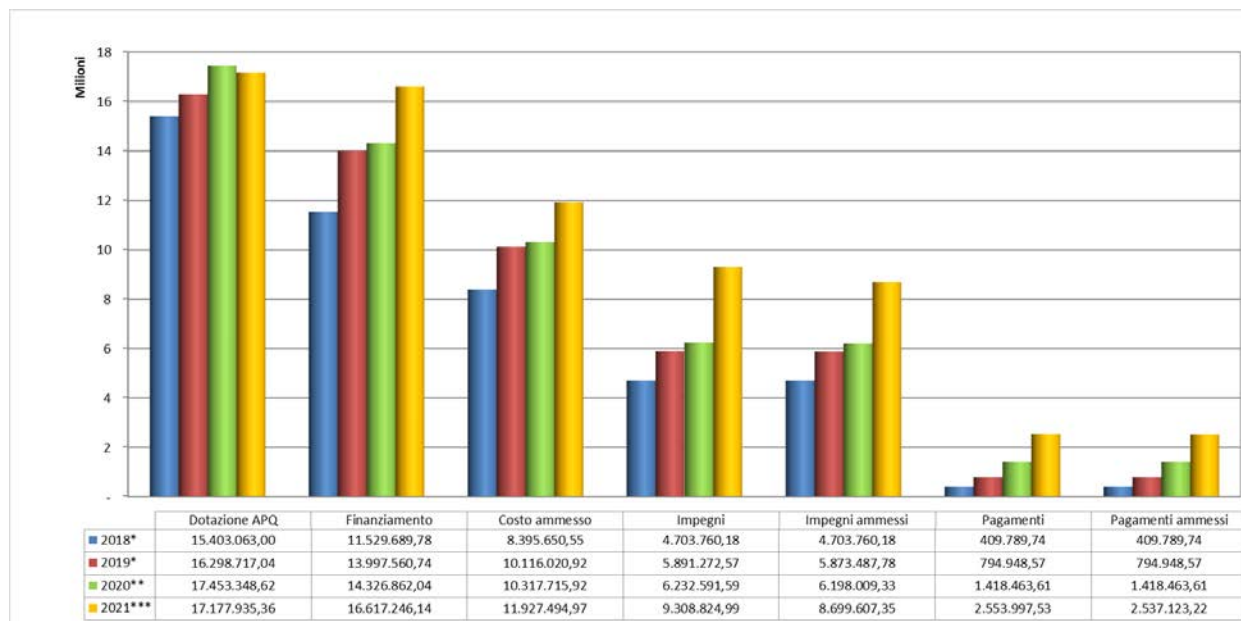

* Al 31.12.2018 e al 31.12.2019 non erano disponibili i dati di attuazione finanziaria per i seguenti interventi: SL.4.1 e SL.4.3.

** Al 31.12.2020 non erano disponibili i dati di attuazione finanziaria per i seguenti interventi: SL.4.1, SL.4.1 bis e SL.4.3.

*** Al 31.12.2021 erano disponibili tutti i dati di attuazione finanziaria.

Ai fini del monitoraggio dell'avanzamento finanziario dell'APQ, appare utile effettuare un raffronto tra l'avanzamento percentuale dei principali indicatori finanziari (Finanziamento, Impegni e Pagamenti) rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021⁵, che rappresenta il valore di riferimento che, gradualmente, dovrebbe essere raggiunto dai singoli indicatori finanziari.

Nei grafici che seguono sono rappresentati – con riferimento ai soli dati riconducibili all'area interna Bassa Valle (non sono, perciò, presi in considerazione i dati relativi al costo complessivo degli interventi riferiti alle eventuali ricadute degli stessi su un territorio più ampio rispetto all'area interna Bassa Valle) – sia l'avanzamento percentuale dei principali indicatori finanziari (Finanziamento, Impegni e Pagamenti) rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021, sia la capacità di impegno e di spesa, entrambi in relazione alla Tipologia degli interventi (cfr. grafici 2 e 3), ai Programmi di riferimento (cfr. grafici 4 e 5), alle Azioni portanti (cfr. grafici 6 e 7) e ai Settori di intervento dei Progetti relativi ai servizi essenziali (cfr. grafici 8 e 9).

⁵ Si è preferito utilizzare questo indicatore, piuttosto che la Dotazione iniziale dell'APQ, al fine di rapportare i singoli indicatori alla dotazione finanziaria più aggiornata. Nei prossimi Rapporti, qualora la dotazione dell'APQ dovesse subire ulteriori variazioni, si prenderà a riferimento il dato più aggiornato della dotazione finanziaria dell'APQ.

Grafico 2: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per tipologia degli interventi (servizi essenziali e sviluppo locale), rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle)

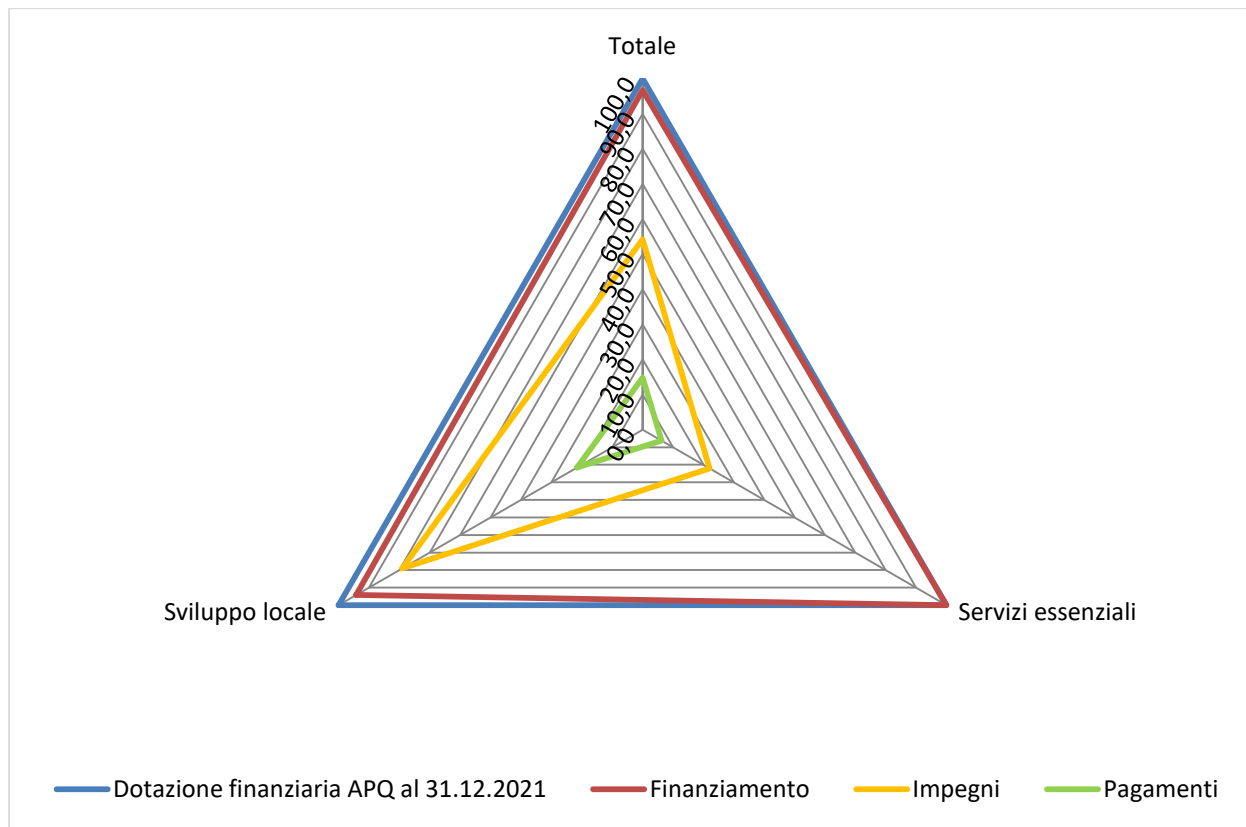


Grafico 3: Capacità di impegno e di spesa degli interventi (servizi essenziali e sviluppo locale) riconducibili all'APQ, al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle)

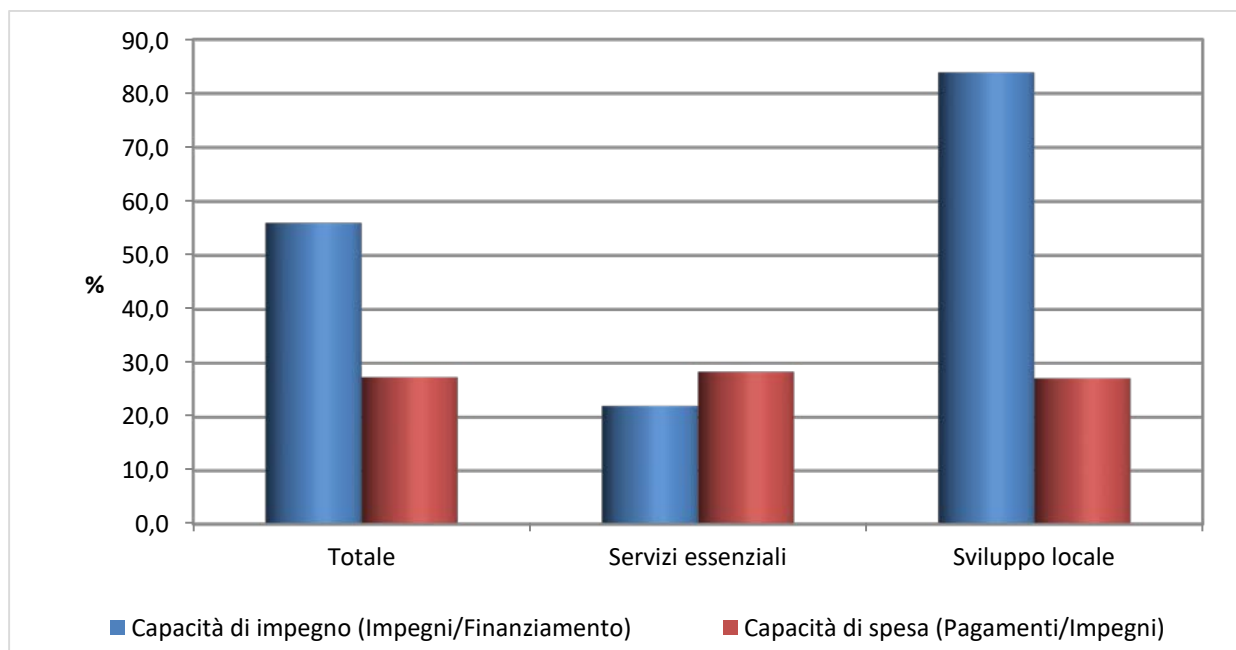


Grafico 4: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per Programma, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle)

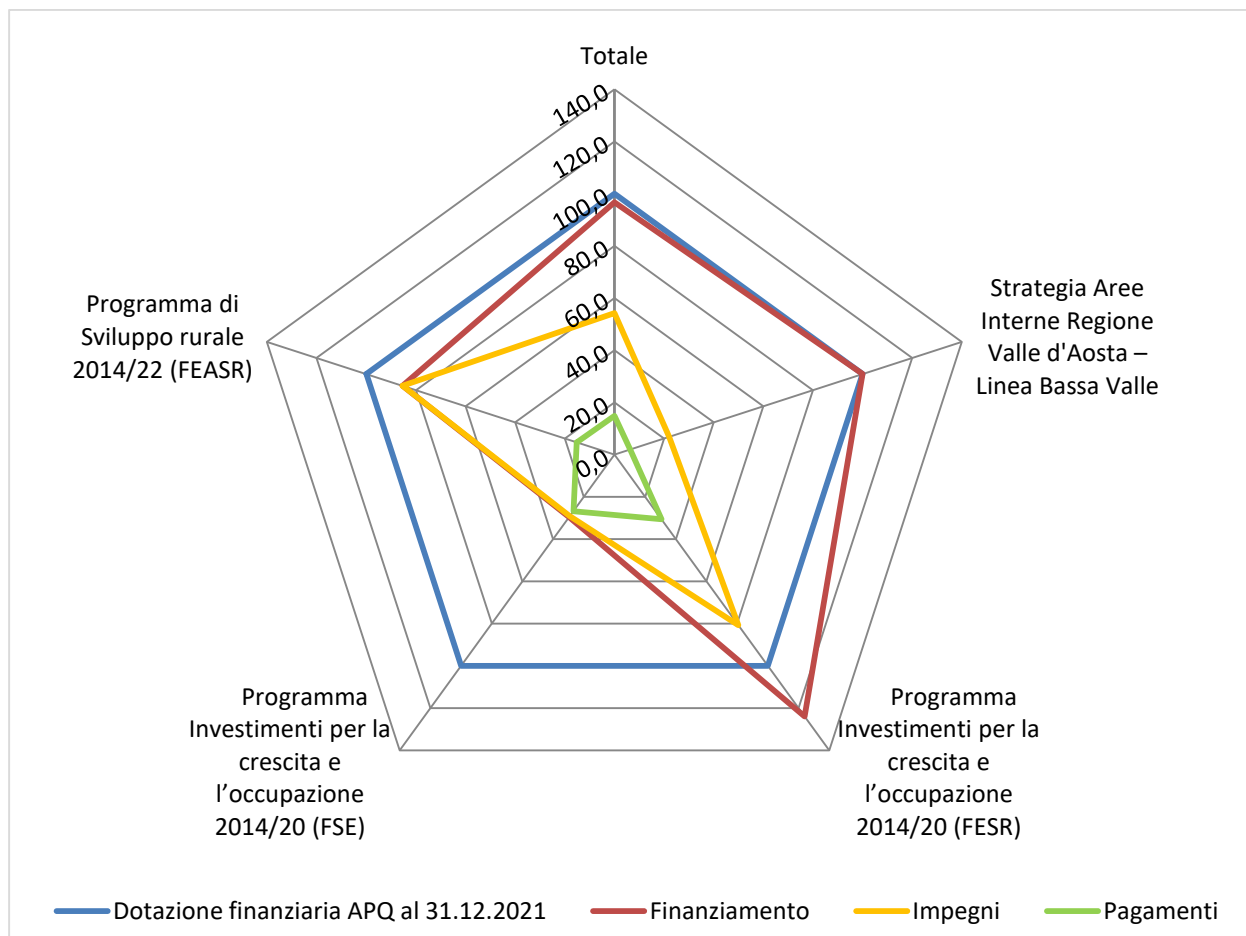


Grafico 5: Capacità di impegno e di spesa dei Programmi riconducibili all'APQ, al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle)

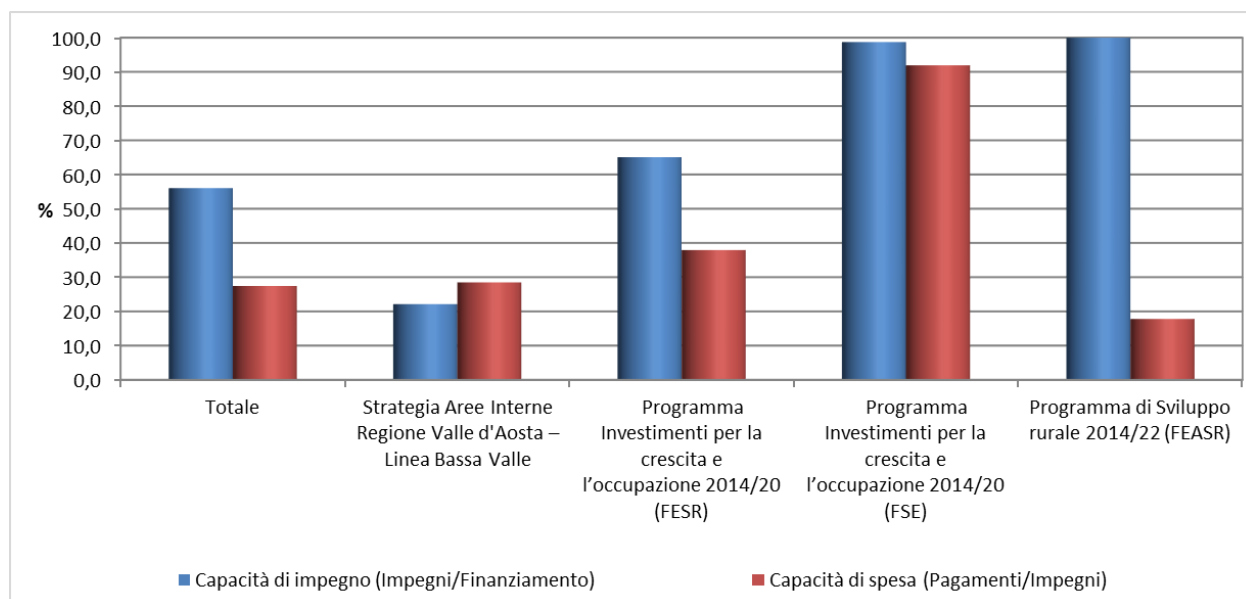


Grafico 6: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per Azione portante, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle)

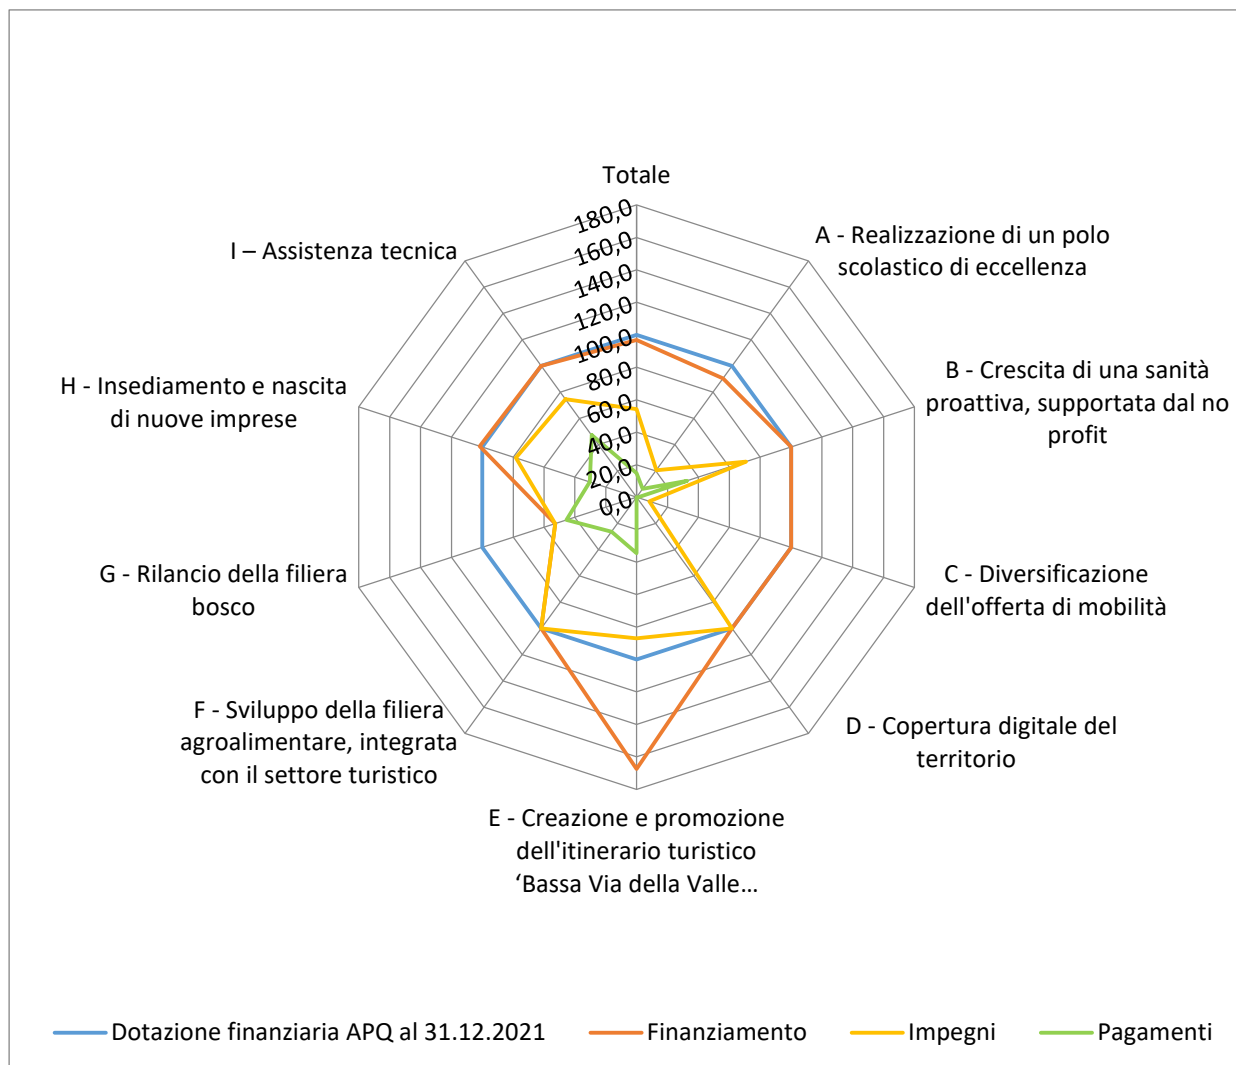


Grafico 7: Capacità di impegno e di spesa delle Azioni portanti riconducibili all'APQ, al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle)


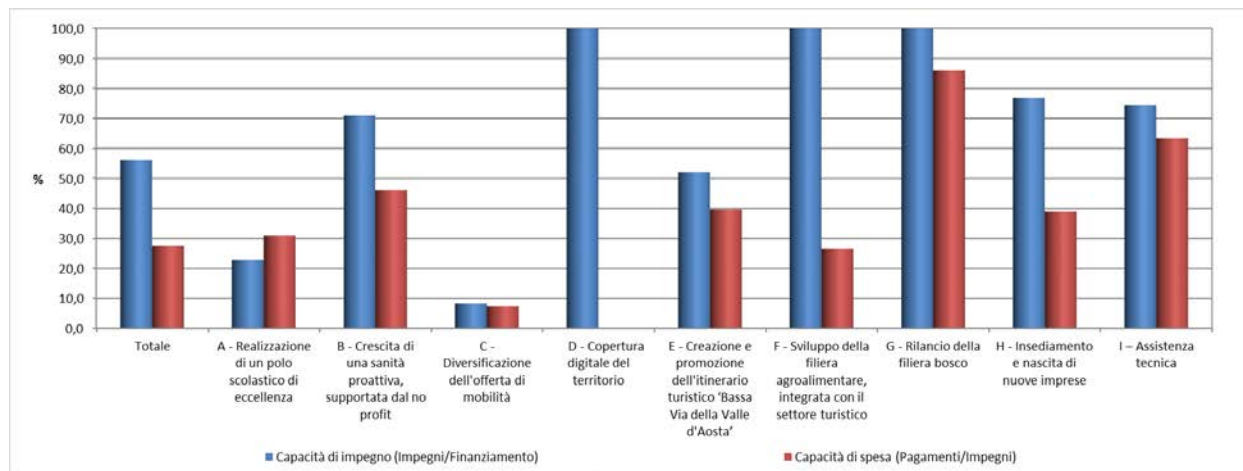


Grafico 8: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per i Settori di intervento dei Progetti relativi ai servizi essenziali, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle)



Grafico 9: Capacità di impegno e di spesa dei Settori di intervento dei Progetti relativi ai servizi essenziali riconducibili all'APQ, al 31.12.2021 (dati riferiti alla sola area interna Bassa Valle)

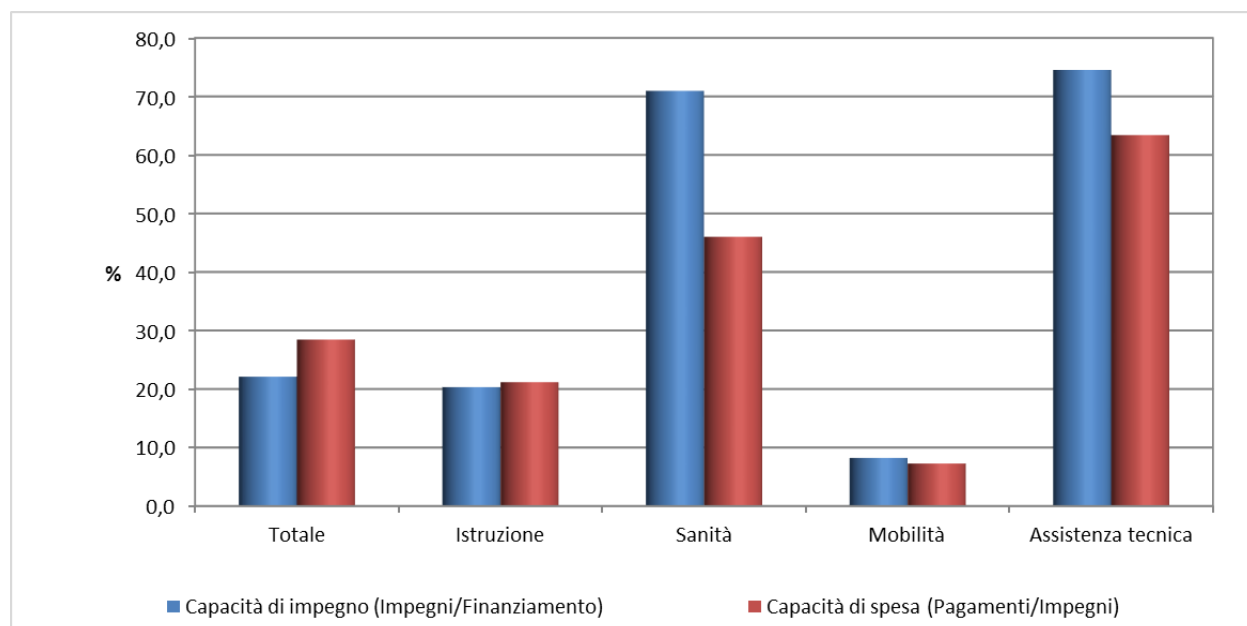

Dall'esame dei grafici sopra riportati si evidenzia quanto segue, in particolare rispetto agli impegni (che misurano l'avvenuto avvio delle attività di un Progetto), alla Capacità d'impegno (rapporto percentuale tra impegni e finanziamento), ai pagamenti (che indicano l'effettivo avanzamento della realizzazione delle attività di un Progetto) e alla Capacità di spesa (rapporto percentuale tra pagamenti e impegni).

- Tipologia degli interventi (servizi essenziali e sviluppo locale): gli interventi relativi allo sviluppo locale fanno registrare impegni e pagamenti pari, rispettivamente, al 79% e al 21,5% della relativa dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021, una buona Capacità di impegno (83,9%) e una bassa Capacità di spesa (27,2%). Gli interventi relativi ai servizi essenziali, a fronte di un finanziamento pari alla relativa dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021, registrano, rispetto a tale dotazione, impegni e pagamenti piuttosto bassi (rispettivamente pari al 22,1% e al 6,3%), a causa dei ritardi legati alla realizzazione degli interventi IS.1.3, SN.2, MB.1, MB.2 e MB.3 (cfr. paragrafi 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3).
- Programmi: il Programma (FESR) registra apparentemente un valore anomalo, in quanto il finanziamento è superiore (124%) rispetto alla relativa dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021. Tale discrepanza deriva dall'importo del finanziamento dell'intervento SL.1.4 (pari a poco più di 1,3 milioni di euro) che comprende circa 850 mila euro di risorse private non certificabili, non considerate nella relativa dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021 (pari a 540 mila euro). Il Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR) e il Programma FESR si contraddistinguono per l'elevato valore percentuale degli impegni rispetto alla relativa dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021 (rispettivamente pari all'85,3% e all'80,7%), seguiti a notevole distanza dal Programma FSE (29,1%) e dal Programma 'Strategia Aree Interne Regione Valle d'Aosta – Linea Bassa Valle' (22,1%). Il livello dei pagamenti rispetto alla suddetta dotazione finanziaria, invece, è piuttosto basso per tutti i Programmi ed è compreso tra il 6,3% del Programma 'Strategia Aree Interne Regione Valle d'Aosta – Linea Bassa Valle' e il 30,6% del Programma FESR. I Programmi FSE e FEASR hanno un'ottima Capacità di impegno (superiore al 98%), mentre per la Capacità di spesa troviamo agli antipodi il Programma FSE, che raggiunge il 91,9% (ma su modesti importi in valore assoluto), e il Programma FEASR, che si attesta al 17,8%.
- Azioni portanti: per le stesse ragioni riportate al punto precedente in relazione al Programma FESR, le Azioni portanti '*E - Creazione e promozione dell'itinerario turistico Bassa Via della Valle d'Aosta*' e '*H - Insediamento e nascita di nuove imprese*' registrano un finanziamento superiore rispetto alla relativa dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021 (rispettivamente pari al 167,4% e al 101,7%). Le Azioni portanti '*D - Copertura digitale del territorio*' e '*F - Sviluppo della filiera agroalimentare, integrata con il settore turistico*' si contraddistinguono per essere le sole ad aver raggiunto impegni pari alla rispettiva dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021, seguite dall'Azione portante '*E - Creazione e promozione dell'itinerario turistico Bassa Via della Valle d'Aosta*' con l'87,1%, mentre in negativo si evidenziano le Azioni portanti '*A - Realizzazione di un polo scolastico di eccellenza*' e '*C - Diversificazione dell'offerta di mobilità*', che registrano, rispettivamente, percentuali pari al 20,6% e all'8,2%. Per quanto concerne i pagamenti rispetto alla suddetta dotazione finanziaria, le migliori *performance* sono attribuibili alle Azioni portanti '*G - Rilancio della*

filiera bosco e *'I – Assistenza tecnica'*, che registrano valori superiori al 45%, mentre le Azioni portanti *'C - Diversificazione dell'offerta di mobilità'* e *'D - Copertura digitale del territorio'* registrano valori prossimi allo 0%. Rispetto alla Capacità di impegno, le Azioni portanti *'D - Copertura digitale del territorio'*, *'F - Sviluppo della filiera agroalimentare, integrata con il settore turistico'* e *'G - Rilancio della filiera bosco'* registrano valori pari al 100%. Quest'ultima Azione portante è la sola a contraddistinguersi per una buona Capacità di spesa (86%).

- Settori di intervento dei Progetti relativi ai servizi essenziali: i Settori di intervento *'Assistenza tecnica'* e *'Sanità'* registrano i migliori risultati in termini di impegni (rispettivamente pari al 74,5% e al 70,9%) e pagamenti (rispettivamente pari al 47,3% e al 32,6%) in relazione alla rispettiva dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021 nonché in termini di Capacità di spesa (rispettivamente pari al 63,4% e al 46%). I valori percentuali della Capacità di impegno di tutti i settori ricalcano l'avanzamento percentuale degli impegni rispetto alla suddetta dotazione finanziaria, visto che i valori assoluti del finanziamento e della dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2021 coincidono. I Settori di intervento *'Istruzione'* e *'Mobilità'* registrano, invece, un ritardo nell'attuazione, come evidenziato nei successivi paragrafi 3.1.1 e 3.1.3.

Si riportano, di seguito, le tabelle concernenti l'avanzamento finanziario dell'APQ, al 31.12.2021, in relazione alla Tipologia degli interventi (cfr. Tabella 4), ai Programmi di riferimento (cfr. Tabella 5), alle Azioni portanti (cfr. Tabella 6) e ai Settori di intervento dei Progetti relativi ai servizi essenziali (cfr. Tabella 7). Si precisa che i dati sono riferiti sia al costo complessivo degli interventi, sia al costo degli stessi nella sola area interna Bassa Valle.

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Accordo di programma quadro 'Area interna Bassa Valle'
Relazione di avanzamento annuale al 31.12.2021

Tabella 4: Avanzamento finanziario dell'APQ 'Area interna Bassa Valle' per tipologia degli interventi (servizi essenziali e sviluppo locale), al 31.12.2021

Tipologia interventi	Dotazione finanziaria iniziale APQ	Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2021	Numero Progetti				Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
			Presentati	In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Servizi essenziali												
Totale	6.798.000,00	7.498.000,00	8	0	0	8	7.498.000,00	3.740.000,00	1.656.872,61	1.047.654,97	471.318,09	454.443,78
di cui area interna Bassa Valle	6.798.000,00	7.498.000,00	8	0	0	8	7.498.000,00	3.740.000,00	1.656.872,61	1.047.654,97	471.318,09	454.443,78
Sviluppo locale												
Totale	20.116.579,00	23.939.624,38	184	6	36	142	20.624.150,16	18.441.153,96	16.862.422,61	16.862.422,61	4.886.347,22	4.886.048,14
di cui area interna Bassa Valle	8.605.063,00	9.679.935,36	71	2	5	64	9.119.246,14	8.187.494,97	7.651.952,38	7.651.952,38	2.082.679,44	2.082.679,44
Totale complessivo												
Totale	26.914.579,00	31.437.624,38	192	6	36	150	28.122.150,16	22.181.153,96	18.519.295,22	17.910.077,58	5.357.665,31	5.340.491,92
di cui area interna Bassa Valle	15.403.063,00	17.177.935,36	79	2	5	72	16.617.246,14	11.927.494,97	9.308.824,99	8.699.607,35	2.553.997,53	2.537.123,22

Tabella 5: Avanzamento finanziario dell'APQ 'Area interna Bassa Valle' per Programma, al 31.12.2021

Programma	Dotazione finanziaria iniziale APQ	Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2021	Numero Progetti				Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
			Presentati	In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Strategia Aree Interne Regione Valle d'Aosta – Linea Bassa Valle (2018AREAINVALD)												
Totale	6.798.000,00	7.498.000,00	8	0	0	8	7.498.000,00	3.740.000,00	1.656.872,61	1.047.654,97	471.318,09	454.443,78
di cui area interna Bassa Valle	6.798.000,00	7.498.000,00	8	0	0	8	7.498.000,00	3.740.000,00	1.656.872,61	1.047.654,97	471.318,09	454.443,78
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) – (2014IT16RFOP020)												
Totale	6.373.600,00	8.821.521,80	65	0	19	46	10.510.766,46	8.380.114,19	6.801.382,84	6.801.382,84	2.511.116,54	2.511.116,54
di cui area interna Bassa Valle	2.109.084,00	3.379.866,89	24	0	1	23	4.192.639,06	3.263.920,68	2.728.378,09	2.728.378,09	1.034.292,83	1.034.292,83
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE) – (2014IT05SFOP011)												
Totale	3.470.000,00	3.470.003,60	20	0	2	18	1.174.414,59	1.122.070,66	1.122.070,66	1.122.070,66	1.033.392,75	1.033.093,67
di cui area interna Bassa Valle	803.000,00	803.000,00	4	0	0	4	236.978,43	233.945,64	233.945,64	233.945,64	215.062,12	215.062,12
Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR) – (2014IT06RDRP013)												
Totale	10.272.979,00	11.648.098,98	99	6	15	78	8.938.969,11	8.938.969,11	8.938.969,11	8.938.969,11	1.341.837,93	1.341.837,93
di cui area interna Bassa Valle	5.692.979,00	5.497.068,47	43	2	4	37	4.689.628,65	4.689.628,65	4.689.628,65	4.689.628,65	833.324,49	833.324,49
Totale complessivo												
Totale	26.914.579,00	31.437.624,38	192	6	36	150	28.122.150,16	22.181.153,96	18.519.295,22	17.910.077,58	5.357.665,31	5.340.491,92
di cui area interna Bassa Valle	15.403.063,00	17.177.935,36	79	2	5	72	16.617.246,14	11.927.494,97	9.308.824,99	8.699.607,35	2.553.997,53	2.537.123,22

Tabella 6: Avanzamento finanziario dell'APQ 'Area interna Bassa Valle' per Azione portante, al 31.12.2021

Azione portante	Dotazione finanziaria iniziale APQ	Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2021	Numero Progetti				Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegn ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
			Presentati	In istruttoria	Non approvati	Approvati						
A - Realizzazione di un polo scolastico di eccellenza												
Totale	7.750.000,00	8.450.000,00	21	0	2	19	6.154.410,99	2.344.067,06	1.958.712,76	1.349.495,12	1.051.260,26	1.034.086,87
di cui Area interna	5.233.000,00	5.933.000,00	5	0	0	5	5.366.978,43	1.605.945,64	1.220.591,34	611.373,70	375.878,69	359.004,38
B - Crescita di una sanità proattiva, supportata dal no profit												
Totale	458.000,00	458.000,00	2	0	0	2	458.000,00	458.000,00	324.917,70	324.917,70	149.475,96	149.475,96
di cui area interna Bassa Valle	458.000,00	458.000,00	2	0	0	2	458.000,00	458.000,00	324.917,70	324.917,70	149.475,96	149.475,96
C - Diversificazione dell'offerta di mobilità												
Totale	1.653.000,00	1.653.000,00	3	0	0	3	1.653.000,00	1.653.000,00	135.942,80	135.942,80	9.865,37	9.865,37
di cui area interna Bassa Valle	1.653.000,00	1.653.000,00	3	0	0	3	1.653.000,00	1.653.000,00	135.942,80	135.942,80	9.865,37	9.865,37
D - Copertura digitale del territorio												
Totale	3.572.979,00	5.784.424,00	1	0	0	1	5.784.424,00	5.784.424,00	5.784.424,00	5.784.424,00	0,00	0,00
di cui area interna Bassa Valle	3.572.979,00	3.572.979,00	1	0	0	1	3.572.979,00	3.572.979,00	3.572.979,00	3.572.979,00	0,00	0,00
E - Creazione e promozione dell'itinerario turistico 'Bassa Via della Valle d'Aosta'												
Totale	4.090.000,00	3.744.721,80	39	0	19	20	5.624.299,01	3.640.602,63	3.122.955,98	3.122.955,98	1.296.864,28	1.296.864,28
di cui area interna Bassa Valle	1.104.300,00	1.146.074,89	10	0	1	9	1.918.904,80	1.066.319,58	997.967,13	997.967,13	395.621,49	395.621,49
F - Sviluppo della filiera agroalimentare, integrata con il settore turistico												
Totale	1.700.000,00	1.439.158,41	16	0	4	12	1.439.158,41	1.439.158,41	1.439.158,41	1.439.158,41	155.077,05	155.077,05
di cui area interna Bassa Valle	560.000,00	212.743,64	4	0	1	3	212.743,64	212.743,64	212.743,64	212.743,64	56.219,80	56.219,80
G - Rilancio della filiera bosco												
Totale	5.000.000,00	4.424.516,57	82	6	11	65	1.715.386,70	1.715.386,70	1.715.386,70	1.715.386,70	1.186.760,88	1.186.760,88
di cui area interna Bassa Valle	1.560.000,00	1.711.345,83	38	2	3	33	903.906,01	903.906,01	903.906,01	903.906,01	777.104,69	777.104,69
H - Insediamento e nascita di nuove imprese												
Totale	2.503.600,00	5.296.803,60	27	0	0	27	5.106.471,05	4.959.515,16	3.898.430,46	3.898.430,46	1.420.000,86	1.420.000,86
di cui area interna Bassa Valle	1.074.784,00	2.303.792,00	15	0	0	15	2.343.734,26	2.267.601,10	1.800.410,96	1.800.410,96	701.470,88	701.470,88
I – Assistenza tecnica												
Totale	187.000,00	187.000,00	1	0	0	1	187.000,00	187.000,00	139.366,41	139.366,41	88.360,65	88.360,65
di cui area interna Bassa Valle	187.000,00	187.000,00	1	0	0	1	187.000,00	187.000,00	139.366,41	139.366,41	88.360,65	88.360,65
Totale complessivo												
Totale	26.914.579,00	31.437.624,38	192	6	36	150	28.122.150,16	22.181.153,96	18.519.295,22	17.910.077,58	5.357.665,31	5.340.491,92
di cui area interna Bassa Valle	15.403.063,00	17.177.935,36	79	2	5	72	16.617.246,14	11.927.494,97	9.308.824,99	8.699.607,35	2.553.997,53	2.537.123,22

Tabella 7: Avanzamento finanziario dell'APQ 'Area interna Bassa Valle' per i Settori di intervento dei Progetti relativi ai servizi essenziali, al 31.12.2021

Settore di intervento	Dotazione finanziaria iniziale APQ	Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2021	Numero Progetti				Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
			Presentati	In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Istruzione												
Totale	4.500.000,00	5.200.000,00	2	0	0	2	5.200.000,00	1.442.000,00	1.056.645,70	447.428,06	223.616,11	206.741,80
di cui area interna Bassa Valle	4.500.000,00	5.200.000,00	2	0	0	2	5.200.000,00	1.442.000,00	1.056.645,70	447.428,06	223.616,11	206.741,80
Sanità												
Totale	458.000,00	458.000,00	2	0	0	2	458.000,00	458.000,00	324.917,70	324.917,70	149.475,96	149.475,96
di cui area interna Bassa Valle	458.000,00	458.000,00	2	0	0	2	458.000,00	458.000,00	324.917,70	324.917,70	149.475,96	149.475,96
Mobilità												
Totale	1.653.000,00	1.653.000,00	3	0	0	3	1.653.000,00	1.653.000,00	135.942,80	135.942,80	9.865,37	9.865,37
di cui area interna Bassa Valle	1.653.000,00	1.653.000,00	3	0	0	3	1.653.000,00	1.653.000,00	135.942,80	135.942,80	9.865,37	9.865,37
Assistenza tecnica												
Totale	187.000,00	187.000,00	1	0	0	1	187.000,00	187.000,00	139.366,41	139.366,41	88.360,65	88.360,65
di cui area interna Bassa Valle	187.000,00	187.000,00	1	0	0	1	187.000,00	187.000,00	139.366,41	139.366,41	88.360,65	88.360,65
Totale complessivo												
Totale	6.798.000,00	7.498.000,00	8	0	0	8	7.498.000,00	3.740.000,00	1.656.872,61	1.047.654,97	471.318,09	454.443,78
di cui area interna Bassa Valle	6.798.000,00	7.498.000,00	8	0	0	8	7.498.000,00	3.740.000,00	1.656.872,61	1.047.654,97	471.318,09	454.443,78

3.1 Stato di attuazione interventi su legge di Stabilità

Non essendo stato possibile predisporre la Relazione di avanzamento annuale al 31 dicembre 2020, nei successivi paragrafi sono riportati anche i risultati conseguiti dagli interventi nel corso del 2020.

3.1.1 Istruzione

➤ **Allestimento di laboratori tecnologici nel polo scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado, a Verrès (IS.1.2)**

Dotazione finanziaria da APQ: 200.000,00 euro a valere sulla l.27 dicembre 2013, n.147 (l. stabilità 2014) art. 1, commi 13-17.

Il Progetto è stato avviato in ritardo rispetto ai tempi indicati nell'APQ, in quanto il soggetto attuatore inizialmente individuato (Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale, Tecnica e Professionale – ISILTP) ha chiesto alla Sovrintendenza agli studi (attuale beneficiario dell'intervento a seguito delle varie riorganizzazioni dell'Amministrazione regionale) di farsi carico dell'attuazione dello stesso e delle relative procedure di acquisto del materiale. Pertanto, nel corso del secondo semestre 2019, la Sovrintendenza agli studi, previa condivisione con l'ISILTP di Verrès e con i referenti tecnici regionali della Struttura regionale Sistemi tecnologici, ha avviato le procedure di acquisto del materiale necessario secondo le seguenti modalità:

- all'inizio del mese di ottobre 2019, approvazione dell'affido della fornitura nell'ambito delle convenzioni CONSIP, per un importo complessivo di quasi 90 mila euro, le cui operazioni di consegna e collaudo sono terminate in data 28 novembre 2019 (tale procedura ha fatto registrare un'economia pari a 107,36 euro);
- a fine ottobre 2019 è stata disposta la determina a contrarre per l'acquisto del restante materiale non ricompreso nelle convenzioni CONSIP, tramite MEPA. A inizio dicembre 2019 è stata approvata e aggiudicata la fornitura di materiale informatico e tecnologico per un importo di poco più di 102 mila e a fine dicembre 2019 è stata disposta l'integrazione di materiale per un importo di circa 8 mila euro. Le operazioni di installazione e collaudo del materiale sono terminate il 27 ottobre 2020, che coincide con la data di conclusione del Progetto.

Il 27 gennaio 2021 sono stati inoltrati al Controllore di primo livello: il rendiconto delle spese finali sostenute, pari a 199.888,33 euro (la differenza rispetto alla dotazione finanziaria da APQ, pari a 111,67 euro, è dovuta ad un'economia di 107,36 euro e a 4,31 euro di risorse non impegnate); la relativa attestazione di accompagnamento con correlata domanda di saldo; la Relazione finale di attuazione.

La realizzazione dei laboratori tecnologici informatici⁶ contribuisce alla modernizzazione e alla riqualificazione dei servizi essenziali dell'area interna Bassa Valle in materia di istruzione e formazione ed è funzionale all'intervento IS.1.3, descritto nel punto successivo.

⁶ A titolo esemplificativo sono stati acquistati: PC portatili; videoproiettori laser/led; lavagne per proiezioni magnetiche; access point e relativi alimentatori; switch; server tower; stampanti laser e 3D; scanner 3D.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	200.000,00	200.000,00	199.995,69	199.995,69	199.888,33	199.888,33
di cui Area interna BV	200.000,00	200.000,00	199.995,69	199.995,69	199.888,33	199.888,33

➤ **Realizzazione di un convitto annesso al polo scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado, a Verrès (IS.1.3)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 1.242.000,00 euro a valere sulla l.27 dicembre 2013, n.147 (l.stabilità 2014), art.1, commi 13-17 e 3.058.000,00 euro a valere sulle risorse finanziarie della Regione, per un totale di 4.300.000,00 euro. La dotazione finanziaria iniziale è stata integrata con risorse aggiuntive regionali in due momenti distinti:

- *nel 2018, per un importo pari a 200.000,00 euro, contestualmente all'approvazione dello studio di fattibilità;*
- *nel 2019, per un importo pari a 500.000,00 euro, contestualmente all'approvazione del concorso di progettazione, per la copertura del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, portando così la dotazione finanziaria complessiva del Progetto a 5.000.000,00 euro.*

La Soprintendenza per i beni e le attività culturali, in data 2 maggio 2019, ha rilasciato l'atto di esito della verifica dell'interesse culturale dell'edificio oggetto di intervento, che ha evidenziato che l'edificio risulta escluso dall'applicazione delle disposizioni della parte II del d.lgs. 42/2004 riguardante i 'beni culturali'.

In esito alla suddetta verifica ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta nonché della delega delle funzioni ministeriali in materia di beni culturali all'Assessore regionale competente, è stato tuttavia riconosciuto all'edificio un interesse locale per aspetti architettonico-tipologici e storico-sociali. Di conseguenza, lo stabile è stato classificato, ai sensi della normativa regionale, quale 'Edificio documento (B)' e soggetto alle tutele di cui alla l.r. 10 giugno 1983, n. 56, rendendo necessaria la preventiva autorizzazione dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali per ogni intervento di recupero.

In relazione a quanto sopra riportato, il soggetto attuatore ha dovuto ricorrere all'affidamento del servizio di progettazione mediante la procedura del concorso di progettazione (prevista dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 50/2016 ed ai successivi articoli 152, 153, 154 e 155 dello stesso), anziché attraverso la consueta modalità di affidamento (procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa), con inevitabili ritardi rispetto al cronoprogramma delle attività allegato all'APQ. In particolare, si segnala che i termini per la conclusione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono slittati, rispettivamente, a inizio gennaio 2023 e a inizio agosto 2025, portando la data di conclusione dell'intervento (collaudo dell'opera) a inizio febbraio 2026, anziché a inizio ottobre 2021, come inizialmente previsto e riportato nella seguente tabella di dettaglio:

Descrizione fase	Data inizio prevista (da scheda APQ)	Data fine prevista (da scheda APQ)	Data inizio prevista (alla data di rifer. del presente RAA)	Data fine prevista (alla data di rifer. del presente RAA)
Progettazione preliminare	24.04.2018	22.07.2018	29.11.2021	18.03.2022
Progettazione definitiva	22.07.2018	11.01.2019	18.03.2022	29.09.2022
Progettazione esecutiva	11.01.2019	10.04.2019	29.09.2022	07.01.2023
Appalto lavori e Stipula contratto	10.04.2019	19.11.2019	07.01.2023	11.08.2023
Esecuzione lavori	30.11.2019	23.04.2021	11.08.2023	03.08.2025
Collaudo	23.04.2021	05.10.2021	03.08.2025	02.02.2026

Si riportano, di seguito, le principali attività effettuate nel corso degli anni 2020 e 2021:

- in data 20 luglio 2020 è stato pubblicato sulla piattaforma informatica www.concorsiawn.it il bando di gara per lo svolgimento del concorso di progettazione in 2 gradi per l'affidamento del servizio di redazione dello studio di fattibilità tecnico economica, della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione lavori;
- in data 4 settembre 2020 è stata effettuata la seduta pubblica di generazione delle chiavi informatiche utili alla crittazione dei documenti di gara e necessaria a garantire la gestione anonima dell'intera procedura concorsuale;
- in data 9 settembre 2020 si è svolto, presso il fabbricato oggetto di recupero, il sopralluogo finalizzato a consentire la visita dei luoghi da parte dei candidati progettisti;
- in data 2 ottobre 2020 si è conclusa la pubblicazione delle risposte della stazione appaltante ai quesiti posti in fase di gara (1° grado) da parte dei concorrenti;
- alla data del 23 ottobre 2020, termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali relative al primo grado di concorso, sono pervenute, tramite la piattaforma informatica www.concorsiawn.it, n. 48 soluzioni progettuali;
- in data 3 novembre 2020 si è concluso il primo grado di concorso con la scelta da parte della commissione di gara dei 5 progetti ammessi al 2° grado;
- in data 26 gennaio 2021 si è tenuta, in modalità telematica, la seduta pubblica di decrittazione dei dati amministrativi dei partecipanti al concorso di progettazione ed è stata proclamata la graduatoria provvisoria;
- con provvedimento dirigenziale n. 1273 del 16 marzo 2021 sono stati approvati l'esito del concorso di progettazione e la proposta di aggiudicazione al primo operatore economico classificato;
- con provvedimento dirigenziale n. 3282 del 15 giugno 2021 è intervenuta la presa d'atto dell'avvenuta approvazione dell'esito del concorso di progettazione, formalizzando la contestuale copertura della spesa e disciplinando gli adempimenti contrattuali derivanti;
- con provvedimento dirigenziale n. 4641 del 18 agosto 2021 è stata approvata la presa d'atto della graduatoria, ai fini dell'attribuzione dei premi dal 2° al 5° classificato, del concorso di progettazione ed è stata impegnata la relativa spesa;
- in data 4 novembre 2021 è stata sottoscritta la scrittura privata tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta ed il raggruppamento temporaneo di progettisti aggiudicatario del servizio;
- con verbale del 29 novembre 2021 è stata disposta dal RUP la consegna del servizio di progettazione al fine dell'acquisizione del primo livello di progettazione relativa allo studio di fattibilità tecnico ed economica.

La scheda intervento allegata all'APQ è stata oggetto di richiesta di modifica in data 12 ottobre 2021, approvata formalmente in data 8 aprile 2022 (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2).

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	5.000.000,00	1.242.000,00	856.650,01	247.432,37	23.727,78	6.853,47
di cui Area interna BV	5.000.000,00	1.242.000,00	856.650,01	247.432,37	23.727,78	6.853,47

3.1.2 Salute

➤ **'Un territorio a tutta salute' - Medicina d'iniziativa, IFeC e empowerment di comunità (SN.1)**

Dotazione finanziaria da APQ: 378.000,00 euro a valere sulla l.27 dicembre 2013, n.147 (l. stabilità 2014) art. 1, commi 13-17.

Il servizio IFeC (Infermiera di Famiglia e di Comunità) è stato avviato a novembre 2018 nel distretto 4 dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e, oltre alle attività già descritte nella RAA al 31.12.2019, in una logica di maggiore integrazione tra ospedale e territorio, a fine 2019 ha visto l'elaborazione di Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) sulla Bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e sullo scompenso cardiaco, all'interno dei quali è stato inserito uno specifico percorso da seguire, alla dimissione, sul territorio.

A partire dal 20 gennaio 2020 i pazienti ricoverati per BPCO o scompenso cardiaco sono stati segnalati via email, con apposita scheda, dall'équipe ospedaliera alle IFeC, che hanno provveduto a seguirli a domicilio in modo attivo, secondo una medicina di iniziativa, al fine di garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi stabiliti e di proseguire l'educazione strutturata alla gestione della malattia.

Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 è continuata la presa in carico dei pazienti diabetici, afferenti agli ambulatori infermieristici siti presso i consultori di Verrès e Donnas, ai quali è stato distribuito del materiale informativo nel corso di un breve incontro educativo finalizzato a verificare le abilità e le conoscenze acquisite e a ottimizzare il controllo della malattia diabetica.

Entrambe le attività sono state interrotte a inizio febbraio 2020, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tale data, risultavano presi in carico dalle IFeC (dal 20 gennaio 2020) 4 pazienti affetti da BPCO e scompenso cardiaco e 106 pazienti affetti da diabete Mellito.

Visto che nel corso della pandemia – ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre, n. 10 – sono state inserite nell'organizzazione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta le USCA (Unità speciali di continuità assistenziale) – le cui funzioni sono principalmente rivolte alla cura e alla sorveglianza territoriale attiva dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, ma di un'assistenza domiciliare appropriata e puntuale – le IFeC sono confluite in

queste nuove unità speciali (finanziate con fondi statali dedicati e, pertanto, non finanziabili con fondi SNAI), che proseguiranno la loro attività anche al termine della pandemia. Di conseguenza, non è ipotizzabile prevedere una riattivazione del servizio IFeC nell'area interna Bassa Valle.

Rispetto all'attività di formazione e animazione del territorio, dopo le due giornate di formazione destinate al personale sanitario che si sono svolte a dicembre 2018, a dicembre 2019 è stata pubblicata la seconda manifestazione di interesse per affidare il servizio di animazione territoriale e di realizzazione del percorso di formazione previsti nella scheda intervento allegata all'APQ. Visto l'esito negativo della manifestazione di interesse, a febbraio 2020 è stata indetta una procedura negoziata sulla piattaforma telematica e-procurement del ME.VA (mercato elettronico della Valle d'Aosta) che ha portato, a maggio 2020, all'aggiudicazione del servizio. Dopo le prime fasi di attuazione del servizio (analisi del contesto, mappatura delle associazioni e identificazione delle reti), la valorizzazione delle comunità di pratica è stata individuata come la chiave di volta per un'animazione del territorio e una formazione efficaci. È stato quindi elaborato il documento di riferimento per la metodologia di intervento ed è iniziata l'organizzazione di *focus group* come primo *step* per un coinvolgimento dal basso della popolazione.

Il 24 marzo 2021 si è tenuto un *focus group* per ragionare insieme agli *stakeholder* su come coinvolgere gli attori del territorio e su quali attività svolgere insieme, al fine di per perseguire lo 'stare bene'. Sin dal primo contatto sono stati condivisi i concetti di perennizzazione dei risultati e di autonomizzazione del territorio.

Successivamente sono state articolate e definite quattro aree/laboratori per strutturare sia l'attività di formazione che di animazione territoriale ('muoversi insieme', 'il cibo che fa bene', 'aiuto reciproco', 'la cultura che cura'), è stato avviato il primo laboratorio con gruppi di cammino su percorsi accessibili nel territorio del Progetto (per fine dicembre 2021 era stato organizzato un incontro per l'avvio degli altri laboratori, che non ha avuto luogo a causa della ripresa dei contagi relativi alla quarta ondata COVID-19), sono state individuate delle sinergie e delle integrazioni tra questo Progetto e le evoluzioni del sistema sanitario richieste dal PNRR (in particolare per quanto riguarda la territorializzazione dei servizi e la creazione delle comunità di cura).

Per quanto concerne il sistema dell'emergenza/urgenza – ambito di intervento oggetto della proposta di modifica della scheda intervento allegata all'APQ, trasmessa dal RUA all'ACT in data 31 marzo 2021 – la procedura per l'acquisto delle 2 ambulanze da assegnare ad associazioni di volontari del soccorso operanti nel territorio dell'area interna Bassa Valle non è stata avviata in attesa dell'approvazione formale della suddetta proposta di modifica, avvenuta poi in data 8 aprile 2022 (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2). Di conseguenza, la data prevista per la conclusione dell'intervento indicata nella richiesta di modifica (28.02.2022) non ha potuto essere rispettata. Si segnala, pertanto, che l'intervento si concluderà presumibilmente entro fine febbraio 2023.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	378.000,00	378.000,00	323.225,20	323.225,20	148.299,96	148.299,96
di cui Area interna BV	378.000,00	378.000,00	323.225,20	323.225,20	148.299,96	148.299,96

➤ **Supporto e potenziamento delle organizzazioni del terzo settore in ambito socio-sanitario e sociale (SN.2)**

Dotazione finanziaria da APQ: 80.000,00 euro a valere sulla l. 27 dicembre 2013, n. 147 (l. stabilità 2014), art.1, commi 13-17.

Per definire i fabbisogni delle organizzazioni del terzo settore interessate dal Progetto (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e operatori del sociale no profit), a partire dal secondo semestre 2018 si sono svolte numerose riunioni con le associazioni di volontariato presenti sul territorio della Bassa Valle, che hanno consentito di individuare le principali attività da realizzare rispetto alle 3 linee di intervento previste dalla scheda allegata all'APQ (Servizio di supporto tecnico-amministrativo, Supporto alle organizzazione dei volontari del soccorso e Supporto alle attività di promozione e formazione). In particolare, sono stati individuati professionisti per il supporto nell'ambito amministrativo-fiscale, della trasparenza e dei progetti europei; organizzati dei corsi PTC (*Prehospital Trauma Care*) di base e pediatrico e BLSD (*Basic Life Support-early Defibrillation*) pediatrico; organizzati corsi di formazione focalizzati, prevalentemente, sulla promozione e sugli strumenti di *marketing* per le associazioni di volontariato.

E' stata, inoltre, programmata la realizzazione di un video promozionale per tutte le associazioni di volontariato da proiettare durante gli incontri nelle scuole o rivolti alla popolazione per promuovere e divulgare le proprie attività.

Il 4 dicembre 2019 si è proceduto all'aggiudicazione di alcuni corsi di formazione ('La progettazione', 'Ufficio stampa per il volontariato' e 'Web e social network'), la cui partenza, inizialmente prevista a marzo 2020, è stata posticipata a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (nel 2021 sono stati realizzati 2 corsi).

La scheda intervento allegata all'APQ è stata oggetto di una prima richiesta di modifica a inizio novembre 2021 – approvata formalmente in data 8 aprile 2022 – e di una seconda richiesta a fine aprile 2022, rispetto alla quale l'ACT ha avviato la consultazione del Tavolo dei sottoscrittori in data 10 agosto 2022 (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2).

A seguito della prima richiesta di modifica, la data prevista per la conclusione dell'intervento è stata posticipata dal 30.06.2021 al 31.12.2022. Quest'ultima data è stata confermata con la seconda richiesta di modifica.

Oltre alla pandemia, le principali criticità (procedurali e di contenuto) riscontrate nel corso dell'attuazione del Progetto hanno riguardato la necessità di:

- coinvolgere tutte le associazioni del territorio per individuarne i fabbisogni al fine di definire le principali attività da realizzare, che nella scheda intervento allegata all'APQ erano descritte genericamente;
- affidare a soggetti diversi le attività di formazione, ricorrendo a procedure di gara che – anche per modici importi – hanno comunque richiesto l'utilizzo di manifestazioni di interesse per garantire la massima trasparenza, allungando ulteriormente i tempi per l'aggiudicazione dei servizi.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	80.000,00	80.000,00	1.692,50	1.692,50	1.176,00	1.176,00
di cui Area interna BV	80.000,00	80.000,00	1.692,50	1.692,50	1.176,00	1.176,00

3.1.3 Mobilità

➤ **Servizio di trasporto flessibile nell'area interna Bassa Valle (MB.1)**

Dotazione finanziaria da APQ: 290.967,00 euro a valere sulla l. 27 dicembre 2013, n. 147 (l. stabilità 2014), art.1, commi 13-17.

Il Progetto prevedeva in origine un servizio flessibile di trasporto rivolto ai residenti e ai turisti da affidarsi agli operatori di noleggio con conducente (NCC) operanti nell'area e si articolava in due parti:

- un servizio 'generalista' (da svolgersi solo nel periodo estivo), ossia aperto a tutti, ma con una spiccata valenza turistica, per rendere raggiungibili località della Bassa Valle, spesso depositarie di ricchezze paesaggistiche, storiche, artistiche e culturali;
- un servizio 'sociale' (da svolgersi durante tutto l'arco dell'anno), volto a favorire l'inclusione di soggetti più deboli, quali la popolazione anziana, potendo contare su un servizio minimo assicurato verso le località ove sono collocati i principali servizi, ovviando così al problema degli orari del servizio pubblico.

Lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione del Progetto hanno, però, evidenziato importanti criticità nella realizzazione dei servizi inizialmente previsti, sia per quanto riguarda l'individuazione dei prestatori dei servizi (per affidare il servizio di trasporto flessibile sono state pubblicate due gare, la prima nell'autunno del 2018 e la seconda nella primavera del 2019, andate deserte), sia per quanto concerne l'individuazione degli utenti beneficiari (la ricerca di potenziali beneficiari con i requisiti per poter utilizzare il trasporto sociale attraverso i comuni e le/gli assistenti sociali non ha prodotto risultati). L'emergenza epidemiologica da COVID-19 non ha consentito di ripresentare un terzo bando per l'affidamento del servizio.

La scheda intervento allegata all'APQ è stata oggetto di una prima richiesta di modifica il 21 settembre 2021 – approvata formalmente in data 8 aprile 2022 – e di una seconda richiesta l'11 maggio 2022, rispetto alla quale l'ACT ha avviato la consultazione del Tavolo dei sottoscrittori in data 10 agosto 2022 (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2).

A seguito della prima richiesta di modifica, la data prevista per la conclusione dell'intervento è stata posticipata dal 30.09.2021 al 31.12.2025. Quest'ultima data è stata confermata con la seconda richiesta di modifica.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	290.967,00	290.967,00	8.788,53	8.788,53	8.788,53	8.788,53
di cui Area interna BV	290.967,00	290.967,00	8.788,53	8.788,53	8.788,53	8.788,53

➤ **Pista ciclabile della Bassa Valle (MB.2)**

Dotazione finanziaria da APQ: 1.232.033,00 euro a valere sulla l. 27 dicembre 2013, n. 147 (l. stabilità 2014), art.1, commi 13-17.

A inizio febbraio 2020 la scheda intervento allegata all'APQ è stata oggetto di richiesta di modifica, approvata formalmente in data 21 ottobre 2020, a seguito della quale il percorso originariamente previsto da Pont-Saint-Martin a Hône è stato ridotto al solo tratto Pont-Saint-Martin/Donnas (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2). Pertanto, in data 30 ottobre 2020, è stato chiesto al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) incaricato della progettazione di portare a completa definizione il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), la cui consegna è intervenuta il 9 novembre 2020.

Successivamente sono state effettuate le seguenti principali attività:

- in data 11 dicembre 2020 è stata proposta la domanda di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 12/2009, all'Assessorato regionale ambiente, trasporti e mobilità sostenibile e in data 18 gennaio 2021 è stata trasmessa al medesimo Assessorato la documentazione integrativa richiesta;
- in data 17 dicembre 2020 è stata proposta la domanda di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del d.lgs. 50/2016;
- il Comune di Donnas e il Comune di Pont-Saint-Martin, rispettivamente in data 22 dicembre 2020 e in data 30 dicembre 2020, hanno provveduto ad approvare il PFTE ai fini tecnici e della scelta delle differenti ipotesi di tracciato proposte in sede progettuale;
- in data 28 gennaio 2021 è stata indetta la conferenza dei servizi preliminare ex art. 14, comma 3 della legge n. 241/1990 in modalità semplificata e in forma asincrona, al fine di acquisire, preventivamente alla stesura del progetto definitivo, i pareri necessari all'approvazione dell'opera. Il verbale di chiusura della suddetta conferenza dei servizi, redatto dal RUP in data 22 marzo 2021, è stato approvato con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 62 del 24 marzo 2021;
- nel corso del mese di luglio 2021 le amministrazioni dei Comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas hanno provveduto a modificare i propri strumenti urbanistici al fine di rendere l'opera conforme alle previsioni dei propri piani regolatori;
- in data 2 agosto 2021 il RUP ha comunicato al RTP l'avvenuta approvazione delle varianti non sostanziali ai piani regolatori dei due comuni chiedendo di procedere alla redazione del progetto definitivo nel termine di 80 giorni;

- in data 5 ottobre 2021 l'incaricato della progettazione ha richiesto una sospensione dei termini contrattuali di 50 giorni per ricevere istruzioni sull'impostazione progettuale e per acquisire le analisi delle terre e rocce da scavo;
- in data 22 novembre 2021 la ditta Alfa Lab s.n.c. ha trasmesso al Comune di Pont-Saint-Martin i referti delle analisi chimiche delle terre e rocce da scavo, riscontrando superamenti significativi delle concentrazioni soglia di contaminazione in particolare su due campioni;
- in data 23 novembre 2021 il RUP ha trasmesso i referti al RTP e ha fissato la nuova data per la consegna del progetto definito al 10 dicembre 2021;
- in data 2 dicembre 2021 il Comune di Pont-Saint-Martin ha avviato, ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, la procedura per *'evento potenzialmente in grado di contaminare un sito/individuazione di contaminazione storica che possa comportare rischi di aggravamento della contaminazione'*, a seguito della quale, in data 14.12.2021, il Dipartimento ambiente dell'Amministrazione regionale ha convocato il 'Tavolo tecnico' con i soggetti interessati (Comuni di Donnas e Pont-Saint-Martin e i loro professionisti incaricati, l'ARPA, il Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta e l'AUSL della Valle d'Aosta), aprendo la procedura di bonifica. A seguito delle richieste emerse nel corso della riunione del 'Tavolo tecnico' del 21 dicembre 2021, il Comune di Pont-Saint-Martin ha affidato ulteriori indagini sulle terre e rocce da scavo nelle aree interessate dall'intervento;
- il progetto definito è stato consegnato in forma parziale in data 10 dicembre 2021, in attesa di sapere la qualità e la quantità di terre e rocce da scavo da smaltire;
- in data 11 gennaio 2022 il RUP, nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'art. 26 del d.lgs. 50/2016, ha formulato una richiesta di documentazione integrativa, onde procedere all'approvazione del progetto definitivo.

Tra le principali criticità riscontrate si segnalano:

- le mutevoli condizioni territoriali e i diversi regimi vincolistici di tipo urbanistico, paesaggistico, ambientale;
- i tempi molto lunghi per l'approvazione delle modifiche alla scheda intervento, che hanno causato uno slittamento dell'avvio della progettazione di circa 14 mesi, e il coordinamento con i diversi *stakeholders*, che ha richiesto un importante impegno, in termini di risorse e di tempo, per effettuare incontri e addivenire ai necessari accordi;
- la necessità di procedere alla chiusura dell'iter di bonifica di alcuni siti contaminati attraversati dalla pista ciclabile prima dell'approvazione del progetto definitivo, che ha determinato un'ulteriore dilatazione dei tempi di approvazione del progetto di circa 3 mesi;
- il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che costituisce un serio ostacolo al regolare svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e determina forti rallentamenti negli iter procedurali, dovuti essenzialmente alle ricorrenti assenze del personale impiegato in tutte le amministrazioni coinvolte e alle difficoltà ad acquisire le necessarie informazioni in tempi brevi e certi.

Di conseguenza, la data prevista per la conclusione dell'intervento – già posticipata dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 in occasione della modifica della scheda intervento – è ora prevista al 30 luglio 2024.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	1.232.033,00	1.232.033,00	127.154,27	127.154,27	1.076,84	1.076,84
di cui Area interna BV	1.232.033,00	1.232.033,00	127.154,27	127.154,27	1.076,84	1.076,84

➤ **Ciclovía intercomunale della media Valle del Lys (MB.3)**

Dotazione finanziaria da APQ: 130.000,00,00 euro a valere sulla l. 27 dicembre 2013, n. 147 (l. stabilità 2014), art.1, commi 13-17.

La scheda intervento allegata all'APQ è stata oggetto di una prima richiesta di modifica il 1° marzo 2021 – approvata formalmente in data 22 maggio 2019 – e di una seconda richiesta il 22 novembre 2021, approvata formalmente in data 8 aprile 2022 (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2).

Con determinazione del Responsabile del servizio tecnico dell'Unité des Communes valdôtaine Walser n. 48, del 17 settembre 2021, è stato affidato l'incarico del servizio di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, collaudo nonché del servizio geologico con annessa relazione di compatibilità comprensiva di analisi di rischio necessario per la realizzazione delle opere in oggetto. Parallelamente alla progettazione, il Comune di Issime ha avviato l'iter di espropriazione dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera.

I rallentamenti verificatisi nel corso dell'attuazione del Progetto sono principalmente dovuti:

- al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- alla necessità di attivare procedure espropriative al fine di acquisire alcune aree per la realizzazione della ciclovía;
- ai ritardi alla messa in sicurezza della frana del Theilly, per la quale al momento sono state attivate le progettazioni da parte del Comune di Fontainemore.

Di conseguenza, la data prevista per la conclusione dell'intervento – già posticipata dal 30 novembre 2019 al 31 dicembre 2020 a seguito dell'approvazione della prima richiesta di modifica della scheda intervento – è ora prevista al 31 dicembre 2023, così come approvata a seguito della seconda richiesta di modifica.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Area interna BV	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.4. Associazione e assistenza tecnica

➤ **Supporto alla progettazione, gestione, monitoraggio e controllo della Strategia dell'area interna Bassa Valle (AT.1)**

Dotazione finanziaria da APQ: 187.000,00 euro a valere sulla l. 27 dicembre 2013, n. 147 (l. stabilità 2014), art.1, commi 13-17.

L'attività nel corso del 2020 è stata fortemente condizionata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto le limitazioni agli spostamenti e i diversi divieti imposti con riferimento agli assembramenti e agli eventi in presenza non hanno consentito la programmazione di alcun tipo di attività di animazione rivolta al territorio.

Parimenti, l'attività di assistenza tecnica ai soggetti attuatori, che rappresenta il secondo ambito di intervento, non ha visto soluzioni di continuità nel corso dell'anno, tenuto conto anche dell'assenza di richieste in tal senso.

Nel corso del primo semestre 2020 l'attività del servizio di Assistenza Tecnica (di seguito 'A.T.') si è concentrata sul monitoraggio e la valutazione delle attività in corso, con particolare riferimento alla condivisione delle modalità di raccolta dei dati, all'implementazione e all'aggiornamento del database finanziario da utilizzare per la predisposizione del Rapporto di monitoraggio al 31.12.2019 dell'APQ 'Area interna Bassa Valle' e alla stesura dello stesso Rapporto, in stretta collaborazione con gli uffici regionali del Dipartimento politiche strutturali e affari europei.

L'A.T. ha, inoltre, supportato l'interlocuzione tra il RUA e i soggetti attuatori e ha partecipato al Comitato di Pilotaggio, svoltosi in data 16 settembre 2020, ai fini della condivisione del sopra citato Rapporto e dell'esame delle criticità emerse. Tale esame ha suggerito l'esigenza di redigere un quadro aggiornato dell'avanzamento degli interventi al 30 settembre 2020, attività monitorata dal sopra citato Dipartimento.

Su istanza e sulla base delle indicazioni fornite dal RUP dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, l'A.T. ha predisposto un documento progettuale di lavoro finalizzato alla proposta di modifiche riguardanti alcuni interventi di difficile attuazione, discusso con i Presidenti delle 3 Unités convenzionate in data 6 novembre 2020.

Infine, l'A.T. ha supportato la preparazione e lo svolgimento dell'intervista sull'area interna Bassa Valle realizzata da Formez PA nell'ambito del lavoro di '*Monitoraggio del sistema intercomunale - Analisi dello stato di avanzamento del processo di associazione delle funzioni e servizi e del modello organizzativo per la realizzazione della SNAI*', predisponendo un documento sintetico sullo stato di avanzamento dell'APQ al 30 settembre 2020.

⁷ Il servizio di A.T., affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da 'SL&A turismo e territorio s.r.l.' e 'NOMISMA S.p.a.', è rivolto alle Unités des Communes valdôtaines Mont-Rose, Walser ed Evançon, ai Comuni ricompresi nell'area interna Bassa Valle e, in linea generale, ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nella Strategia.

A causa del prosieguo della situazione pandemica, anche per il 2021 non è stato possibile realizzare momenti di confronto pubblici sull'andamento e i risultati dell'APQ. Sono, però, state effettuate le seguenti attività.

1. Attività di comunicazione della Strategia e dei Progetti:

- è proseguita l'attività di aggiornamento dei contenuti dedicati alla Strategia sul sito web dell'Unité Mont-Rose, attività svolta dal personale dell'Unité, che ha visto un rinnovamento completo del layout e della struttura del portale, per una maggior fruibilità e chiarezza dei contenuti;
- nel mese di marzo 2021 si è tenuto un incontro *online* con le Società di Formazione attive sul territorio regionale per la presentazione dei bandi regionali in uscita sulla formazione continua e sull'occupabilità (emessi nell'ambito del Programma FSE 2014/20), rispetto ai quali è stata poi effettuata una specifica attività di animazione e comunicazione, a seguito dell'attività di confronto tra la Struttura regionale competente e l'Unité Mont-Rose, avvenuta nei primi mesi dell'anno in sede di rimodulazione delle relative schede intervento allegate all'APQ;
- nel mese di novembre 2021 è stato definito e implementato un piano di comunicazione che ha previsto l'invio di un comunicato stampa alle testate locali, l'invio di comunicazioni specifiche ai soggetti locali (associazioni di categoria, biblioteche) e la pubblicazione di una *news* sponsorizzata su *Facebook* e *LinkedIn*.

2. Attività di assistenza tecnica ai soggetti attuatori:

- supporto alla definizione delle proposte di rimodulazione delle schede intervento che hanno incontrato importanti criticità in fase di attuazione. L'attività ha riguardato, in particolare, le schede intervento IS.1.1.4.1, IS.1.1.4.2, MB.1 e SN.2;
- supporto all'organizzazione della riunione del Comitato di pilotaggio, tenutasi *online* il 18 novembre 2021, con la raccolta delle informazioni e la redazione del documento di presentazione funzionale alla condivisione della situazione di avanzamento dell'APQ, con un *focus* sulle schede oggetto di modifica;
- ad integrazione delle attività legate alla Strategia, nel mese di febbraio 2021 è stata messa a disposizione dei Comuni dell'area interna un'attività di supporto per l'avvio delle procedure connesse al bando '*Contributi ai Comuni delle Aree interne a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali - sostegno emergenza COVID-19. DPCM 24 settembre 2020*', di cui ha usufruito il Comune di Arnad, che è stato supportato dall'A.T. per la predisposizione del bando, l'identificazione dei beneficiari e la predisposizione della modulistica.

3. Attività di monitoraggio:

come per le annualità precedenti, è proseguita l'attività di aggiornamento costante – condotta mediante il confronto tra l'A.T. e il Dipartimento politiche strutturali e affari europei – della matrice di monitoraggio finalizzata a restituire un quadro complessivo dell'avanzamento finanziario delle azioni, delle attività realizzate e in programma nonché delle eventuali criticità emerse.

A fine giugno 2021 la scheda intervento allegata all'APQ è stata oggetto di una richiesta di modifica per consentire (attraverso l'inserimento di una nuova voce di spesa) l'acquisizione di servizi amministrativi, da effettuarsi con personale dipendente dagli Enti locali, finalizzati a supportare l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose nella gestione e coordinamento tecnico-amministrativo della Strategia dell'area interna Bassa Valle (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2). A seguito dell'approvazione formale di tale modifica, avvenuta in data 8 aprile 2022, la data prevista per la conclusione dell'intervento è stata posticipata dal 31.12.2021 al 31.12.2024.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	187.000,00	187.000,00	139.366,41	139.366,41	88.360,65	88.360,65
di cui Area interna BV	187.000,00	187.000,00	139.366,41	139.366,41	88.360,65	88.360,65

3.2 Stato di attuazione interventi su altri fondi

Si premette che tra gli interventi inclusi nell'APQ 'Area interna Bassa Valle', finanziati dai Programmi FESR, FSE e FEASR, alcuni sono intesi come 'Scheda Azione' (dalla quale derivano i singoli Progetti, selezionati tramite un avviso ad evidenza pubblica), mentre altri sono Progetti ad individuazione diretta, già definiti nei relativi Programmi. Pertanto, per quanto concerne le Schede Azione, si precisa che nelle tabelle concernenti l'avanzamento fisico e finanziario riportate nei seguenti paragrafi i dati relativi al Finanziamento e al Costo ammesso sono riferiti alle sole risorse dei progetti finora approvati e non alla dotazione finanziaria (iniziale o al 31.12.2021) da APQ.

Si precisa, inoltre, che non essendo stato possibile predisporre il Rapporto di monitoraggio al 31 dicembre 2020, nei successivi paragrafi sono riportati anche i risultati conseguiti dagli interventi nel corso del 2020.

3.2.1 FESR

➤ Bassa Via della Valle d'Aosta – Sentieristica (SL.1.1)

Dotazione finanziaria da APQ: 400.950,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 1.485.000,00 euro, riferito all'intero intervento insistente anche su altri comuni esterni all'area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR).

Per quanto riguarda l'itinerario complessivo, è stata approvata la modifica del tracciato (con deliberazione della Giunta regionale n. 1438 del 25.10.2019) a seguito della soppressione del passaggio nei Comuni di Valpelline e di Doues. Pertanto, il nuovo tracciato ha una lunghezza complessiva di 356,07 km, attraversa il territorio di 46 Comuni e si suddivide in 23 tappe.

Alcuni tratti del percorso presentano delle varianti provvisorie a causa di eventi franosi che riguardano, in particolare, la Tappa 3 Fontainemore-Donnas (con la necessità di percorrere lungo la strada regionale un tratto di circa 1,5 km fra i comuni di Fontainemore e Lillianes) e la Tappa 11 Roisan-Arpuilles (tracciato interrotto e relativa variante opportunamente segnalata).

Rispetto ai lavori realizzati da ditte esterne, dall'avvio delle attività (inizio 2017), sono stati eseguiti e conclusi complessivamente 23 interventi e nei primi mesi del 2022 saranno affidati i lavori di sistemazione dell'itinerario della Bassa Via nei comuni di Lillianes, Perloz e Montjovet nonché il servizio di progettazione, sicurezza e direzione lavori per il ripristino della passerella in località Frontière nel Comune di Pontboset. Entro la chiusura del Progetto si ipotizza di eseguire ancora 1 o 2 interventi di manutenzione.

Parallelamente agli interventi affidati a ditte esterne, anche le squadre forestali sono intervenute su tutte le tappe dell'itinerario con l'esecuzione, principalmente, di lavori di segnaletica (sia orizzontale che verticale) e con piccole sistemazioni, ad eccezione di alcuni interventi di una certa importanza in Bassa Valle (ripristino murature e massicciate). Le spese connesse a tali lavori hanno trovato copertura su fondi regionali.

Per quanto concerne la segnaletica, si evidenzia che il segnavia del percorso è contraddistinto dal numero 3 inserito all'interno di un triangolo capovolto (scelto in contrapposizione ai numeri 1 e 2 inseriti all'interno di un triangolo che contraddistinguono le Alte Vie) e che sono state realizzate e collocate sui cartelli lungo il percorso le alette con il marchio del '*Cammino Balteo*', la cui redazione è stata seguita nell'ambito del Progetto '*Bassa Via della Valle d'Aosta – Promozione*' (SL.1.2).

Si riportano, di seguito, i principali interventi realizzati nell'area interna Bassa Valle:

- manutenzione di un tratto di rete escursionistica nelle località Lillianes e Pian Coumarial (Tappa 2), per una spesa di circa 110 mila euro;
- manutenzione sulla rete sentieristica (Tappa 5) nel Comune di Arnad, per una spesa di circa 39 mila euro;
- ripristino della percorribilità in località Ron Farcoz nel Comune di Pontboset, per una spesa di poco più di 13 mila euro;
- ripristino murature sul sentiero Eresaz-Grand Rhun (Tappa 6) nel Comune di Emarèse, per una spesa di quasi 120 mila euro.

Inoltre, tramite accordo quadro, sono stati realizzati i seguenti piccoli interventi:

- sistemazioni del piano di calpestio sul tratto Balmas – Reclou – Plout nel Comune di Montjovet, per una spesa di quasi 2 mila euro;
- lavori di pulizia vegetazione e segnaletica (Tappa 2) tra le località Plana e Faretta nel Comune di Fontainemore, per una spesa di poco più di 5 mila euro;
- pulizia e manutenzione ordinaria di una tratta della Tappa 6, dal Lago di Villa a Challand-Saint-Victor, per una spesa di poco più di 1.300 euro;
- lavoro di sistemazione provvisoria, al fine del solo traffico pedonale, sul tratto fra le località Balmas e Toffo lungo la strada Romana nel Comune di Montjovet, per una spesa di poco più di 2 mila euro;

- pulizia e realizzazione segnaletica orizzontale e verticale nei comuni di Challand-Saint-Victor, Emarèse, Montjovet, Issogne e Verrès, per un spesa di 4 mila euro.

Le principali criticità riscontrate sono dovute a eventi naturali imprevedibili che hanno comportato la necessità di prevedere varianti provvisorie del percorso, concordate in sede di Comitato di pilotaggio del Progetto e segnalate ai fruitori del percorso sia tramite apposita segnaletica sul territorio, sia tramite il sito *web* dedicato al '*Cammino Balteo*'. Di conseguenza, la data prevista per la conclusione dell'intervento è stata posticipata dal 31.12.2022 al 31.12.2023.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	1.485.000,00	1.485.000,00	996.995,25	996.995,25	937.862,72	937.862,72
di cui Area interna BV	400.950,00	400.950,00	340.600,87	340.600,87	303.086,86	303.086,86

➤ **Bassa Via della Valle d'Aosta – Promozione (SL. 1.2).**

Dotazione finanziaria da APQ: 85.050,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 315.000,00 euro, riferito all'intero intervento insistente anche su altri comuni esterni all'area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR).

Durante il 2020 le azioni portate avanti sono state sensibilmente ridotte vista la situazione sanitaria in atto. Si è tuttavia proseguito con le iniziative promo-pubblicitarie, al fine di incrementare la conoscenza del prodotto turistico '*Cammino Balteo*'.

La prima ha riguardato la creazione della guida turistica '*Il Cammino Balteo - 350 km a piedi alla scoperta della Valle d'Aosta*', in collaborazione con la casa editrice specializzata '*Terre di Mezzo*', che ha anche permesso di produrre una cartina dell'itinerario, in scala 1:50.000, con la descrizione sintetica e l'altimetria delle 23 tappe.

Sempre correlato alla promozione della sopra citata guida, la Struttura regionale Promozione turistica, marketing territoriale e progetti europei ha partecipato alla fiera *online* "*Fa' la cosa giusta*", in programma dal 20 al 29 novembre 2020, con due appuntamenti dedicati alla presentazione della nuova guida e del grande anello sentieristico che dà concretezza a un 'camminare lento' non solo attento al territorio e al suo ricco e diversificato patrimonio, ma importante perché rivolto a un ampio *target* di utenti e, per questo motivo, realmente capace di 'aprire' la montagna a tutti. L'appuntamento ha permesso anche la promozione del prodotto sui *social* e attraverso comunicati stampa.

Sul mercato italiano si è proseguito con la campagna informativa basata su pagine pubblicitarie e articoli pubbliredazionali⁸, mentre in collaborazione con le agenzie di rappresentanza incaricate della promozione all'estero si è proseguito con il lancio del nuovo prodotto su testate specializzate e attraverso dossier e comunicati stampa rivolti ai mercati svizzero, tedesco e francese.

Un'altra azione importante per fare conoscere le potenzialità del prodotto ha riguardato l'organizzazione di viaggi di familiarizzazione riservati a giornalisti di testate specialistiche italiane ed estere che, oltre a prevedere delle camminate lungo il percorso, hanno proposto delle visite a monumenti o castelli nonché ad attività produttive e/o artigianali, al fine di presentare il prodotto '*Cammino Balteo*' sotto le sue diverse sfaccettature. Tale attività è stata replicata anche nell'anno 2021.

L'anno 2021 è stato dedicato principalmente alla prosecuzione di iniziative promo-pubblicitarie finalizzate ad incrementare la conoscenza del prodotto turistico '*Cammino Balteo*'. In particolare, sul mercato italiano è stata realizzata, in collaborazione con la redazione di '*Dove*', una guida monografica comprensiva di cartina, veicolata attraverso il n. 6 del mensile '*Dove*', in edicola il 28 maggio 2021, siti collegati ('*Doveviaggio*'), canali social (*Facebook* e *Instagram*) e *Newsletter* (50.000 utenti).

Sempre sul mercato interno, rivolgendosi ad un *target* turistico sia di prossimità che sull'intero territorio nazionale, la promozione su carta stampata⁹ e spot radiofonici (su Radio Capitale è andato in onda uno spot di 30 secondi, durante 7 giorni con 9 passaggi al giorno per un totale di n. 63 passaggi) è avvenuta tramite alcune testate del gruppo editoriale Manzoni. L'11 settembre 2021 è andata in onda una puntata del format '*Linea verde tour*' dedicata al '*Cammino Balteo*'.

Per quanto concerne i mercati esteri, le azioni sono state concentrate principalmente sul mercato francese (in particolare sulle testate '*Grands Reportages*', '*Trekmag.com*', '*Wider.com*', '*A/R Magazine Voyageur*' e '*Balades*', attraverso pubbliredazionali e campagne promozionali digitali). Si è, inoltre, proseguito, in collaborazione con le agenzie di comunicazione incaricate della promozione all'estero, con il lancio del nuovo prodotto sia su testate specializzate sia attraverso dossier e comunicati stampa che hanno dato luogo ad articoli, pubbliredazionali e *Newsletter*.

A supporto della segnaletica posizionata lungo la rete sentieristica sono stati realizzati dei pannelli turistici (dimensione 100X150), quali elemento di arredo urbano e di informazione, collocati

8 Un pubbliredazionale di 2 pagine sulla testata '*Dove7*' del gruppo editoriale RCS Media Group S.p.a. (uscita giugno 2020); un pubbliredazionale di 4 pagine sulla rivista '*Bell'Italia*' veicolata insieme al Corriere della Sera da parte di Cairo Pubblicità S.p.a. (uscita luglio 2020); 3 pagine pubblicitarie sulla testata '*Di Più*' del gruppo Cairo Pubblicità S.p.a. (uscite estate 2020); una pagina pubblicitaria sull'edizione invernale della rivista '*Images*' (uscita dicembre 2020); 2 pagine pubbliredazionali sulla rivista '*iMontBlanc*' (uscita dicembre 2020); una pagina pubblicitaria sulla rivista di arte '*MCM La storia delle cose*' (uscita dicembre 2020).

9 In particolare, sono state prodotte:

- una pagina intera uscita venerdì 5 novembre 2021 su '*La Repubblica*' (edizione nazionale);
- una pagina intera uscita domenica 7 novembre 2021 su '*La Stampa*' (edizione nazionale);
- due pagine intere uscite nella prima settimana di novembre 2021 su '*Il Secolo XIX*' (edizione nazionale);
- una pagina intera uscita nella seconda settimana di novembre 2021 su '*La Stampa*' (edizione Nord ovest).

all'ingresso dei borghi di Nus, Saint-Marcel, Châtillon, Saint-Vincent, Donnas e Verrès, allo scopo di permettere ai camminatori di ritrovare il sentiero all'uscita dei centri abitati nonché di segnalare le cose da vedere.

Tra le criticità riscontrate si segnalano la scarsità delle risorse umane da poter dedicare al Progetto e la mancanza di un animatore di progetto.

Tutte le attività previste si sono concluse in data 30 novembre 2021, ma non sono ancora completamente state recepite nell'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021, di seguito riportato:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	315.000,00	315.000,00	285.358,10	285.358,10	182.518,10	182.518,10
di cui Area interna BV	85.050,00	85.050,00	77.046,69	77.046,69	49.279,89	49.279,89

➤ **Bassa Via della Valle d'Aosta - Tecnologie e servizi innovativi (SL.1.3).**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 78.300,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 290.000,00 euro, riferito all'intero intervento insistente anche su altri comuni esterni all'area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR). A seguito di una rimodulazione effettuata nel 2019, la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento è stata ridotta a 136.146,48 euro e, di conseguenza, la quota stimata attribuibile all'area interna Bassa Valle si è attestata a 36.759,54 euro.

L'esigenza di rimodulare il Progetto '*Bassa Via della Valle d'Aosta – Tecnologie e servizi innovativi*' e di presentare il nuovo Progetto '*Bassa Via della Valle d'Aosta – Banca dati turismo*' è stata valutata positivamente dal Comitato di Pilotaggio del Progetto strategico '*Bassa Via della Valle d'Aosta*' nel corso della riunione tenutasi in data 8 marzo 2019.

Successivamente, con DGR n. 1059 del 2 agosto 2019, è stato approvato il nuovo Progetto '*Bassa Via della Valle d'Aosta – Banca dati turismo*' ed è stato rimodulato il Progetto '*Bassa Via della Valle d'Aosta – Tecnologie e servizi innovativi*', limitandone le attività alla:

- progettazione tecnico funzionale della *web application* e del database integrato delle informazioni (attività già svolta nel 2016/17);
- realizzazione del sito internet responsivo dedicato al '*Cammino Balteo*' (*WebApp*), attività iniziata nel 2018 e conclusasi, per la parte tecnica, a fine 2019.

In relazione a quanto sopra, alcune attività previste dal Progetto iniziale (acquisizione di rilevatori di passaggio, di QR code e dei servizi iniziali di mantenimento in esercizio della nuova banca dati e della *WebApp*) sono state stralciate, con un'economia pari a 153.853,52 euro. Tale importo, integrato con uno stanziamento aggiuntivo di 154.721,80 euro, costituisce la dotazione finanziaria del nuovo Progetto '*Bassa Via della Valle d'Aosta – Banca dati turismo*' (pari a 308.575,32 euro).

L'attività di popolamento dei contenuti del sito web '*Balteus*' (<https://balteus.lovevda.it>) – disponibile in italiano, francese ed inglese – è stata svolta nel corso del 2020 entro il termine di chiusura del Progetto (31.12.2020). A causa delle restrizioni ai flussi turistici imposte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il nuovo sito non è stato pubblicizzato nel corso del 2020, posticipando il lancio ufficiale alla primavera 2021.

Il nuovo sito costituisce il canale principale per veicolare le informazioni sui punti di interesse (cosa visitare) ed i servizi presenti (ricettività, ristorazione, infrastrutture sportive e ricreative, servizi guida, ecc.) sul territorio del '*Cammino Balteo*' e nelle zone adiacenti. Il sito '*Balteus*' dà, quindi, visibilità all'itinerario escursionistico nel suo complesso e all'offerta turistica delle località attraversate, ivi comprese quelle dell'area interna Bassa Valle. Le immagini ed i testi sono emozionali, con l'intento di evocare esperienze piacevoli, da ricordare e da raccontare, alimentando il 'passaparola'.

La *Gallery* a scorrimento sulla *homepage* vede le immagini protagoniste ed è possibile anche inserire video da visionare in automatico all'ingresso nel sito. Ogni immagine è una vetrina che consente di *linkare* le principali sezioni del sito ('Tappe', 'Cultura', 'Natura', 'Esperienze', 'Sport'), presenti anche nel menù di navigazione.

La mappa con il tracciato complessivo dell'itinerario è presente nella *homepage* e in altre sezioni tematiche. L'accesso cartografico consente di attivare sulla mappa (carta rilievo o sfondo satellitare) i punti di interesse elencati nella legenda (che si apre con il simbolo a 'imbuto'): 'Dove dormire', 'Dove mangiare', 'Dove acquistare', 'Natura', 'Cultura', 'Impianti a fune', 'Escursioni', 'Sport', 'Parcheggi', 'Servizi', 'Info turistiche' e 'Aree pic-nic'. Cliccando su un punto di interesse si accede alla sua scheda di dettaglio.

Nella sezione Tappe si visualizzano le schede delle 23 tappe dell'itinerario. Ad ogni tappa sono state collegate le località attraversate dal corrispondente percorso, il cui elenco consente di *linkare* le rispettive schede di approfondimento e altri punti di interesse. Per ogni tappa, sono presenti una breve descrizione, un'introduzione che mette in evidenza gli aspetti salienti della tratta percorsa e immagini pertinenti con il tracciato nonché con i territori attraversati. Sono, inoltre, state immesse le informazioni tecniche relative a: difficoltà, periodo consigliato, luogo di partenza e di arrivo e rispettiva altitudine, dislivello in salita e in discesa, lunghezza della tratta e tempi di percorrenza medi stimati in un verso e nell'altro.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	136.146,48	136.146,48	136.146,48	136.146,48	116.761,00	116.761,00
di cui Area interna BV	36.759,55	36.759,55	36.759,55	36.759,55	31.525,47	31.525,47

➤ **Bassa Via della Valle d'Aosta – Banca Dati (SL.1.3 bis).**

Dotazione finanziaria iniziale dell'intervento (non presente nell'APQ): 83.315,34 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 308.575,32 euro, riferito all'intero intervento

insistente anche su altri comuni esterni all'area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR).

Il Progetto (non presente nella versione dell'APQ sottoscritta in data 16.02.2018) è nato a seguito della rimodulazione del Progetto '*Bassa Via della Valle d'Aosta – Tecnologie e servizi innovativi*' (SL.1.3), da cui ha ereditato le economie derivanti dallo stralcio delle attività non effettuate (pari a 153.853,52 euro). Tali economie sono state integrate con uno stanziamento aggiuntivo di 154.721,80 euro, portando la dotazione finanziaria del nuovo Progetto '*Bassa Via della Valle d'Aosta – Banca dati turismo*' (SL.3.1.bis) a 308.575,32 euro.

Il Progetto, approvato con DGR n. 1059 del 2 agosto 2019, prevede l'attività di sviluppo, recupero dati e collaudo per realizzare la nuova banca dati delle informazioni turistiche a supporto di tutti gli strumenti digitali di promozione ed informazione e vede il coinvolgimento dei seguenti principali soggetti, con l'indicazione dei rispettivi ruoli:

- Beneficiario: RAVA – Struttura Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico;
- Attuatore: RAVA – Dipartimento innovazione e agenda digitale;
- Realizzatore: IN.VA. S.p.a. (società *in house* della RAVA).

L'attività di realizzazione della banca dati è stata affidata (con provvedimento dirigenziale n. 5206 dell'11 settembre 2019) a IN.VA. S.p.a., che ha previsto di avvalersi della collaborazione di un fornitore esterno, per l'individuazione del quale sono state necessarie 2 gare ad evidenza pubblica, visto che la prima era andata deserta a causa della partecipazione di un unico offerente a cui mancavano però i requisiti richiesti. La seconda gara, il cui bando è stato pubblicato in data 24.06.2020, ha visto l'aggiudicazione provvisoria alla società FastCode, che in data 27.08.2020 è stata autorizzata da IN.VA. S.p.a., nelle more della stipula del contratto, a dare inizio alle attività progettuali alle stesse condizioni tecniche ed economiche disciplinate nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata.

A seguito del perfezionamento del contratto tra IN.VA. S.p.a. ed il suo fornitore FastCode, avvenuto in data 22.10.2020, il *kick off* di progetto è stato fissato al 28.10.2020 e immediatamente dopo sono state avviate le attività di sviluppo del *software* basate sulle specifiche tecniche già in possesso dell'operatore economico FastCode. Contestualmente, IN.VA. S.p.a. ha predisposto gli ambienti di sviluppo e test e creato le credenziali di accesso al sistema da parte di tutti i componenti del *team* di lavoro del fornitore.

Nel 2021 l'attività tecnica è entrata nel vivo concretizzandosi progressivamente, all'interno dell'apposito ambiente di pre-produzione, sia nella nuova struttura logica sia nel *software* di gestione della nuova banca dati.

Dopo il consolidamento dell'architettura e dei vari modelli per il *data entry*, sono state fatte alcune prove di importazione dalla banca dati in uso (contenuti testuali, immagini e relazioni tra le informazioni) non solo da usare per i test ed i collaudi delle funzionalità via via rilasciate, ma anche per mettere a punto i meccanismi di recupero finale dei dati alla fine del Progetto.

Il collaudo del primo set di funzionalità implementate (*release 1*) è stato formalmente accettato il 20 maggio 2021.

Il 2 settembre 2021 IN.VA. S.p.a. ha formalmente richiesto una proroga del termine (originariamente previsto per il 22.10.2021) per la consegna definitiva di tutte le componenti previste dal Progetto, precisando che la già prevista complessità progettuale, unitamente al verificarsi di alcune criticità (quali la parziale non corretta interpretazione dei dettami della progettazione, la necessità di aggiornamento ed approfondimento di alcuni requisiti, l'imprevedibilità di problemi legati alla ripresa dati) stavano causando un progressivo rallentamento delle loro attività e di quelle del fornitore esterno con conseguenti ritardi che non consentivano di rispettare i termini di consegna stabiliti contrattualmente.

La Struttura beneficiaria, in data 13.9.2021, ha quindi proceduto alla richiesta di proroga del Progetto all'Autorità di gestione del Programma FESR 2014/20, al fine di poter prolungare a sua volta i termini del contratto con IN.VA. S.p.a. e per garantire così il raggiungimento degli obiettivi del Progetto. In data 12.10.2021 l'Autorità di gestione, a seguito del nulla osta del Comitato di Pilotaggio, ha confermato la concessione della proroga del Progetto alla data del 31.12.2022.

La nuova pianificazione delle attività presentata da IN.VA. S.p.a. è stata approvata, in data 17.12.2021, dal Beneficiario e dall'Attuatore del Progetto, salvo per l'attività '*Ripresa dati Produzione e switch off*', che dovrà essere eseguita solo dopo il superamento di opportuni test in pre-produzione volti a verificare l'efficace interfacciamento con la nuova banca dati e con tutti gli strumenti di comunicazione digitali che si appoggiano ad essa. Si tratta non solo di adeguare i sistemi di dialogo tra il nuovo database ed il sito ufficiale del turismo '*Lovevda*' (da realizzare, secondo la nuova pianificazione, entro il 15/02/2022), ma anche con il sito del '*Cammino Balteo*', la *app VdA Events* e con tutti i sistemi già in uso di esportazione dei dati.

Si evidenzia che il '*Collaudo R2*' non si è concluso al 29.11.2021 come previsto dal nuovo cronoprogramma di IN.VA. S.p.a. e che nuovi ritardi si stanno accumulando. Inoltre, dalla stessa Società non è pervenuta risposta in merito alle fasi finali della nuova pianificazione, preliminari e necessarie al passaggio finale dei dati e alla messa in opera del nuovo database.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	308.575,32	308.575,32	308.575,32	308.575,32	43.441,76	43.441,76
di cui Area interna BV	83.315,34	83.315,34	83.315,34	83.315,34	11.729,28	11.729,28

➤ **Bassa Via della Valle d'Aosta – Sostegno ai servizi turistici (SL. 1.4).**

Dotazione finanziaria da APQ: 540.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 2.000.000,00 euro, riferito all'intero intervento insistente anche su altri comuni esterni all'area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR). A seguito di una rimodulazione, la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento è stata

ridotta a 1.500.000,00 euro, mentre la quota stimata attribuibile all'area interna Bassa Valle è rimasta invariata.

Per la concessione di contributi in conto capitale in regime *'de minimis'* a supporto dei servizi turistici riconducibili al *'Cammino Balteo'*, sono stati emessi due avvisi:

- il primo ad aprile 2018, rispetto al quale, in data 18 giugno 2020, è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti integralmente finanziabili, con 3 progetti ammessi a finanziamento, per un totale di 219.247,01 euro di contributi complessivamente concedibili, a fronte di una spesa ammessa complessiva per investimenti di 415.307,60 euro (di cui 208.487,03 euro per il progetto ricadente nell'area interna Bassa Valle). Al 31 dicembre 2021 è stato erogato un contributo di 16.280,70 euro al primo dei 3 progetti ammessi a finanziamento. Degli altri 2 progetti, 1 (con contributo concedibile pari a 100.000,00 euro) riguarda un'iniziativa realizzata nel territorio dell'area interna Bassa Valle. Con DGR del 9 agosto 2021 è stata approvata, per cause ascrivibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la proroga di 1 anno dei termini di ultimazione delle iniziative di investimento finanziate ai sensi del primo Avviso;
- il secondo ad agosto 2019, rispetto al quale è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande, in un primo momento dal 20.12.2019 al 17.04.2020 e, successivamente, al 31.07.2020. La dotazione finanziaria pubblica del secondo Avviso è stata incrementata, con DGR del 27 marzo 2020, da 500.000,00 euro a 1.200.000,00 euro. Con DGR dell'11 settembre 2020 tale dotazione è stata ulteriormente incrementata di 80.752,78 euro, somma residuante dal primo Avviso, portando l'ammontare complessivo a 1.280.752,78 euro. Per il secondo Avviso, sono state istruite 26 domande di contributo, di cui 6 relative ad iniziative ubicate nel territorio dell'area interna Bassa Valle. Il 26 ottobre 2021 si è conclusa l'intera attività istruttoria (formale, tecnica e finanziaria), mentre il 28 ottobre 2021 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti integralmente finanziabili, con 13 progetti ammessi a finanziamento (di cui 4 ricadenti nell'area interna Bassa Valle), per un ammontare complessivo di contributi concessi pari a 1.176.633,82 euro (di cui 360.244,69 euro nell'area interna Bassa Valle), a fronte di una spesa ammessa complessiva per investimenti di 2.964.269,61 euro (di cui 1.104.342,88 euro nell'area interna Bassa Valle).

Tra le principali criticità riscontrate si segnalano:

- in termini generali, carenza di personale della Struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'intervento, derivante da alcuni pensionamenti e aspettative di diversa natura. Ad aggravare significativamente tale disagio hanno contribuito le misure organizzative adottate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per limitare la diffusione del contagio da COVID-19, le quali hanno comportato, per la prevalenza dei dipendenti della Struttura, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità *smart working*. A causa dell'evento pandemico il dirigente e l'unico funzionario della sopra citata Struttura sono stati altresì direttamente coinvolti, a decorrere dal mese di aprile 2020 e per tutto l'anno 2021, nel concepimento e nella redazione delle disposizioni concernenti le misure di sostegno finanziario alle imprese per far fronte alle chiusure delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica, non potendo, così, svolgere le mansioni ordinarie come l'attuazione dell'intervento SL.1.4;

- rispetto al primo Avviso, difficoltà nella fase di istruttoria di un progetto presentato da un consorzio con 47 imprese associate, che ha comportato verifiche ed adempimenti amministrativi molto dispendiosi in termini di tempo in relazione ad alcune specificità della forma di organizzazione imprenditoriale del consorzio, alla natura degli investimenti prospettati dallo stesso e alla necessaria verifica di conformità dell'istanza con la disciplina *de minimis*;
- rispetto al secondo Avviso, le istruttorie dei 26 progetti sono state tutte oggetto di sospensione in ragione della necessità di acquisire ulteriore documentazione ed informazioni da parte dei soggetti proponenti. In generale, si è osservata una grave carenza amministrativa da parte delle imprese beneficiarie nel trasmettere la documentazione richiesta e si è dovuto procedere a frequenti solleciti e richieste di documentazione integrativa;
- la complessità per le imprese ad interfacciarsi con il sistema informativo SISPREG2014, con la conseguente necessità da parte della sopra richiamata Struttura di fornire ogni supporto informativo possibile e, laddove necessario, indirizzare le imprese al relativo numero verde di assistenza.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Azione al 31.12.2021:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	35	0	19	16	3.379.577,21	1.395.880,83	1.395.880,83	1.395.880,83	16.280,70	16.280,70
Al BV	6	0	1	5	1.312.829,91	460.244,69	460.244,69	460.244,69	0,00	0,00

➤ **Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da inserire in Valle d'Aosta – Rafforzamento servizi offerti presso gli incubatori di impresa (SL.4.1)**

Dotazione finanziaria da APQ: 740.784,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 1.683.600,00 euro, riferito all'intero intervento insistente anche su altri comuni esterni all'area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR).

Il servizio di accompagnamento alle imprese e di animazione degli incubatori di imprese denominate 'Pépinieres d'Entreprises Espace Aosta' e 'Pépinieres d'Entreprises di Pont-Saint-Martin' è iniziato il 1° aprile 2017 e si è concluso il 7 agosto 2020. In tale periodo sono state realizzate le seguenti attività:

- 5 'Call' per la selezione di *startup* innovative presso gli incubatori (la *call* prevista per l'ultimo semestre non è stata effettuata a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- 49 eventi formativi e divulgativi nella Pépinière di Aosta e 32 eventi nella Pépinière di Pont-Saint-Martin;
- servizi di assistenza e tutoraggio alle imprese su base mensile presso le sedi delle *startup*;
- azioni di promozione e valorizzazione delle imprese e degli incubatori, le cui principali iniziative si sono concretizzate in un '*Percorso di Innovazione*' per le *startup* insediate, un modello di '*Valutazione del profilo imprenditoriale di una Startup Innovativa*' e la definizione di un percorso formativo per le *startup* dalle caratteristiche 'più operative';

- fornitura di servizi informativi *online*, con l'invio ogni quindici giorni di una *newsletter* e la diffusione di notizie attraverso altri canali quali *Facebook*, *Twitter* e *Linkedin*;
- attività di *scouting* e animazione territoriale, al fine di favorire la creazione di nuovi rapporti con gli *stakeholder* territoriali e di altre regioni;
- assistenza alle imprese nella fase di uscita dagli incubatori;
- un evento formativo di elevato livello (*winter school*);
- 6 laboratori di animazione territoriale.

Dall'avvio del servizio sono state insediate 18 nuove *startup*, di cui 10 nella P  pini  re di Aosta e 8 nella P  pini  re di Pont-Saint-Martin.

Il soggetto gestore si    anche reso disponibile a collaborare nella realizzazione e nella gestione del premio '*Crea la tua Startup*' con attivit   di tutoraggio e di formazione, con la partecipazione alle riunioni e con l'organizzazione dell'evento finale tenutosi a Pont-Saint-Martin il 23 luglio 2020.

In relazione al rispetto delle politiche europee in materia di sviluppo sostenibile, si segnala che le imprese insediate devono operare negli ambiti tecnologici previsti dalla Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Valle d'Aosta per il periodo 2014/20. Inoltre, nell'ottica della specializzazione produttiva, agli incubatori di imprese sono attribuite finalit   vocazionali: l'ambito tecnologico delle imprese incubate nella P  pini  re d'Entreprises Espace Aosta    la '*Montagna sostenibile*', mentre quello delle imprese incubate nella P  pini  re d'Entreprises di Pont-Saint-Martin    la '*Montagna di eccellenza*'.

Lo stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale dettato dall'epidemia da COVID-19 ha impedito la normale conclusione del servizio, la cui scadenza contrattuale (31.03.2020)    stata prorogata al 07.08.2020.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	1.683.600,00	1.683.600,00	803.634,00	803.634,00	496.215,49	496.215,49
di cui Area interna BV	740.784,00	740.784,00	353.598,96	353.598,96	218.334,82	218.334,82

➤ **Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da inserire in Valle d'Aosta – Rafforzamento servizi offerti presso l'incubatore d'impresa e creazione di un acceleratore d'impresa (SL.4.1 bis)**

Dotazione finanziaria iniziale dell'intervento (non presente nell'APQ): 1.105.808,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 2.513.200,00 euro, riferito all'intero intervento insistente anche su altri comuni esterni all'area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR).

Il presente Progetto (non presente nella versione dell'APQ sottoscritta in data 16.02.2018)    nato a seguito della decisione dell'Amministrazione regionale, nell'anno 2020, di non procedere

con il rinnovo triennale del contratto stipulato nell'ambito del Progetto '*Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta - Rafforzamento servizi offerti presso gli incubatori di impresa*' (SL.4.1), in quanto – rispetto alla modalità gestionale consistente nell'erogazione dei servizi logistici alle imprese incubate da parte di Vallée d'Aoste Structure S.r.l. e nell'erogazione dei servizi di accompagnamento alle imprese e di animazione da parte del soggetto affidatario – ha preferito una diversa modalità gestionale, consistente nell'affidamento della gestione complessiva degli incubatori, comprensiva della fornitura dei servizi logistici alle imprese incubate, ad un unico soggetto. Per questo motivo l'Amministrazione regionale ha proceduto ad approvare il Progetto SL.4.1 bis, utilizzando in parte le economie del Progetto SL.4.1 e in parte risorse aggiuntive regionali, e ad indire un nuovo appalto per l'affidamento del servizio di gestione degli incubatori di imprese.

Il Progetto SL.4.1 bis prevede la gestione di un incubatore di imprese, denominato *StartAlp*, e di un acceleratore di imprese, denominato *ScaleAlp*, con le connesse attività di promozione, *scouting* e selezione dei soggetti da insediare, fornitura di servizi logistici, tutoraggio, consulenza, informazione, formazione, comunicazione, *business development* e *pitch coaching* a favore dei soggetti insediati nell'incubatore/acceleratore o che possono insediarsi. Prevede, inoltre, l'allestimento, nell'acceleratore, di un laboratorio di prototipazione e la predisposizione, all'interno dell'incubatore, di uno spazio di *co-working*.

I principali soggetti coinvolti, con l'indicazione dei rispettivi ruoli, sono:

- Beneficiario: RAVA – Struttura Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- Attuatore: RAVA – Struttura Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- Realizzatore: Fondazione Giacomo Brodolini S.r.l.

Il Realizzatore dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- popolare l'incubatore e l'acceleratore con imprese rispondenti alle finalità vocazionali della *Smart Specialisation Strategy* della Valle d'Aosta;
- creare, all'interno dell'incubatore e dell'acceleratore di imprese, un clima favorevole allo sviluppo delle imprese insediate;
- sviluppare una fattiva collaborazione con l'Ente committente e le sue società controllate per contribuire allo sviluppo economico della Valle d'Aosta.

Il servizio è iniziato il 1° giugno 2021 e sono state realizzate le seguenti attività:

- 2 '*Call*' per la selezione di *startup* innovative presso gli incubatori;
- 5 eventi divulgativi presso la Pépinière di Aosta;
- servizi di assistenza e tutoraggio alle imprese su base mensile presso le sedi delle *startup*;
- azioni di promozione e valorizzazione delle imprese e degli incubatori;
- fornitura di servizi informativi *online*, con l'invio ogni mese di una *newsletter* e la diffusione di notizie attraverso altri canali quali *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* e *Linkedin*;
- attività di *scouting* e animazione territoriale, al fine di favorire la creazione di nuovi rapporti con gli *stakeholder* territoriali e di altre regioni;
- assistenza alle imprese nella fase di uscita dagli incubatori.

Per ora non sono state riscontrate particolari criticità nell'attuazione del Progetto, le cui attività dovrebbero concludersi entro il 31.05.2023.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	2.513.200,00	2.513.200,00	2.332.640,00	2.332.640,00	264.144,64	264.144,64
di cui Area interna BV	1.105.808,00	1.105.808,00	1.026.361,60	1.026.361,60	116.223,64	116.223,64

➤ **Supporto allo sviluppo delle imprese insediate o da inserire in Valle d'Aosta – Locazione spazi ed erogazione servizi di base (SL.4.2)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 264.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 600.000,00 euro, riferito all'intero intervento insistente anche su altri comuni esterni all'area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR). A seguito di una rimodulazione, la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento è stata incrementata a 880.000,00 euro e, di conseguenza, la quota stimata attribuibile all'area interna Bassa Valle ha raggiunto i 387.200,00 euro.

A causa dell'avanzamento di spesa non soddisfacente nel primo periodo di attuazione dell'intervento (annualità 2016 e 2017), con DGR n. 301/2018 sono state approvate le nuove linee guida per le agevolazioni alle imprese, a seguito delle quali il contributo per l'abbattimento dei canoni di servizio presso le Pépinières di Aosta e Pont-Saint-Martin è stato elevato dal 50% al 70%, nel caso di contributi in regime *de minimis*. Di conseguenza, nel 2019 (con DGR n. 1122/2019), è stata integrata la dotazione finanziaria dell'intervento con 280.000,00 euro di risorse aggiuntive regionali, di cui 123.200,00 euro riconducibili all'area interna Bassa Valle. Tali risorse consentiranno di dare continuità all'intervento sino alla conclusione dello stesso, prevista entro il 31.12.2023.

Nel 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'interruzione dei servizi, l'abbattimento del canone è stato elevato al 100% per il periodo dal 23 marzo 2020 e sino al 31 dicembre 2021.

Dopo la stipula di 19 contratti di insediamento presso le Pépinières di Aosta e Pont-Saint-Martin nel periodo 01.01.2016 – 31.12.2019, nel 2020 sono stati stipulati ulteriori 4 contratti che erano in istruttoria l'anno precedente, portando il totale a 23 imprese beneficiarie, di cui 12 insediate all'interno della Pépinière di Pont-Saint-Martin (area interna Bassa Valle). Nell'anno 2021 non sono stati stipulati altri contratti di insediamento, visto che la durata triennale degli stessi avrebbe portato la scadenza al 2024, oltre i tempi previsti dal Programma FESR 2014/20. L'intervento, dunque, non avrà altri sviluppi e si continuerà soltanto a erogare i contributi per i contratti già stipulati che scadranno entro il 31.12.2023.

Tra le principali criticità riscontrate si segnalano:

- il recupero e il caricamento sul sistema informativo SISPREG2014 di alcune pratiche pregresse (soprattutto con riferimento ad alcuni imprenditori non più insediati) da parte della

Struttura regionale che si occupa della concessione ed erogazione dei contributi, subentrata al posto di Vallée d'Aoste Structure S.r.l. a seguito della rimozione di quest'ultima dall'incarico di organismo intermedio dell'intervento a far data dal 7.12.2018;

- la regolarizzazione degli imprenditori che presentano situazioni debitorie nei confronti di Vallée d'Aoste Structure S.r.l., non avendo puntualmente pagato le fatture di locazione spazi;
- difficoltà, soprattutto dal punto di vista tecnico, nel gestire su SISPREG2014 un'azione che prevede rendiconti mensili o trimestrali per una durata complessiva di 36 mesi;
- necessità di aumentare su SISPREG2014 la dotazione dei piani finanziari originali di ciascuna impresa, attività in capo agli uffici di IN.VA. S.p.a. che ha comportato notevoli difficoltà legate alle tempistiche e all'iter necessario per effettuare le modifiche, con rallentamenti dovuti al contestuale impegno degli uffici stessi nella realizzazione delle misure anti-Covid;
- necessità di aggiornare i piani finanziari delle imprese uscite anticipatamente dagli incubatori, delle imprese insolventi e delle imprese che, pur essendo insediate ed avendo regolarmente pagato i canoni di locazione, non hanno mai presentato un rendiconto su SISPREG2014, disimpegnando e quindi riducendo le somme inizialmente stanziare a loro favore.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Azione al 31.12.2021:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	24	0	0	24	689.667,45	542.711,56	542.152,86	542.152,86	453.892,13	453.892,13
AI BV	12	0	0	12	427.142,26	351.009,10	350.450,40	350.450,40	304.112,88	304.112,88

3.2.2 FSE

➤ **La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – Accademia e bottega (IS.1.1.1)**

Dotazione finanziaria da APQ: 350.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 450.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE).

A seguito di un lungo percorso di analisi dei fabbisogni del territorio – coordinato dalla Struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'intervento e condiviso con il Soggetto capofila dell'APQ (Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose) e con i potenziali beneficiari – si è reso necessario richiedere una modifica della scheda intervento allegata all'APQ per renderla il più possibile rispondente ai fabbisogni espressi. Tale richiesta è stata inoltrata all'ACT in data 12 marzo 2021 e approvata formalmente in data 8 aprile 2022 (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2).

Nel corso della seconda parte del 2021 la Struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'intervento ha predisposto il relativo Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali, tenendo conto di molteplici aspetti, primo fra tutti l'adeguamento dell'Avviso stesso ai vincoli imposti dal Programma FSE 2014/20 (che ha come scopo principale di finanziare

percorsi di formazione professionale) all'ambito dell'istruzione. Per vincoli di bilancio derivanti dalle chiusure di fine anno, non è stato possibile approvare l'Avviso entro il 31 dicembre 2021, ma solo in data 2 febbraio 2022.

Visto che l'intervento non risulta ancora avviato, al 31.12.2021 non si registrano dati di avanzamento fisico e finanziario.

➤ **La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – Alternanza scuola-lavoro (IS.1.1.2)**

Dotazione finanziaria da APQ: 156.500,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 830.400,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE).

La Scheda Azione riconducibile all'intervento prevedeva 3 sessioni di presentazione dei Progetti, rispetto alle quali:

- la prima, riferita all'anno scolastico 2017/18, si è conclusa il 14.07.2017 e i relativi Progetti risultano conclusi, rendicontati e controllati;
- la seconda, riferita all'anno scolastico 2018/19, la cui conclusione era prevista per il 26.04.2018, non è stata avviata;
- la terza, riferita all'anno scolastico 2019/20, la cui conclusione era prevista per il 26.04.2019, non è stata avviata.

Per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 non sono stati avviati Progetti specifici a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE), in quanto i percorsi di 'Alternanza scuola-lavoro' e di 'Imprenditorialità giovanile' (ridenominati 'Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento', ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784) sono entrati a far parte del *curriculum* dello studente (ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante 'Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti'). Pertanto, il relativo finanziamento è stato assegnato ed erogato alle istituzioni scolastiche con fondi regionali appositamente attivati a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 29 marzo 2018, n. 4 (che, tra l'altro, ha modificato la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 recante 'Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta') e con le stesse modalità del fondo di funzionamento amministrativo-didattico (non soggetto a rendicontazione ai sensi della nota del Ministero dell'Università e della ricerca prot. n. 3623 del 10 marzo 2016).

Nonostante l'utilizzo di una fonte finanziaria diversa rispetto a quella prevista dall'APQ, gli interventi IS.1.1.2 e IS.1.1.3 sono stati attuati perseguendo le stesse finalità inizialmente previste, con la sola differenza che i fondi regionali, essendo stati erogati cumulativamente, non consentono di dar conto dell'avanzamento finanziario per singolo intervento. Per cercare di mantenere inalterato l'impianto delle due schede intervento allegate all'APQ e stimare l'importo dei fondi regionali sulle attività di 'Alternanza scuola-lavoro' e 'Imprenditorialità giovanile', si è tenuto conto dell'impatto percentuale della spesa sostenuta nell'anno scolastico 2017/18 con i progetti FSE, pari a circa il 69% per 'Alternanza scuola-lavoro' e il 31% per 'Imprenditorialità

giovane'. Tali percentuali sono state confermate dall'Ufficio regionale predisposto ai rapporti con le istituzioni scolastiche anche per i successivi anni scolastici. Per quanto concerne l'area interna Bassa Valle, l'ISILTP di Verrès, sulla base delle esigenze formative rilevate, ha finora destinato l'intero importo erogato dalla Regione allo svolgimento di attività di '*Alternanza scuola-lavoro*'.

Al fine di poter valorizzare anche le attività realizzate a valere sui fondi regionali, il RUA, in data 19 luglio 2021, ha proposto all'ACT di dar conto dell'attuazione degli interventi IS.1.1.2 e IS.1.1.3 nell'ambito delle prossime Relazioni di avanzamento annuale aggiornando il quadro d'insieme delle risorse complessivamente destinate agli stessi, ma senza modificare le relative schede intervento allegate all'APQ. A novembre 2021 l'ACT ha comunicato informalmente alla Struttura di riferimento del RUA la necessità di modificare anche le singole schede intervento (lasciandole distinte) aggiornando il quadro finanziario, i tempi di attuazione e ogni altra modifica effettuata rispetto alle stesse schede allegate all'APQ, al fine di poter avviare la procedura di consultazione del Tavolo dei sottoscrittori. Pertanto, in data 2 settembre 2022, il RUA ha inoltrato la proposta di modifica delle due schede intervento all'ACT, che ha immediatamente provveduto ad avviare la consultazione del Tavolo dei sottoscrittori (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2).

Tra le principali criticità riscontrate si segnalano:

- per i progetti finanziati dal Programma FSE per l'anno scolastico 2017/18, le difficoltà delle istituzioni scolastiche ad attuare gli interventi in qualità di beneficiari a causa della complessità delle regole di gestione e rendicontazione previste dal FSE. Tali difficoltà hanno poi portato alla rinuncia, da parte delle istituzioni scolastiche, alla presentazione di progetti a valere sulle sessioni previste per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, preferendo l'utilizzo dei sopra citati fondi regionali;
- per le attività finanziate da fondi regionali, i rallentamenti causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel corso del 2021 le istituzioni scolastiche hanno recuperato il ritardo accumulato e riportato le attività in linea con l'anno scolastico di pertinenza.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Azione, al 31.12.2021, a valere sul Programma FSE (dati riferiti all'anno scolastico 2017/18):

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	7	0	1	6	200.813,09	165.098,94	165.098,94	165.098,94	163.569,89	163.569,89
Al BV	2	0	0	2	44.021,69	40.998,63	40.998,63	40.998,63	40.998,63	40.998,63

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Azione, al 31.12.2021, a valere sui fondi regionali (dati riferiti agli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21):

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	Non quantificabile				420.727,47	420.727,47	420.727,47	420.727,47	378.856,34	378.856,34
Al BV	Non quantificabile				104.587,74	104.587,74	104.587,74	104.587,74	92.904,68	92.904,68

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario complessivo dell'Azione al 31.12.2021:

	Numero Progetti*				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	7	0	1	6	621.540,56	585.826,41	585.826,41	585.826,41	542.426,23	542.426,23
AI BV	2	0	0	2	148.609,43	145.586,37	145.586,37	145.586,37	133.903,31	133.903,31

* Visto che per le attività di 'Alternanza scuola-lavoro' finanziate con risorse regionali non è possibile quantificare il numero di progetti, i dati complessivi relativi al numero dei progetti sono riferiti esclusivamente alle attività finanziate dal Programma FSE per l'anno scolastico 2017/18.

➤ **La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – Imprenditorialità giovanile (IS.1.1.3)**

Dotazione finanziaria da APQ: 96.500,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 569.600,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE).

La Scheda Azione riconducibile all'intervento prevedeva 3 sessioni di presentazione dei Progetti, rispetto alle quali:

- la prima, riferita all'anno scolastico 2017/18, si è conclusa il 14.07.2017 e i relativi Progetti risultano conclusi, rendicontati e controllati;
- la seconda, riferita all'anno scolastico 2018/19, la cui conclusione era prevista per il 26.04.2018, non è stata avviata;
- la terza, riferita all'anno scolastico 2019/20, la cui conclusione era prevista per il 26.04.2019, non è stata avviata.

Per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 non sono stati avviati Progetti specifici a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE), in quanto i percorsi di 'Alternanza scuola-lavoro' e di 'Imprenditorialità giovanile' (ridenominati 'Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento', ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 784) sono entrati a far parte del curriculum dello studente (ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante 'Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti'). Pertanto, il relativo finanziamento è stato assegnato ed erogato alle istituzioni scolastiche con fondi regionali appositamente attivati a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 29 marzo 2018, n. 4 (che, tra l'altro, ha modificato la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 recante 'Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta') e con le

stesse modalità del fondo di funzionamento amministrativo-didattico (non soggetto a rendicontazione ai sensi della nota del Ministero dell'Università e della ricerca prot. n. 3623 del 10 marzo 2016).

Nonostante l'utilizzo di una fonte finanziaria diversa rispetto a quella prevista dall'APQ, gli interventi IS.1.1.2 e IS.1.1.3 sono stati attuati perseguendo le stesse finalità inizialmente previste, con la sola differenza che i fondi regionali, essendo stati erogati cumulativamente, non consentono di dar conto dell'avanzamento finanziario per singolo intervento. Per cercare di mantenere inalterato l'impianto delle due schede intervento allegate all'APQ e stimare l'importo dei fondi regionali sulle attività di *'Alternanza scuola-lavoro'* e *'Imprenditorialità giovanile'*, si è tenuto conto dell'impatto percentuale della spesa sostenuta nell'anno scolastico 2017/18 con i progetti FSE, pari a circa il 69% per *'Alternanza scuola-lavoro'* e il 31% per *'Imprenditorialità giovanile'*. Tali percentuali sono state confermate dall'Ufficio regionale predisposto ai rapporti con le istituzioni scolastiche anche per i successivi anni scolastici. Per quanto concerne l'area interna Bassa Valle, l'ISILTP di Verrès, sulla base delle esigenze formative rilevate, ha finora destinato l'intero importo erogato dalla Regione allo svolgimento di attività di *'Alternanza scuola-lavoro'*.

Al fine di poter valorizzare anche le attività realizzate a valere sui fondi regionali, il RUA, in data 19 luglio 2021, ha proposto all'ACT di dar conto dell'attuazione degli interventi IS.1.1.2 e IS.1.1.3 nell'ambito delle prossime Relazioni di avanzamento annuale aggiornando il quadro d'insieme delle risorse complessivamente destinate agli stessi, ma senza modificare le relative schede intervento allegate all'APQ. A novembre 2021 l'ACT ha comunicato informalmente alla Struttura di riferimento del RUA la necessità di modificare anche le singole schede intervento (lasciandole distinte) aggiornando il quadro finanziario, i tempi di attuazione ed ogni altra modifica effettuata rispetto alle stesse schede allegate all'APQ, al fine di poter avviare la procedura di consultazione del Tavolo dei sottoscrittori. Pertanto, in data 2 settembre 2022, il RUA ha inoltrato la proposta di modifica delle due schede intervento all'ACT, che ha immediatamente provveduto ad avviare la consultazione del Tavolo dei sottoscrittori (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2).

Tra le principali criticità riscontrate si segnalano:

- per i progetti finanziati dal Programma FSE per l'anno scolastico 2017/18, le difficoltà delle istituzioni scolastiche ad attuare gli interventi in qualità di beneficiari a causa della complessità delle regole di gestione e rendicontazione previste dal FSE. Tali difficoltà hanno poi portato alla rinuncia, da parte delle istituzioni scolastiche, alla presentazione di progetti a valere sulle sessioni previste per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, preferendo l'utilizzo dei sopra citati fondi regionali;
- per le attività finanziate da fondi regionali, i rallentamenti causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel corso del 2021 le istituzioni scolastiche hanno recuperato il ritardo accumulato e riportato le attività in linea con l'anno scolastico di pertinenza.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Azione, al 31.12.2021, a valere sul Programma FSE (dati riferiti all'anno scolastico 2017/18):

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	5	0	1	4	59.092,18	52.651,29	52.651,29	52.651,29	51.121,02	50.821,94
Al BV	1	0	0	1	18.369,00	18.359,27	18.359,27	18.359,27	18.359,27	18.359,27

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Azione, al 31.12.2021, a valere sui fondi regionali (dati riferiti agli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21):

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	Non quantificabile				142.033,79	142.033,79	142.033,79	142.033,79	123.222,13	123.222,13
Al BV	Non quantificabile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario complessivo dell'Azione al 31.12.2021:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	5	0	1	4	201.125,97	194.685,08	194.685,08	194.685,08	174.343,15	174.044,07
Al BV	1	0	0	1	18.369,00	18.359,27	18.359,27	18.359,27	18.359,27	18.359,27

* Visto che per le attività di 'Imprenditorialità giovanile' finanziate con risorse regionali non è possibile quantificare il numero di progetti, i dati complessivi relativi al numero dei progetti sono riferiti esclusivamente alle attività finanziate dal Programma FSE per l'anno scolastico 2017/18.

➤ **La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – Studenti in movimento - Stage all'estero (IS.1.1.4)**

Dotazione finanziaria da APQ: 130.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 1.400.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE). Tale dotazione è stata convenzionalmente suddivisa in due parti uguali per gli interventi IS.1.1.4.1 e IS.1.1.4.2.

L'intervento IS.1.1.4 previsto nell'APQ è stato suddiviso, sin dalle prime fasi di attuazione, in due parti per distinguere le attività relative agli 'Stage aziendali all'estero' (IS.1.1.4.1) dalle attività relative alla 'Mobilità linguistica all'estero' (IS.1.1.4.2), come di seguito rappresentato.

➤ **La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – 'Studenti in movimento – Stage aziendali all'estero' (IS.1.1.4.1)**

Per gli stage aziendali all'estero sono state previste 2 sessioni di presentazioni dei progetti:

- la prima, concernente l'anno scolastico 2018/19, ha visto la presentazione di 4 progetti, tutti approvati, ma nessuno riferibile al territorio dell'area interna Bassa Valle. Le attività di tali progetti si sono concluse nel secondo semestre 2019, mentre le operazioni di chiusura

finanziaria degli stessi (compresi i controlli di primo livello) si sono concluse nel secondo semestre 2020;

- la seconda, concernente inizialmente l'anno scolastico 2019/20 – dopo una proroga dei termini a inizio 2020 – ha visto la presentazione di 3 progetti, tutti approvati, ma nessuno riferibile al territorio dell'area interna Bassa Valle. Per tali progetti, vista l'insorgenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato necessario prorogare la data di conclusione delle attività al 30.09.2021 facendo, così, rientrare i relativi progetti nell'ambito dell'anno scolastico 2020/21. Successivamente, due istituzioni scolastiche hanno rinunciato al finanziamento per le difficoltà riscontrate nella fase di attuazione a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, mentre un'istituzione scolastica ha dato regolarmente avvio alle attività e le ha concluse entro la data prevista (per quest'ultimo progetto sono ancora in corso le relative operazioni di chiusura finanziaria).

Vista l'assenza di progetti riconducibili al territorio dell'area interna Bassa Valle, il Soggetto capofila e le strutture regionali interessate hanno condiviso con il RUA l'opportunità di convertire le iniziative riferite agli interventi IS.1.1.4.1 e IS.1.1.4.2 in due nuovi interventi (la cui competenza verrebbe assegnata al Dipartimento regionale Politiche del lavoro e della formazione), al fine di soddisfare le nuove esigenze manifestate dal territorio dell'area interna Bassa Valle. Le due nuove schede intervento – denominate SL.5.1 '*Interventi per la formazione di giovani e adulti*' e SL.5.2 '*Interventi per la formazione continua interaziendale dei dipendenti e/o titolari delle micro, piccole, medie e grandi imprese*' – sono state inoltrate il 5 ottobre 2021 dal RUA all'ACT, che ha avviato la consultazione del Tavolo dei sottoscrittori in data 10 agosto 2022 (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2).

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Azione al 31.12.2021:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	7	0	0	7	131.744,46	121.555,57	121.555,57	121.555,57	110.874,77	110.874,77
Al BV	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

➤ **La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – 'Studenti in movimento – Mobilità linguistica all'estero' (IS.1.1.4.2)**

L'avviso per la presentazione dei progetti per la '*Mobilità linguistica all'estero*' avrebbe dovuto essere approvato nel corso del 2020, ma a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non è stato possibile. Pertanto, come già riportato per l'intervento IS.1.1.4.1, il Soggetto capofila e le strutture regionali interessate hanno condiviso con il RUA l'opportunità di convertire le iniziative riferite agli interventi IS.1.1.4.1 e IS.1.1.4.2 in due nuovi interventi (la cui competenza verrebbe assegnata al Dipartimento regionale Politiche del lavoro e della formazione), al fine di soddisfare le nuove esigenze manifestate dal territorio dell'area interna Bassa Valle. Le due nuove schede intervento – denominate SL.5.1 '*Interventi per la formazione di giovani e adulti*' e SL.5.2 '*Interventi per la formazione continua interaziendale dei dipendenti e/o titolari delle micro, piccole, medie e grandi imprese*' – sono state inoltrate il 5 ottobre 2021 dal RUA all'ACT,

che ha avviato la consultazione del Tavolo dei sottoscrittori in data 10 agosto 2022 (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2).

Visto che l'intervento non risulta ancora avviato, al 31.12.2021 non si registrano dati di avanzamento fisico e finanziario.

➤ **Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa (SL.4.3)**

Dotazione finanziaria da APQ: 70.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 220.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE).

Dalla scheda Azione in oggetto è derivato un unico Progetto denominato '*Interventi di animazione territoriale per la diffusione della cultura d'impresa*', attuato da Vallée d'Aoste Structure s.r.l., per il quale sono state realizzate, tra l'altro, le seguenti principali attività:

- organizzazione, a livello locale, delle edizioni della *Start Cup* Piemonte Valle d'Aosta (concorso competitivo per l'idea d'impresa innovativa). Le aziende costituite dai *team* dei vincitori delle edizioni dal 2016 al 2018 sono state tutte insediate nelle Pépinières d'entreprise di Aosta e Pont-Saint-Martin. In particolare, l'azienda Tora S.r.l. (vincitrice nel 2016) e l'azienda QTool S.r.l. (vincitrice nel 2018) sono state insediate nella Pépinière d'entreprise di Pont-Saint-Martin, mentre l'azienda Rimchain S.r.l. (vincitrice nel 2017) è stata insediata nella Pépinières d'entreprise di Aosta;
- promozione e svolgimento in ambito locale delle edizioni dal 2016 al 2018 dell'iniziativa '*Impresa in azione*', avviata a livello nazionale dall'associazione *Junior Achievement Italia*, in collaborazione con la quale sono stati realizzati, presso diverse istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta, laboratori didattici di educazione all'imprenditorialità, a cui hanno aderito 122 studenti nel corso dell'anno scolastico 2016/17 (di cui 60 riconducibili all'area interna Bassa Valle) e 630 studenti nel corso dell'anno scolastico 2017/18 (di cui 24 riconducibili all'area interna Bassa Valle);
- attivazione, nell'ambito dell'attività denominata '*Pre-incubazione Espace Innovation*', di percorsi di insediamento, orientamento e tutoraggio rivolti a soggetti che intendono sviluppare un progetto innovativo di impresa. I vincitori del premio '*Espace innovation*' hanno avuto diritto: ad un premio in denaro messo a disposizione dagli sponsor; alla partecipazione gratuita al Programma di '*Pre-incubazione Espace Innovation*', consistente nell'insediamento di uno spazio di *coworking* e nella fornitura di servizi di *tutoring* presso la Pépinière d'entreprise di Aosta; l'affiancamento a cura di un '*mentor*';
- fornitura di assistenza, servizi e supporto organizzativo nell'organizzazione di numerosi eventi tenutisi presso le Pépinières d'entreprise di Aosta e Pont-Saint-Martin.

Le attività riconducibili al Progetto si sono concluse in data 31.12.2018, mentre sono ancora in corso le operazioni di chiusura finanziaria dello stesso a seguito del controllo di II livello effettuato dall'Autorità di Audit del Programma FSE 2014/20.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Azione al 31.12.2021:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	1	0	0	1	220.003,60	220.003,60	220.003,60	220.003,60	205.748,60	205.748,60
Al BV	1	0	0	1	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	62.799,54	62.799,54

3.2.3 FEASR

➤ **Infrastrutturazione digitale dell'area interna Bassa Valle (BL.1)**

Dotazione finanziaria da APQ: 3.572.979,00 euro a valere sul Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). Si precisa che tale importo è riferito alla sola quota stimata attribuibile all'area interna Bassa Valle, in quanto nell'APQ è stata presa in considerazione la sola parte dell'intervento riguardante tale area, nonostante l'intervento riguardi sia l'intero territorio regionale (con una dotazione finanziaria pari a 5.784.424,00 euro), sia l'intero territorio nazionale (con una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 1,6 miliardi di euro).

Alla fine del 2021, a livello regionale, risultavano approvate tutte le progettazioni definitive riconducibili agli interventi previsti nei circa 70 comuni interessati e vi erano cantieri aperti in 54 comuni, mentre per quanto concerne l'area interna Bassa Valle risultavano terminati i lavori in 10 comuni. Nel 2021, a livello regionale, sono stati collaudati progetti solo in due comuni.

L'estrema complessità dell'opera, realizzata a livello nazionale per un importo complessivo pari a 1,6 miliardi di euro, ha sin da subito causato una reale difficoltà già nella definizione delle modalità attuative, che sono state concordate a livello nazionale tra Regioni, Ministeri coinvolti, Autorità di gestione, Organismi pagatori. La sola elaborazione delle linee guida procedurali ha richiesto quasi due anni di confronto fra queste istituzioni per poter giungere ad un risultato condiviso in Conferenza Stato-Regioni nel mese di novembre 2018. Dal punto di vista operativo, particolarmente complesso è stato l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori, tanto che per alcuni comuni è ancora in corso.

L'intera operazione viene monitorata da un Comitato di pilotaggio che si riunisce con cadenza periodica (normalmente mensile) – di cui fanno parte la Regione, il MISE, Infratel e IN.VA. S.p.a. – con il compito di affrontare le problematiche riscontrate e sorvegliare il processo realizzativo del Progetto. E' stato inoltre realizzato un portale informativo a livello nazionale (<https://bandaultralarga.italia.it/>) sul quale è possibile monitorare il flusso procedurale nei singoli comuni. È in corso un coordinamento nazionale comprendente tutte le Regioni, il MISE e Infratel per cercare di seguire la progressione dei lavori e appianare, per quanto possibile, le difficoltà riscontrate.

A causa di ritardi verificatisi nella definizione delle fasi procedurali, nella realizzazione della progettazione e nell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per le opere previste (tali ritardi, ovviamente, non riguardano la sola area interna Bassa Valle, ma l'insieme dei territori coinvolti a livello nazionale), i tempi delle varie fasi indicate nel cronoprogramma delle attività riportato nella scheda intervento allegata all'APQ 'Area interna Bassa Valle' hanno subito uno

slittamento che dovrebbe portare alla conclusione del Progetto entro fine giugno 2023 (anziché a fine dicembre 2020, come inizialmente previsto).

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario del Progetto al 31.12.2021, precisando che tra i Pagamenti e i Pagamenti ammessi non è stato inserito l'importo dell'anticipo complessivamente erogato, pari a 2 milioni di euro (di cui poco più di 1,2 milioni di euro riconducibili all'area interna Bassa Valle), in quanto non riferibile ad opere effettivamente realizzate:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale*	5.784.424,00	5.784.424,00	5.784.424,00	5.784.424,00	0,00	0,00
di cui Area interna BV**	3.572.979,00	3.572.979,00	3.572.979,00	3.572.979,00	0,00	0,00

* Gli importi relativi alla riga totale sono riferiti alle risorse finanziarie riconducibili all'intero territorio regionale, nonostante nella scheda intervento allegata all'APQ sia stata presa in considerazione la sola parte dell'intervento riguardante l'area interna Bassa Valle.

** Gli importi si riferiscono alla stima presentata nell'APQ per l'area interna Bassa Valle. Gli importi reali saranno determinabili solo dopo l'approvazione di tutte le progettazioni esecutive.

➤ **Supporto alla cooperazione tra piccoli operatori agroalimentari e turistici (SL.2.1)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 530.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 1.600.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito di una modifica alla Strategia di sviluppo locale del GAL Valle d'Aosta la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento è stata ridotta a 1.290.778,45 euro e, di conseguenza, la quota stimata attribuibile all'Area interna Bassa Valle si è attestata a 127.248,64 euro.

Nella Strategia di sviluppo locale del GAL Valle d'Aosta era prevista la pubblicazione di un unico bando a valere sulla sottomisura 16.3. L'organismo pagatore AGEA, in fase di validazione del bando, ha chiesto al GAL di pubblicare due bandi distinti: uno dedicato all'organizzazione e la messa in comune di impianti e risorse, l'altro dedicato alla creazione di reti turistiche.

Nel complesso sono stati presentati 13 Progetti (di cui 3 nell'area interna Bassa Valle), rispetto ai quali ne sono stati approvati 10 (di cui 2 nell'area interna Bassa Valle). In particolare, nell'area interna Bassa Valle sono stati finanziati i seguenti 2 Progetti.

- **'Samtag Mär. Il mercato del sabato'**. Tale Progetto, riconducibile al bando 'Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse', prevede la creazione di un modello di collaborazione tra aziende che condividono valori comuni legati alla genuinità dei prodotti offerti, con l'obiettivo di promuovere e offrire al pubblico un paniere di prodotti tipici di montagna di alta qualità (orticoltura, confetture, miele, formaggi d'alpeggio e prodotti da forno). La rete è composta da 7 aziende e si è costituita attraverso un Contratto di rete registrato presso la Camera di commercio.

Nel 2020 sono stati creati il marchio della rete e la pagina *Facebook* dedicata. Sono stati, inoltre, acquistati gli *stand* di legno necessari per l'allestimento del mercato del sabato (ubicato in strada Castel Savoia a Gressoney-Saint-Jean), che si è tenuto regolarmente dal 13 giugno al 31 ottobre 2020 rappresentando, per la popolazione e i turisti, un momento di incontro con i produttori del territorio. Oltre al mercato sono stati organizzati una serie di

laboratori e incontri sul territorio, mentre la parte del Progetto dedicata alle visite di studio al di fuori dei confini regionali è stata posticipata a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel 2021 il mercato si è tenuto tutti i sabati dal 19 giugno al 30 ottobre 2021 e la rete ha introdotto le seguenti novità: possibilità di acquistare un cestino da *picnic* preparato con i prodotti delle 7 aziende; attività di animazione, come le due edizioni dei '*PicNic d'Autore*' nel corso delle quali un cuoco ha predisposto dei *finger food* a base di prodotti delle 7 aziende.

A maggio 2021 i produttori hanno effettuato una visita di istruzione in Val Poschiavo (Svizzera), Valtellina e Val Camonica per conoscere altre aziende e altre reti territoriali, che si è rivelata un utile momento di confronto e di crescita. Le altre visite previste sono state posticipate a causa della pandemia.

Al 31.12.2021 sono state realizzate circa il 60% delle attività previste dal Progetto. Per consentire la conclusione delle stesse verrà probabilmente chiesta una proroga di circa 9 mesi, che porterà il termine del Progetto alla primavera 2023.

- '**Sentieri del Lys**'. Tale Progetto, riconducibile al bando '*Cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo*', intende valorizzare il territorio montano della Valle del Lys attraverso una rete sentieristica che inizia in mezzo ai vigneti del fondo valle per arrivare ai ghiacciai del Monte Rosa. La progettazione dei percorsi di *trekking*, rivolti a differenti *target*, prevede un pacchetto completo con la sosta notturna e diurna nelle strutture ricettive della rete e il trasporto bagagli da una tappa all'altra. La rete è composta da 13 aziende e si è costituita in Associazione Temporanea di Scopo.

Nel corso del 2020 è stato realizzato il video promozionale del Progetto, è stata creata la pagina *Facebook* dedicata, sono stati realizzati i lavori di tracciatura di alcuni tratti di sentieri ed è stata realizzata l'*APP* dei percorsi.

Nel complesso il Progetto sta procedendo molto bene e i retisti sono soddisfatti dei risultati raggiunti: le prenotazioni arrivano a Natale per la stagione estiva; i tour completi venduti (dalla data di approvazione del Progetto nel 2019 a fine 2021), nonostante la pandemia, sono cresciuti dell'11%, mentre i clienti sono aumentati del 32%, i pernottamenti del 28% e il fatturato del 51%.

Al 31.12.2021 sono state realizzate circa il 70% delle attività previste dal Progetto. Per consentire la conclusione delle stesse verrà probabilmente chiesta una proroga di circa 6 mesi, che porterà il termine del Progetto alla primavera 2023.

Tra le principali criticità riscontrate si segnalano:

- difficoltà nella fase di costituzione delle reti a causa di una scarsa conoscenza degli strumenti 'reti' e 'contratti di rete', anche da parte di chi svolge assistenza fiscale;
- l'assenza della firma elettronica da parte di molte aziende di piccole dimensioni, che hanno dovuto chiedere l'abilitazione alla Camera di Commercio;
- difficoltà nella predisposizione della domanda di pagamento;
- le chiusure e le limitazioni agli spostamenti causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno avuto impatti negativi sul comparto turistico e su molte delle reti finanziate.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Azione al 31.12.2021:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non ap- provati*	Approvati						
Totale	13	0	3	10	1.290.778,45	1.290.778,45	1.290.778,45	1.290.778,45	155.077,05	155.077,05
AI BV	3	0	1	2	127.248,64	127.248,64	127.248,64	127.248,64	56.219,80	56.219,80

* Tra i progetti 'Non approvati' (3) sono stati conteggiati anche 2 progetti non entrati in istruttoria (un progetto ritenuto irricevibile e un progetto non ammissibile), entrambi non afferenti all'area interna Bassa Valle.

➤ **Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (SL.2.2)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 30.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 100.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito di una rimodulazione, la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento è stata incrementata a 148.379,96 euro e, di conseguenza, la stima relativa all'Area interna Bassa Valle è stata rideterminata in 85.495,00 euro.

Come già evidenziato nelle precedenti Relazioni di avanzamento annuale, l'Azione avrebbe dovuto essere attuata tramite la sottomisura 16.2 del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR), direttamente dal competente Assessorato regionale, attraverso un bando che avrebbe consentito, tra l'altro, di presentare un progetto finalizzato allo sviluppo del prodotto 'Toma di Gressoney'. A causa di modifiche apportate al Programma, l'Azione non è stata realizzata direttamente tramite un bando regionale, ma tramite un bando del GAL Valle d'Aosta riconducibile alla sottomisura 16.4.1 della propria Strategia di sviluppo locale.

Nel complesso sono stati presentati 3 Progetti (di cui 1 nell'area interna Bassa Valle), rispetto ai quali ne sono stati approvati 2 (di cui 1 nell'area interna Bassa Valle). In particolare, nell'area interna Bassa Valle è stato finanziato il Progetto 'To.Gre.Val.' volto a valorizzare la 'Toma di Gressoney' attraverso una rete di operatori che hanno assunto, in data 14 ottobre 2019, la forma giuridica di un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) con capofila la cooperativa 'La Vallaise'.

Nel corso del 2020 le attività previste dal Progetto hanno subito un notevole rallentamento a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mentre nel 2021 l'ATI ha chiuso la fase di analisi della Strategia di *marketing* e ha realizzato il percorso formativo 'IN-FORMA', articolato in 8 incontri della durata di due ore ciascuno che si sono tenuti in modalità a distanza e resi disponibili sul sito www.togreval.it, al fine di aumentarne la diffusione.

Sempre nel 2021, l'ATI ha organizzato un momento divulgativo e informativo con le amministrazioni pubbliche della vallata nel corso del quale sono stati presentati i risultati dell'analisi della Strategia di *marketing* realizzata. Al termine dell'incontro si è tenuto uno *showcooking* con un menù dedicato alla Toma di Gressoney.

Al 31.12.2021 sono state realizzate circa il 60% delle attività previste dal Progetto. Per consentire la conclusione delle stesse verrà probabilmente chiesta una proroga, che porterà il termine del Progetto a fine luglio 2022.

Tra le principali criticità riscontrate si segnalano:

- il ritardo nello svolgimento delle attività da parte dell'ATI, in parte dovuto alla pandemia;
- la carenza di liquidità del capofila dell'ATI che nel 2021 non è riuscito a pagare i fornitori per il lavoro svolto nell'ambito del Progetto (per ovviare a questa problematica il capofila chiederà un'apertura di credito alle banche);
- l'inadeguato supporto al coordinamento del Progetto da parte della figura dedicata, che ha portato all'avvicendamento del Coordinatore del Progetto;
- le difficoltà nel coinvolgimento del settore della ristorazione i cui operatori sono preoccupati per le sorti delle loro attività e hanno priorità e urgenze diverse, nonché poca propensione a mettersi in gioco.

Nonostante i notevoli problemi riscontrati, i venditori di toma non hanno avuto difficoltà a vendere il proprio prodotto, anzi hanno avuto difficoltà a fornire i quantitativi di toma richiesti dal mercato.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Azione al 31.12.2021:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	3	0	1	2	148.379,96	148.379,96	148.379,96	148.379,96	0,00	0,00
Al BV	1	0	0	1	85.495,00	85.495,00	85.495,00	85.495,00	0,00	0,00

➤ **Investimenti non produttivi – recupero e manutenzione dei tradizionali muretti a secco (SL.3.1)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 300.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 900.000,00 euro¹⁰), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). Al fine di consentire il finanziamento di tutte le domande presentate e ammesse a valere sul bando relativo alla ricostruzione dei tradizionali muretti a secco, la dotazione del bando è stata incrementata di 24.222,04 euro, portandola a 874.222,04 euro. Di conseguenza, la stima relativa all'Area interna Bassa Valle è stata incrementata a 471.345,83 euro.

Nel corso del 2019 è stato avviato l'intervento con la pubblicazione del bando regionale, aperto dal 27 maggio al 31 luglio 2019, che ha portato alla presentazione di 52 domande di sostegno, di cui 26 riconducibili all'area interna Bassa Valle. A seguito dell'istruttoria, a dicembre 2019 è stata approvata la graduatoria relativa alle 47 domande di aiuto ritenute ammissibili a finanziamento (di cui 25 riconducibili a beneficiari dell'area interna Bassa Valle), per un importo pari a 874.222,04 euro (di cui 471.345,83 euro riconducibili dell'area interna Bassa Valle). A maggio 2020 è stato concesso il contributo in conto capitale (pari al 90% della spesa ammissibile) a favore di 44 beneficiari (di cui 25 riconducibili all'area interna Bassa Valle), per un importo complessivo di 799.692,71 euro a fronte di una spesa ammessa complessiva di

¹⁰ L'importo di 900.000,00 euro, riportato anche nella relativa scheda intervento allegata all'APQ, è riferito all'intera dotazione della sottomisura 4.4 del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR), mentre la dotazione del solo bando relativo alla ricostruzione dei tradizionali muretti a secco è pari a 850.000,00 euro.

888.547,45 euro. Rispetto ai 25 beneficiari riconducibili all'area interna Bassa Valle, 24 hanno presentato domanda di pagamento, per complessivi 391.487,40 euro.

L'intervento ha riscosso un notevole successo grazie anche alle campagne informative realizzate e con l'organizzazione di serate nelle aree a maggiore interesse.

Rispetto alla data di fine intervento prevista nell'APQ, si segnala uno slittamento dei tempi, dal 31.12.2019 al 14.05.2022, causato, principalmente:

- dall'iniziale ritardo dell'attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR) – dovuto anche a problemi di natura informatica e di rapporti con l'Organismo Pagatore – che ha portato a dare priorità alle misure ad investimento aziendali classificate come 'produttive', rispetto ad altre tipologie di investimento identificate come 'non produttive', come quella relativa ai muretti a secco;
- dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla conseguente difficoltà nel reperire i materiali per gli interventi edili, che hanno reso necessari ulteriori 6 mesi di proroga per l'ultimazione dell'intervento.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Azione al 31.12.2021:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	52	0	8	44	874.222,04	874.222,04	874.222,04	874.222,04	619.931,76	619.931,76
Al BV	26	0	1	25	471.345.83	471.345.83	471.345.83	471.345.83	391.487,45	391.487,45

➤ **Gestione e sfruttamento delle risorse forestali – Strutturazione della filiera del bosco (SL.3.2)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 30.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 100.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito di una rimodulazione, la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento è salita a 500.088,12 euro, mentre la quota stimata attribuibile all'area interna Bassa Valle è, per ora, rimasta invariata.

L'intervento è riconducibile alla sottomisura 16.6 'Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali' del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). Il relativo bando è stato pubblicato a inizio novembre 2019 con scadenza 4 maggio 2020, successivamente prorogata al 4 novembre 2020 a causa delle difficoltà oggettive riscontrate dai professionisti nella creazione di una rete di cooperazione finalizzata a unire soggetti differenti (Comuni e soggetti privati). Si sono incontrate difficoltà anche nella fase di redazione del bando, in quanto la sottomisura 16.6, essendo una sottomisura di cooperazione, ha richiesto la predisposizione di un bando con contenuti nuovi e differenti rispetto ai bandi di sostegno connessi a misure di investimento.

Tale bando è andato deserto, non per disinteresse ma per le difficoltà oggettive sopra riportate e l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Diversi attori hanno richiesto di pubblicare un

nuovo bando nel corso del 2021, ma a causa di anomalie bloccanti nel sistema nazionale di gestione dei bandi (SIAN) non è stato possibile. Si ipotizza la pubblicazione di un nuovo bando nell'estate del 2022.

Al fine di coinvolgere i portatori di interesse (proprietari, imprese e professionisti) nella creazione di una filiera legno tramite la partecipazione alle misure forestali previste dal Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR) – e in particolare alle sottomisure 8.5, 16.6 e 16.8 – sono stati realizzati una serie di incontri sul territorio. Per l'area interna Bassa Valle tali incontri si sono tenuti a Emarèse e con le Giunte comunali di Lillianes e Fontainemore.

In relazione a quanto sopra esposto, al 31.12.2021 non si registrano dati di avanzamento fisico e finanziario.

➤ **Gestione e sfruttamento delle risorse forestali – Elaborazione di piani di gestione forestale (SL.3.3)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 30.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 100.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito di una prima rimodulazione, la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento è stata incrementata a 600.000,00 euro, successivamente ridotta a 200.000,00 euro. A seguito della prima rimodulazione, la quota stimata attribuibile all'Area interna Bassa Valle è rimasta invariata, mentre a seguito della seconda rimodulazione è stata ridotta a 10.000,00 euro (applicando il peso percentuale della riduzione operata a livello regionale).

L'intervento è riconducibile alla sottomisura 16.8 'Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti' del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). Il relativo bando è stato pubblicato a fine novembre 2019 con scadenza 30 marzo 2020, successivamente prorogata al 3 agosto 2020 a causa delle difficoltà oggettive riscontrate dai professionisti nella creazione di una rete di cooperazione finalizzata a unire soggetti differenti (comuni e soggetti privati). Si sono incontrate difficoltà anche nella fase di redazione del bando, in quanto la sottomisura 16.8, essendo una sottomisura di cooperazione, ha richiesto la predisposizione di un bando con contenuti nuovi e differenti rispetto ai bandi di sostegno connessi a misure di investimento.

Tale bando è andato deserto, probabilmente anche per le difficoltà oggettive sopra riportate. Di conseguenza, la dotazione finanziaria è stata ridotta da 600.000,00 euro a 200.000,00 euro, anche se al momento non si prevede la pubblicazione di un ulteriore bando.

Al fine di coinvolgere i portatori di interesse (proprietari, imprese e professionisti) nella creazione di una filiera legno tramite la partecipazione alle misure forestali previste dal Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR) – e in particolare alle sottomisure 8.5, 16.6 e 16.8 – sono stati realizzati una serie di incontri sul territorio. Per l'area interna Bassa Valle tali incontri si sono tenuti a Emarèse e con le Giunte comunali di Lillianes e Fontainemore.

In relazione a quanto sopra esposto, al 31.12.2021 non si registrano dati di avanzamento fisico e finanziario.

➤ **Gestione e sfruttamento delle risorse forestali – investimenti in tecnologie silvicole (SL.3.4)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 300.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 1.000.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito di una rimodulazione, la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento è scesa a 800.000,00 euro, mentre la quota stimata attribuibile all'Area interna Bassa Valle è rimasta invariata.

L'intervento è riconducibile alla sottomisura 8.6 'Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste' del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR).

Alla data di riferimento della presente RAA erano stati pubblicati 4 bandi, in relazione ai quali sono state presentate complessivamente 16 domande di sostegno (di cui 7 riconducibili all'area interna Bassa Valle), rispetto alle quali ne sono state approvate 14 (di cui 6 riconducibili all'area interna Bassa Valle). In particolare, rispetto al bando:

- 2017 sono state approvate 4 domande, di cui 3 riferibili all'area interna Bassa Valle (3 privati);
- 2019 sono state approvate 3 domande, di cui 2 riferibili all'area interna Bassa Valle (2 privati);
- 2020 sono state approvate 6 domande, di cui una riferibile all'area interna Bassa Valle (privato). Un'altra domanda di un privato riferibile all'area interna Bassa Valle non è risultata ammissibile;
- 2021 è stata approvata una domanda e una è ancora in istruttoria, nessuna riferibile all'area interna Bassa Valle.

Si prevede la pubblicazione di un ulteriore bando nel 2022, che dovrebbe consentire di raggiungere l'importo inizialmente stimato quale ricaduta nell'area interna Bassa Valle (300.000,00 euro), viste le richieste di informazioni ricevute da tale territorio.

Al fine di coinvolgere i portatori di interesse, è stato messo in piedi un tavolo di lavoro sulle foreste a cui hanno partecipato anche le principali imprese forestali locali, oltre all'ordine dei dottori forestali e rappresentanti delle segherie locali.

Rispetto alla data di fine intervento prevista nell'APQ, si segnala uno slittamento dei tempi, dal 31.12.2019 al 01.10.2022, causato, principalmente:

- dal ritardo nella pubblicazione del primo bando (luglio 2017) che ha fatto sì che le prime spese fossero realizzate solo a partire dal 2019 anziché dal 2017 come inizialmente stimato;
- dalle difficoltà oggettive riconducibili al Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR) nel suo complesso, connesse alla complessità dei controlli nonché ai sistemi informatici da utilizzare;
- da una certa lentezza di alcune imprese per la realizzazione degli investimenti previsti.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Azione al 31.12.2021:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	16	1	1	14	423.067,01	423.067,01	423.067,01	423.067,01	405.498,58	405.498,58
Al BV	7	0	1	6	290.406,15	290.406,15	290.406,15	290.406,15	285.262,41	285.262,41

➤ **Gestione e sfruttamento delle risorse forestali – Interventi di selvicoltura, in attuazione di piani di gestione forestale (SL.3.5)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 900.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'area interna Bassa Valle, sul totale di 2.900.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito di una seconda rimodulazione, la dotazione finanziaria complessiva dell'intervento è ulteriormente stata ridotta da 2.500.206,41 euro a 2.050.206,41 euro, mentre la quota stimata attribuibile all'Area interna Bassa Valle è, per ora, rimasta invariata.

L'intervento è riconducibile alla sottomisura 8.5 'Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali' del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR).

Alla data di riferimento della presente RAA erano stati pubblicati 6 bandi, in relazione ai quali sono state presentate complessivamente 14 domande di sostegno (di cui 5 riconducibili all'area interna Bassa Valle), rispetto alle quali ne sono state approvate 7 (di cui 2 riconducibili all'area interna Bassa Valle). In particolare, rispetto al bando:

- 2016 sono state approvate 2 domande, di cui una riferibile all'area interna Bassa Valle (comune di Brusson). Altre 2 domande non sono risultate ammissibili, di cui una riferibile all'area interna Bassa Valle (Comune di Emarèse);
- 2017 sono state approvate 4 domande, di cui una riferibile all'area interna Bassa Valle (privato);
- 2018 è stata approvata una domanda e una è ancora in istruttoria, nessuna riferibile all'area interna Bassa Valle;
- 2019 due domande sono ancora in istruttoria, di cui una riferibile all'area interna Bassa Valle (Comune di Fontainemore);
- 2020 una domanda non riferibile all'area interna Bassa Valle è ancora in istruttoria;
- 2021 una domanda riferibile all'area interna Bassa Valle è ancora in istruttoria (consorteria di Graines).

Nonostante sia prevista la pubblicazione di un ulteriore bando nel 2022, difficilmente l'importo inizialmente stimato quale ricaduta nell'area interna Bassa Valle (900.000,00 euro) verrà raggiunto, visto che a seguito dei primi 6 bandi sono stati finanziati nell'area solo poco più di 140 mila euro (tale importo non tiene conto delle 2 domande ancora in istruttoria).

Al fine di coinvolgere i portatori di interesse (proprietari, imprese e professionisti) nella creazione di una filiera legno tramite la partecipazione alle misure forestali previste dal Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR) – e in particolare alle sottomisure 8.5, 16.6 e 16.8 – sono stati realizzati una serie di incontri sul territorio. Per l'area interna Bassa Valle tali

incontri si sono tenuti a Emarèse e con le Giunte comunali di Lillianes e Fontainemore. Sono stati, altresì, effettuati alcuni incontri informali con i Sindaci di Perloz e Issogne.

Rispetto alla data di fine intervento prevista nell'APQ, si segnala uno slittamento dei tempi, dal 31.12.2019 al 01.09.2022, causato, principalmente:

- dalle difficoltà oggettive riconducibili al Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR) nel suo complesso, connesse alla complessità dei controlli nonché ai sistemi informatici da utilizzare;
- dai tempi per il pagamento dei contributi che si sono rilevati più lunghi rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. In particolare i beneficiari, sia pubblici che privati, hanno richiesto continuamente delle proroghe per la presentazione della progettazione e per l'esecuzione degli interventi, dilatando oltremodo i tempi.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Azione al 31.12.2021:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	14	5	2	7	418.097,65	418.097,65	418.097,65	418.097,65	161.330,54	161.330,54
AI BV	5	2	1	2	142.154,03	142.154,03	142.154,03	142.154,03	100.354,83	100.354,83

4. GESTIONE E CONTROLLO

In termini generali, per quanto concerne l'attuazione, a livello regionale, della Strategia nazionale per le aree interne, si evidenzia quanto segue:

- in relazione agli interventi sui servizi essenziali si applicano le disposizioni e gli obblighi inseriti nel relativo Accordo di Programma quadro (APQ) e quanto stabilito dal Si.Ge.Co. degli interventi relativi ai servizi essenziali, approvato, nella sua prima versione, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 32 in data 31 gennaio 2020, sulla base delle prime indicazioni fornite dallo Stato e dall'Agenzia per la coesione territoriale;
- rispetto agli interventi di sviluppo locale valgono le puntuali disposizioni dettate dai regolamenti (UE) di riferimento e le regole proprie di ciascun Programma, definite negli appositi Si.Ge.Co.

Nell'ambito di tale quadro di riferimento, in considerazione delle criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi relativi ai servizi essenziali delle due aree interne valdostane (Bassa Valle e Grand-Paradis) – che hanno comportato la necessità di intervenire ripetutamente sulle schede intervento già approvate, al fine di garantirne la realizzabilità e la sostenibilità – il Dipartimento politiche strutturali e affari europei, in qualità di Struttura di riferimento del Responsabile unico dell'attuazione dell'APQ 'Area interna Bassa Valle', nel 2021, ha curato la predisposizione di una nuova versione del Si.Ge.Co. con l'obiettivo di introdurre semplificazioni procedurali. In tale versione – approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1413 in data 8 novembre 2021 – oltre ad un puntuale aggiornamento del quadro di riferimento normativo e amministrativo alla luce delle ultime novità introdotte, sono/è:


- state inserite delle semplificazioni in merito alla disciplina delle fasi di attuazione, modifica e possibilità di proroga degli interventi (a titolo esemplificativo, con riguardo alle modifiche, è stato previsto di non attivare la procedura di consultazione del Tavolo dei sottoscrittori per le sole riprogrammazioni tra voci di spesa esistenti di valore inferiore al 20% del costo totale dell'intervento, nel caso in cui le stesse non modifichino il valore complessivo dell'intervento, mentre, con riferimento alla proroga, è stato previsto il mero invio di una nota di richiesta al RUA per tutti quei casi in cui non si ricada nelle fattispecie per le quali è richiesta l'attivazione del Tavolo dei sottoscrittori);
- stata allineata la disciplina in materia di informazione e pubblicità alle indicazioni fornite dall'Agenzia per la coesione territoriale;
- stati meglio precisati gli aspetti inerenti il controllo di primo livello degli Interventi (precisando gli elementi su cui verte il controllo in loco);
- stati implementati i paragrafi relativi al trattamento delle irregolarità e ai pagamenti.

Sempre nella logica di semplificazione delle modalità procedurali, il Dipartimento politiche strutturali e affari europei ha, altresì, ritenuto necessario e opportuno predisporre un documento di indirizzo finalizzato a fornire delle linee guida utili ad agevolare la gestione delle schede intervento da parte dei beneficiari/attuatori dei Progetti relativi ai servizi essenziali nel caso in cui dette schede siano oggetto di proposta di modifiche.

Per quanto concerne il sistema di monitoraggio utilizzato per gli interventi inclusi nell'APQ si rimanda a quanto riportato all'inizio del Capitolo 3.

5. LA GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE

Come riportato nel documento *'Monitoraggio del sistema intercomunale permanente – Analisi dello stato di avanzamento del processo di associazione delle funzioni e servizi e del modello organizzativo per la realizzazione della SNAI – Area interna Bassa Valle'*, predisposto a dicembre 2020 da Formez PA per conto del CTAI, la *governance* disegnata dai comuni dell'area interna Bassa Valle per l'attuazione della SNAI può essere analizzata su tre macro-dimensioni sulle quali è possibile collocare i diversi attori del seguente modello.

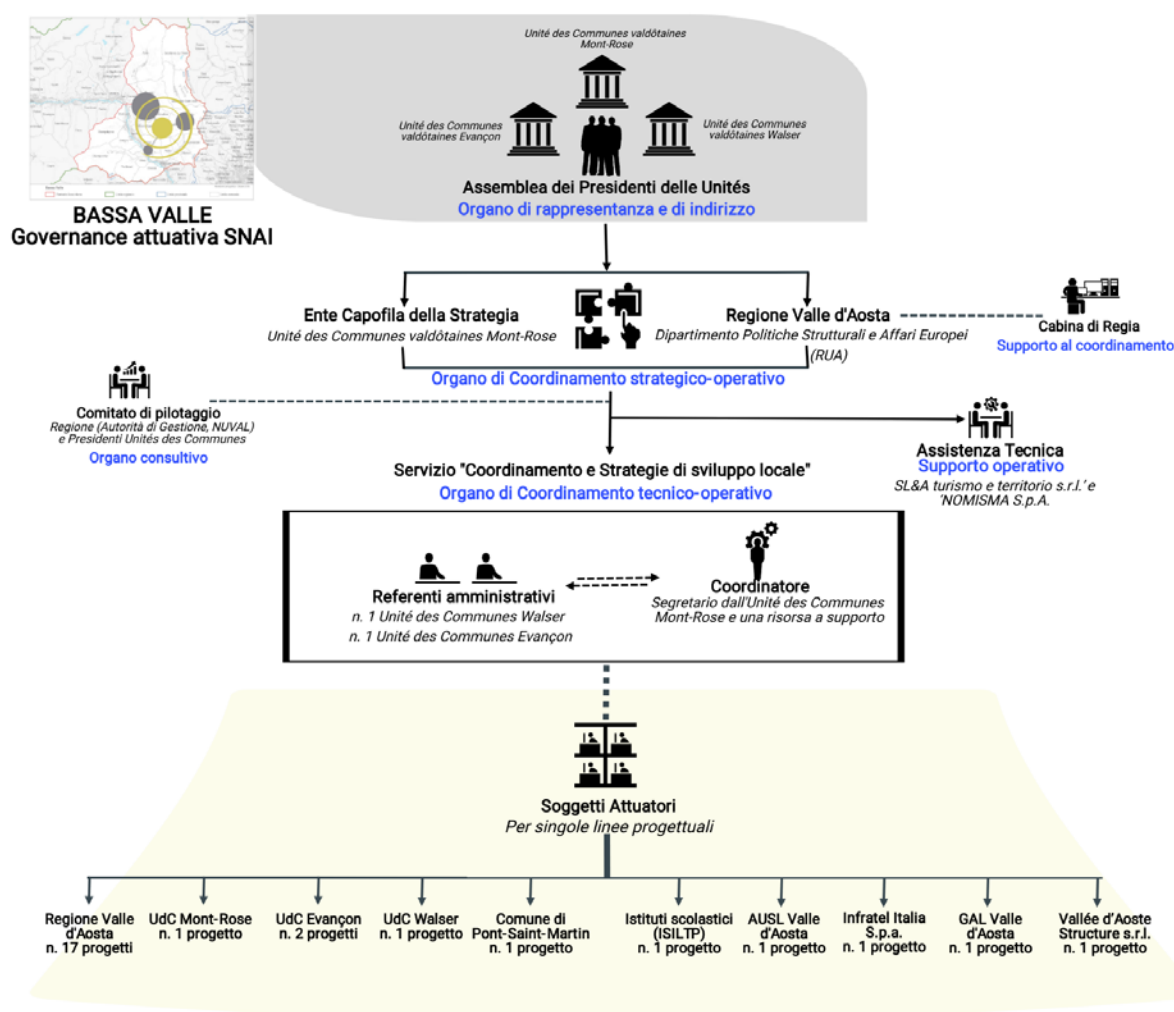

- 1. Rappresentatività politico-istituzionale:** tale rappresentatività, intesa come capacità di coinvolgimento degli attori comunali nei processi decisionali e di indirizzo della Strategia d'Area, si svolge nell'ambito dell'Assemblea dei Presidenti delle 3 Unités des Communes valdôtaine coinvolte (Mont-Rose, Evançon, Walser), che garantisce un'elevata coesione e rappresentatività politico-istituzionale dei comuni associati nelle singole Unités, agendo da soggetto unitario di raccordo delle istanze territoriali e favorendone la ricomposizione e socializzazione durante l'intero svolgimento delle attività previste dalla Strategia d'Area.

2. **Coordinamento tecnico-operativo:** l'attività di coordinamento amministrativo e tecnico-operativo – sia verticale (verso l'organo decisionale), sia orizzontale (tra i soggetti attuatori e i relativi interventi) – è svolta di concerto tra l'Unité des Communes valdôtaine Mont-Rose (Soggetto capofila dell'Area) e il Dipartimento politiche strutturali e affari europei della Regione Autonoma Valle d'Aosta (il cui Coordinatore riveste il ruolo di RUA), all'interno del quale è stata strutturata una Cabina di regia di supporto all'attuazione delle strategie delle aree interne valdostane. Ad un livello più operativo è stata prevista una specifica struttura, il Servizio 'Coordinamento e Strategia dello sviluppo locale', composto da una figura di coordinamento (individuata nel Segretario dell'Unité Mont-Rose), affiancata nelle attività da una risorsa appositamente reclutata e da un referente amministrativo per ciascuna delle altre due Unités. Inoltre, a supporto operativo degli uffici delle tre Unités (con impegno prevalente verso quelli dell'Unité capofila) è attiva l'Assistenza Tecnica individuata nel raggruppamento SL&A Turismo e Territorio - Nomisma. È previsto anche un organo consultivo, il Comitato di Pilotaggio, che vede il coinvolgimento dei Presidenti delle tre Unités e i relativi Sindaci, le Autorità di gestione dei programmi europei e gli esperti del Nucleo di valutazione dei Programmi a finalità strutturale (NUVAL) della Valle d'Aosta.
3. **Gestione operativa:** visto che quasi il 75% degli interventi dell'APQ sono in capo all'Amministrazione regionale, la maggior parte delle attività tecnico-amministrative del processo attuativo sono a carico delle strutture regionali, maggiormente dotate di personale esperto e qualificato. Le modalità collaborative poste in essere dalla Cabina di regia hanno poi consentito di sviluppare un forte raccordo operativo con le strutture locali, sia nella fase di progettazione, sia in quella di attuazione dei singoli interventi.

Rispetto alle figure regionali e locali previste dall'APQ 'Area interna Bassa Valle' sottoscritto in data 16 febbraio 2018, si segnala che la competenza relativa alle aree interne per la Regione Autonoma Valle d'Aosta è passata dal Presidente della Regione (che alla data di sottoscrizione dell'APQ era il dott. Laurent VIÉRIN) all'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate (dott. Luciano CAVERI). Di conseguenza, anche il riferimento al RUA (riportato all'articolo 8, comma 1 dell'APQ), nella persona del Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, deve essere aggiornato sostituendo 'Presidenza della Regione' con 'Assessorato all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate'.

Si segnala, infine, che la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella *governance* dell'APQ ha consentito di far fronte alle criticità emerse sui vari interventi e, in particolare, su quelli per i quali è stato necessario attivare la procedura di consultazione del Tavolo dei sottoscrittori (cfr. Capitolo 2).

6. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

In generale, nel corso del 2021 è proseguita l'attività di aggiornamento dei contenuti dedicati alla Strategia dell'area interna Bassa Valle sul sito *web* dell'Unité des Communes valdôtaine Mont-Rose (Soggetto capofila), che ha visto un rinnovamento completo del layout e della struttura del portale per una maggior fruibilità e chiarezza dei contenuti (<https://www.cm-montrose.vda.it/it-it/bassa-valle-in-rete>). E' stato, inoltre, definito un nuovo piano di comunicazione (avviato a fine 2021) finalizzato a promuovere le iniziative (bandi e avvisi pubblici regionali) nell'ambito della Strategia.

Rispetto agli interventi relativi ai servizi essenziali si segnala che:

- nella sezione '*Storie di Progetto*' del Canale tematico 'Europa' del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, è stata pubblicata una pagina *web* (vedi [link](#)) dedicata all'allestimento dei nuovi laboratori tecnologici presso l'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale (ISILTP) di Verrès (intervento IS.1.2);
- nella sezione '*Eventi e iniziative*' del sito *web* dell'Unité des Communes valdôtaine Mont-Rose, sono state pubblicate le tavole dei progetti vincitori (vedi [link](#)) del concorso di progettazione relativo alla realizzazione di un convitto annesso al polo scolastico unico di Verrès (intervento IS.1.3) ed è stata pubblicata l'iniziativa '*Camminiamo insieme*' (vedi [link](#)), organizzata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito dell'intervento SN.1, relativa ad una serie di passeggiate per promuovere un approccio attivo alla salute e allo stare bene.

Per la promozione degli interventi relativi allo sviluppo locale si riportano le seguenti informazioni, suddivise per Programma di riferimento.

Programma FESR 2014/20:

- per l'intervento '*Bassa Via della Valle d'Aosta – Sentieristica*' (SL.1.1), nel Canale tematico '*Risorse naturali*' del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, è stata inserita una sezione nella quale si possono trovare informazioni in merito alla descrizione del Progetto, al tracciato, ai file GPS, GPX e KML delle tappe, alla percorribilità dell'itinerario aggiornata, oltre ad alcune immagini promozionali;
- per l'intervento '*Bassa Via della Valle d'Aosta – Promozione*' (SL.1.2), sono state attivate iniziative promo-pubblicitarie che si sono tradotte principalmente in pagine pubblicitarie, articoli, monografie dedicate al '*Cammino Balteo*', che hanno permesso di informare e comunicare il prodotto '*Balteus*' sia in Italia che all'estero;
- per l'intervento '*Bassa Via della Valle d'Aosta – Tecnologie e servizi innovativi*' (SL.1.3) è stato realizzato il sito internet dedicato al '*Cammino Balteo*' (vedi [link](#)) che contiene tutte le informazioni per la fruizione del percorso già descritte nel paragrafo 3.2.1;
- per l'intervento '*Bassa Via della Valle d'Aosta – Sostegno ai servizi turistici*' (SL.1.4) i relativi avvisi pubblici sono stati pubblicati sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sulla stampa locale. Sono stati, inoltre, inviati alle principali associazioni imprenditoriali regionali (albergatori e commercianti) e ai principali ordini professionali (commercialisti, architetti, ingegneri e geometri) potenzialmente interessati all'iniziativa;

- nell'ambito del '*Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta*', per gli interventi SL.4.1 e SL.4.1 bis la diffusione e l'informazione delle attività svolte è avvenuta attraverso i *Social Network Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn*, mentre per l'intervento SL.4.2 i relativi avvisi pubblici, oltre ad essere stati pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sul sito di Struttura Valle d'Aosta s.r.l., sono stati diffusi nel corso di convegni rivolti alle potenziali imprese interessate.

Programma FSE 2014/20:

- per gli interventi '*Alternanza scuola-lavoro*' (IS.1.1.2) e '*Imprenditorialità giovanile*' (IS.1.1.3) gli avvisi pubblici per la presentazione di progetti per l'anno scolastico 2017/18 sono stati pubblicati nell'apposita sezione del sito della scuola valdostana '*Webécole*' e ne è stata data comunicazione alle istituzioni scolastiche.

Programma FEASR 2014/20:

- per l'intervento '*Infrastrutturazione digitale dell'area interna Bassa Valle*' (BL.1), a seguito dell'approvazione delle '*Linee guida del piano di comunicazione per la Banda Ultralarga*' da parte del Comitato per la Banda Ultralarga (COBUL), avvenuta in data 14 ottobre 2016, sono stati avviati i primi progetti di informazione e formazione destinati agli Enti locali (Comuni) e alle imprese per il tramite delle Camere di commercio, che consistono in due campagne di informazione e comunicazione a livello territoriale nella fase di realizzazione delle infrastrutture e di attivazione dei servizi;
- l'attività di animazione e divulgazione dei bandi relativi agli interventi '*Supporto alla cooperazione tra piccoli operatori agroalimentari e turistici*' (SL.2.1) e '*Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie*' (SL.2.2) è stata svolta dal GAL Valle d'Aosta, con il supporto di consulenti esterni, nel corso di 8 serate realizzate sul territorio regionale, rispetto alle quali 2 sono state realizzate nel territorio dell'area interna Bassa Valle (a Fontainemore il 12 febbraio 2019 e a Verrès il 19 febbraio 2019). Sono state, inoltre, diramate comunicazioni alle principali testate giornalistiche e ai mezzi di informazione e acquistati dei *banner* permanenti sulle principali testate *online*, per la durata del bando. In particolare, rispetto ai progetti attuati sul territorio dell'area interna Bassa Valle, si segnala che:
 - per il Progetto '*Samtag Märt. Il mercato del sabato*' (SL.2.1) è stata predisposta un'apposita pagina *Facebook* nella quale vengono pubblicati aggiornamenti, foto e video rispetto alle attività realizzate dalla rete di aziende coinvolte, mentre nel Canale tematico '*Europa*' del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta è stata pubblicata una pagina internet dedicata al Progetto (vedi [link](#)). Inoltre, nel corso dell'estate 2020, è stato organizzato un ciclo di laboratori di costruzione di scenari futuri, mentre il 17 giugno 2021 è stato organizzato un piccolo evento presso la sede del mercato, che al mattino ha visto il coinvolgimento di 14 ospiti rappresentanti di altre eccellenze della Valle del Lys e della Valle d'Aosta. Nel pomeriggio si è tenuto un incontro sulla filiera del legno nell'ambito di '*Gressoney 2030*', piccola rassegna sul rapporto fra città e montagna;
 - per il Progetto '*Sentieri del Lys*' (SL.2.1) è stata predisposta un'apposita pagina *Facebook* nella quale è stato pubblicato il video promozionale realizzato nell'ambito del Progetto, mentre nel corso del 2020 è stata realizzata l'*APP* con i sentieri;

- per il Progetto 'To.Gre.Val' (SL.2.2) è stato realizzato il sito internet www.togreval.it e nel 2020 sono stati organizzati 2 eventi per sensibilizzare la popolazione rispetto al prodotto e alle sue caratteristiche: uno nel corso della Sagra dei mirtilli di Fontainemore tenutasi il 16 agosto 2020 e l'altro nel corso della festa patronale a Gaby svoltasi il 27 settembre 2020. Nel corso del 2021 il Progetto è stato incluso tra le buone pratiche della rete rurale nazionale (vedi [link](#));
- Il 29 e 30 ottobre 2021 il GAL Valle d'Aosta, in collaborazione con le reti dei 3 progetti sopra citati, ha organizzato a Gressoney-Saint-Jean un evento per valorizzare il lavoro svolto e le attività portate avanti dai 3 progetti. In particolare, è stata organizzata presso Villa Margherita una conferenza di restituzione dei risultati raggiunti dai progetti ed è stato ospitato un piccolo gruppo di *blogger* che ha partecipato a una serie di visite guidate a tema nelle aziende e nei siti culturali della Valle di Gressoney;
- per l'intervento '*Investimenti non produttivi – Recupero e manutenzione dei tradizionali muretti a secco*' (SL.3.1) il relativo bando è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed è stato pubblicizzato sui principali canali di informazione (giornali, TV, testate *online*) tramite comunicati stampa;
- i bandi relativi agli interventi concernenti la gestione e lo sfruttamento delle risorse forestali (interventi SL.3.2, SL.3.3, SL.3.4, e SL.3.5) sono stati pubblicizzati sul sito istituzionale della Regione e sui quotidiani locali. Al fine di coinvolgere i portatori di interesse (proprietari, imprese e professionisti) nella creazione di una filiera legno sono stati realizzati una serie di incontri sul territorio.
