



Regione autonoma Valle d'Aosta

Accordo di programma quadro

“Area interna Bassa Valle”

Relazione di avanzamento annuale al 31 dicembre 2025¹

¹ Approvata, in data 10 luglio 2026, dal Comitato per lo sviluppo locale di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 1669/2021 e 211/2023.

Assessorato affari europei, innovazione, PNRR, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili
Assessorat des affaires européennes, de l'innovation, du PNRR, des politiques nationales de la
montagne et des politiques de la jeunesse

Département des affaires européennes, de l'innovation et des politiques de la montagne et de la
jeunesse
Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili

INDICE

Acronimi	5
Nota metodologica	6
Premessa	8
1. STATO DI "CANTIERABILITÀ" DEI SINGOLI INTERVENTI.....	12
2. MODIFICHE APPORTATE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO	13
3. STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO	23
3.1 Stato di attuazione Interventi finanziati con risorse statali	37
3.1.1 Istruzione	37
3.1.2 Salute	39
3.1.3 Mobilità	41
3.1.4 Associazionismo e assistenza tecnica	43
3.1.5 Interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi.....	45
3.2 Stato di attuazione Interventi su altri fondi.....	49
3.2.1 FESR	49
3.2.2 POC	53
3.2.3 FSE.....	55
3.2.4 FEASR.....	60
4. GESTIONE E CONTROLLO	67
5. LA GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE	69
6. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	72

INDICE DELLE TABELLE E DEI GRAFICI

Cartina 1:	Comuni Area interna Bassa Valle	11
Tabella 1:	Numero progetti cantierabili per anno	12
Tabella 2:	Raffronto tra la copertura finanziaria iniziale dell'APQ e quella al 31.12.2025.....	22
Tabella 3:	Progetti derivanti dagli Interventi di sviluppo locale per Programma, al 31.12.2025	25
Grafico 1:	Avanzamento finanziario dell'APQ per anno (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)	26
Grafico 2:	Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per tipologia degli Interventi (servizi essenziali e sviluppo locale), rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)	27
Grafico 3:	Capacità di impegno e di spesa degli Interventi (servizi essenziali e sviluppo locale) riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)	27
Grafico 4:	Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per Programma, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)	28
Grafico 5:	Capacità di impegno e di spesa dei Programmi riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle).....	29
Grafico 6:	Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per Azione portante, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)	30
Grafico 7:	Capacità di impegno e di spesa delle Azioni portanti riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)	31
Grafico 8:	Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per i Settori di intervento degli Interventi relativi ai servizi essenziali, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)	31
Grafico 9:	Capacità di impegno e di spesa dei Settori di intervento degli Interventi relativi ai servizi essenziali riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle).....	32
Tabella 4:	Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Bassa Valle" per tipologia degli Interventi (servizi essenziali e sviluppo locale), al 31.12.2025	33
Tabella 5:	Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Bassa Valle" per Programma, al 31.12.2025	34
Tabella 6:	Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Bassa Valle" per Azione portante, al 31.12.2025.....	35
Tabella 7:	Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Bassa Valle" per i Settori di intervento degli Interventi relativi ai servizi essenziali, al 31.12.2025	36

Acronimi

ACT	Agenzia per la coesione territoriale (facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)
AGEA	Agenzia per le erogazioni in agricoltura
ARAI	Autorità responsabile per le Aree interne
APQ	Accordo di programma quadro
BDU	Banca dati unitaria (dell'IGRUE)
CIPE	Comitato interministeriale per la programmazione economica
CIPESS	Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
CTAI	Comitato tecnico Aree interne (della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
DPCOES	Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud (facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)
DGR	Deliberazione della Giunta regionale (della Regione autonoma Valle d'Aosta)
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
FESR	Fondo europeo per lo sviluppo regionale
FSE	Fondo sociale europeo
GAL	Gruppo di azione locale (della Valle d'Aosta)
GURI	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
IGRUE	Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze)
ISILTP	Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale (di Verrès)
POC	Programma operativo complementare 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta
PSR	Programma di Sviluppo rurale
PUC	Protocollo unico di colloquio (con la Banca dati unitaria dell'IGRUE)
RAA	Relazione di avanzamento annuale
RAVA	Regione autonoma Valle d'Aosta
RUA	Responsabile unico dell'attuazione (dell'Accordo di programma quadro), ora Autorità responsabile per le Aree interne
RUP	Responsabile unico del procedimento
RUPA	Responsabile unico delle parti (uno per la parte regionale – Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei – e uno per la parte locale – Segretario dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose)
SIAN	Sistema informativo agricolo nazionale
SISPREG2014	Sistema informativo della Politica regionale di sviluppo 2014/20 (della Valle d'Aosta)
SNAI	Strategia nazionale per le Aree interne
SNM	Sistema nazionale di monitoraggio

Nota metodologica

La presente Relazione di avanzamento annuale (RAA), elaborata in attuazione dell'art. 11, comma 1 dell'Accordo di programma quadro "Area interna Bassa Valle", costituisce il Rapporto di monitoraggio sull'attuazione degli Interventi e sui risultati raggiunti, che sarà inoltrato al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud (prima Agenzia per la coesione territoriale), nonché al Comitato tecnico Aree interne, ai fini del rispetto della previsione di cui al punto 5 della delibera CIPE n. 9 del 2015.

Le informazioni utilizzate nella RAA sono reperite, tramite un apposito modello predisposto dal Responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo di programma quadro (RUA), ora Autorità responsabile per le Aree interne, presso i Beneficiari degli Interventi e dal sistema informativo regionale SISPREG2014. Nella relazione sono rappresentati lo stato di attuazione degli Interventi e i dati di attuazione al **31.12.2025**.

Per una corretta comprensione dei dati inseriti nella RAA, è utile riassumere, in breve, il significato e le specificità dei seguenti termini ricorrenti con particolare riferimento all'attuazione finanziaria.

- **Dotazione finanziaria iniziale APQ:** corrisponde alle risorse finanziarie nominali di un Intervento al momento della sottoscrizione dell'APQ.
- **Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2025:** corrisponde alle risorse finanziarie nominali di un Intervento disponibili al 31.12.2025. Tale dotazione tiene conto, perciò, di eventuali variazioni intervenute a seguito della sottoscrizione dell'APQ e, di norma, coincide con la somma delle risorse pubbliche di un Intervento (anche se non riconducibili al Costo ammesso).
- **Finanziamento:** è la somma di tutte le fonti di finanziamento (pubbliche e, talvolta, private) che contribuiscono alla copertura finanziaria di un Intervento.
- **Costo ammesso:** è il costo pubblico totale dell'Intervento approvato e ammesso al finanziamento del Programma di riferimento.
- **Impegni:** rappresentano la quota parte del finanziamento di un Intervento approvato che si è tradotta in obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) intendendosi l'atto di affidamento di lavori, servizi e forniture, o affidamenti di servizi e concessioni di contributi agli Enti di formazione, alle Istituzioni scolastiche e alle imprese, a conclusione delle relative procedure. In quanto tali, rappresentano un indicatore utile a monitorare l'effettivo avvio delle attività di un Intervento.
- **Impegni ammessi:** rappresentano la quota parte degli impegni di un Intervento che risulta ammissibile a valere sul Programma di riferimento. Nella maggior parte dei casi l'importo del singolo impegno ammesso di un Intervento coincide con l'importo del corrispondente impegno, ma se l'Intervento è cofinanziato anche con risorse non riconducibili al Costo ammesso, l'importo può essere inferiore (poiché solo una parte è finanziata e, quindi, risulta ammissibile, a valere sul Programma di riferimento).

- **Pagamenti:** sono le spese effettivamente pagate dal Beneficiario di un Intervento e indicano, di norma, l'avanzamento effettivo della realizzazione delle attività.
- **Pagamenti ammessi:** rappresentano la quota parte dei pagamenti di un Intervento che risulta ammissibile a valere sul Programma di riferimento.

Si precisa che tutti i valori riportati nella presente RAA sono da intendersi:

- al netto dei Progetti oggetto di rinuncia, da parte dei Beneficiari prima o dopo l'istruttoria, oppure ad avvenuta approvazione;
- al netto degli Interventi:
 - BV01 *"Lavori di adeguamento funzionale della pista di Quassod, con funzione AIB, nel Comune di Verrès"*;
 - BV02 *"Lavori di realizzazione vasca di accumulo e allacciamento idrico al sistema integrato della frazione Vers-Fey nei Comuni di Lillianes e Perloz ai fini di utilizzo AIB"*;
 - BV03 *"Lavori di realizzazione di viabilità forestale con funzione antincendio boschivo in loc. Tetas e Nova superiore nel Comune di Fontainemore"*;finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi, non rientrando tali Interventi nell'APQ "Area interna Bassa Valle". Di questi Interventi si dà atto solo all'interno del paragrafo 3.1.5.

Considerato che negli allegati all'APQ si fa riferimento sia al costo complessivo degli Interventi, sia al costo degli stessi nella sola Area interna Bassa Valle, nella presente RAA, sono stati riportati, ove ritenuto opportuno – oltre ai dati di attuazione riferiti alla sola Area interna – anche i dati complessivi riferiti alle ricadute degli Interventi su un territorio più ampio rispetto a quello dell'Area.

Nel caso in cui, invece, non sia stato possibile disaggregare i dati complessivi di un Intervento per determinarne le ricadute sull'Area interna Bassa Valle, tali ricadute sono state stimate applicando, in assenza di elementi più attendibili, il peso percentuale derivante dal rapporto tra il costo stimato dell'Intervento attribuibile all'Area interna e il costo complessivo dello stesso (con riferimento ai costi riportati nell'allegato 2a all'APQ e, in particolare, al punto 3 della pertinente Scheda intervento).

Premessa


Titolo dell'APQ	Accordo di programma quadro Regione autonoma Valle d'Aosta "Area interna Bassa Valle".
Data approvazione Strategia d'Area	La Strategia dell'Area interna Bassa Valle è stata approvata, contestualmente all'APQ, in data 16 febbraio 2020 (data di sottoscrizione dell'APQ da parte dell'ultimo firmatario – Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute – mentre il primo firmatario – Direttore dell'Area progetti e strumenti dell'Agenzia per la coesione territoriale – ha apposto la propria firma in data 20 dicembre 2017). A livello regionale, la Strategia è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1678, in data 27 novembre 2017, contestualmente all'approvazione della stipula del relativo APQ.
Programmi coinvolti	▪ Strategia Aree interne Regione Valle d'Aosta – Linea Bassa Valle (2018AREAINTVAlD); ▪ Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) – (2014IT16RFOP020); ▪ Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE) – (2014IT05SFOP011); ▪ Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR) – (2014IT06RDRP013); ▪ Programma operativo complementare (POC) 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta – (POCVALLEAOSTA).
RUA e RUPA regionale	Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei (ora Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili) della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Soggetto capofila e RUPA locale	Segretario dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.
Legge statale di riferimento per gli Interventi relativi ai servizi essenziali	▪ Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, commi 13-17); ▪ Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 314 (per le risorse integrative di cui alla delibera CIPESS n. 41/2022).
Delibera CIPE/ CIPESS di assegnazione	▪ Delibera CIPE n. 9, del 28 gennaio 2015 (GURI n. 91, del 20 aprile 2015); ▪ Delibera CIPESS n. 41, del 2 agosto 2022 (GURI n. 278, del 28 novembre 2022).

delle risorse statali per gli Interventi riconducibili ai servizi essenziali	
Assegnazione risorse per gli Interventi finalizzati al contrasto degli incendi boschivi	▪ Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 ▪ Delibera CIPESS n. 8, del 14 aprile 2022 (GU n.149 del 28-6-2022).
Attivazione delle procedure di erogazione finanziaria Fondi SNAI per interventi riconducibili ai servizi essenziali	In data 27 febbraio 2019 il RUA ha inviato ai competenti Uffici dell'IGRUE la richiesta di anticipazione delle risorse statali di cui all'art. 1, comma 13, della legge di stabilità n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni. Nel dettaglio, rispetto alla quota totale di risorse riferite alla linea di finanziamento "<i>legge di stabilità</i>" assegnata all'APQ "<i>Area interna Bassa Valle</i>", pari a 3.740.000,00 euro, è stato chiesto all'IGRUE di rendere disponibile un'anticipazione corrispondente a circa il 17% di tale importo, pari a 636.059,00 euro, di cui 140.000,00 euro per il settore "<i>Istruzione</i>", 183.200,00 euro per il settore "<i>Sanità</i>", 242.859,00 euro per il settore "<i>Mobilità</i>" e 70.000,00 euro per "<i>Assistenza tecnica</i>". A seguito della suddetta richiesta, la Banca d'Italia ha provveduto, in data 22 marzo 2019, ad accreditare ai singoli Beneficiari degli Interventi l'importo dell'anticipo richiesto. In data 1° dicembre 2025 l'ARAI ha inviato ai competenti Uffici dell'IGRUE un'ulteriore richiesta di anticipazione delle risorse statali di cui all'art. 1, comma 13, della legge di stabilità n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni, e delle risorse integrative di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160/2019. Nel dettaglio, considerato l'ammontare massimo dei prefinanziamenti spettanti, pari a euro 1.616.000,00 – e la quota richiesta a titolo di anticipazione nell'annualità 2021, pari a euro 636.059,00 – è stata richiesta l'erogazione di ulteriori anticipazioni pari a euro 381.285,15 per il settore "<i>Mobilità</i>". A seguito della suddetta richiesta, la Banca d'Italia ha provveduto, in data 22 dicembre 2025, ad accreditare ai singoli Beneficiari l'importo dell'anticipo richiesto. Alla data di riferimento della presente RAA non sono ancora stati richiesti pagamenti intermedi.

Popolazione	L'Area interna Bassa Valle, situata all'estremità orientale della Regione autonoma Valle d'Aosta, si estende su 812 km², con una popolazione complessiva di 22.129 unità (dati ISTAT al 31.12.2024) e comprende 23² comuni ripartiti in tre Unités des Communes (cfr. Cartina 1): ▪ Unités des Communes valdôtaines Mont-Rose: Comuni di Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset e Pont-Saint-Martin; ▪ Unités des communes valdôtaines Walser: Comuni di Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité; ▪ Unités des Communes valdôtaines Evançon: Comuni di Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Emarèse, Issogne, Montjovet, Verrès.
Quadro copertura finanziaria al 31.12.2025 delle sole risorse riconducibili all'Area interna Bassa Valle (per il raffronto con la dotazione iniziale cfr. Tabella 2)	▪ 3.740.000,00 euro – Risorse statali per i servizi essenziali (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 13-17); ▪ 300.000,00 euro – Risorse statali integrative per i servizi essenziali (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 314); ▪ 8.607.967,00 euro – Risorse aggiuntive regionali per i servizi essenziali; ▪ 30.000,00 euro – Risorse aggiuntive Enti locali per i servizi essenziali; ▪ 1.373.369,53 euro – Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR); ▪ 250.750,30 euro – Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE); ▪ 3.029.822,18 euro – Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR); ▪ 2.217.449,60 euro – Programma operativo complementare (POC) 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta; ▪ 120.292,04 euro – Risorse regionali per lo sviluppo locale; ▪ 19.669.650,65 euro – Totale risorse Area interna Bassa Valle.

2 Dal 1° gennaio 2017, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 2016, n. 621, il Comune di Emarèse, già facente parte dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, è entrato a far parte dell'Unité des Communes valdôtaines Evançon, facendo, così, salire il numero di comuni a 23 rispetto ai 22 comuni riportati nella Strategia dell'Area interna Bassa Valle.

Cartina 1: Comuni Area interna Bassa Valle

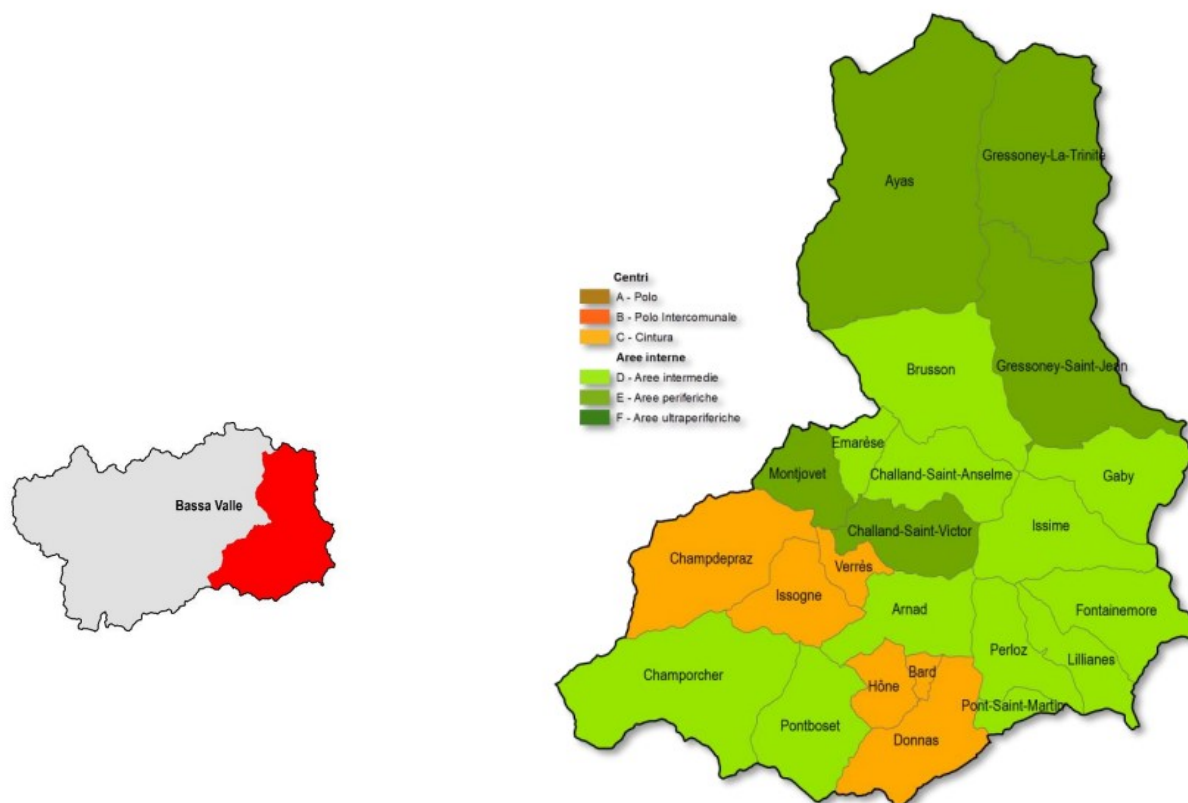

1. STATO DI "CANTIERABILITÀ" DEI SINGOLI INTERVENTI**Tabella 1: Numero progetti cantierabili per anno**

Anno	N. Interventi cantierabili (All. 3)*	N. Interventi non cantierabili	N. Totale Interventi
2017** (Anno di sottoscrizione APQ)	3	24	27
2018	19	9	28
2019	23	6	29
2020	25	5	30
2021	25	5	30
2022	25	5	30
2023	27	3	30
2024	27	3	30
2025	27	3	30

* All'atto della sottoscrizione dell'APQ erano stati considerati cantierabili i soli 3 Interventi inerenti opere pubbliche riconducibili ai servizi essenziali. A partire dall'anno 2018, invece, sono stati considerati cantierabili:

- per gli Interventi intesi come "*Scheda Azione*" (dalla quale derivano i singoli Progetti, selezionati tramite un avviso ad evidenza pubblica), gli Interventi con almeno un Progetto approvato nell'ambito dell'Area interna Bassa Valle;
- per gli Interventi definiti fin dall'origine come singoli Progetti, i soli Interventi il cui relativo Progetto risulta approvato.

** Il 2017 è l'anno in cui è stata apposta la firma del primo firmatario dell'APQ (in data 20 dicembre 2017, a cura del Direttore dell'Area progetti e strumenti dell'Agenzia per la coesione territoriale). Il processo di sottoscrizione digitale dell'APQ, invece, si è concluso in data 16 febbraio 2018 con la sottoscrizione dell'ultimo firmatario (Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute).

2. MODIFICHE APPORTATE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Si riportano, di seguito, in ordine di Intervento – come meglio dettagliate ai capitoli 3.1 "Stato di attuazione Interventi su legge di stabilità" e 3.2 "Stato di attuazione Interventi su altri fondi" – e, nell'ambito di ogni Intervento, per ordine cronologico di presentazione, le modifiche, formalmente approvate, riferite alle Schede intervento di cui all'allegato 2a dell'APQ e a quelle concernenti gli Interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi, ex art. 4, comma 2, d.l. 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2021, n. 155.

Sono, altresì, riportate le proroghe degli Interventi autorizzate dall'Autorità responsabile, a livello regionale, delle Aree interne (ARAI) e l'approvazione delle modifiche di competenza della stessa, a seguito della pubblicazione della delibera CIPESS 23 luglio 2025 n. 31, che non sono state trasmesse al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, ma sono state puntualmente riportate al successivo capitolo 3 "Stato di attuazione Interventi".

Si precisa che sono incluse tutte le modifiche richieste entro il 31 dicembre 2025, anche se approvate formalmente nell'anno 2026.

▪ **Intervento "Realizzazione di un convitto annesso al polo scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado, a Verrès (IS.1.3)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	11 ottobre 2021	- Proroga data di conclusione Intervento all'1.12.2025 - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 3105 del 12 ottobre 2021) - trasmissione da parte di ACT della proposta di modifica dell'Intervento alle Amministrazioni competenti ai fini della mera presa d'atto (prot. n. 7157 del 08.04.2022)
Seconda modifica	5 aprile 2023	- Incremento delle risorse finanziarie regionali - Slittamento del Cronoprogramma delle attività - Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 914 del 19 aprile 2023) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 16003 del 19.05.2023) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 19392 del 21.06.2023)
Terza modifica	27 ottobre 2025	- Incremento delle risorse finanziarie regionali - Modifica del Responsabile dell'attuazione/RUP - Rimodulazione della tipologia di spese - Slittamento del Cronoprogramma delle attività - Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario	- Approvazione da parte dell'ARAI (prot. n. 4773 del 16 dicembre 2025)

▪ **Intervento "Un territorio a tutta salute - Medicina d'iniziativa, IFeC e empowerment di comunità (SN.1)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	22 febbraio 2021	- Sospensione del servizio dell'Infermiera di famiglia e di comunità (IFeC) - Adeguamento delle attività di formazione - Rafforzamento del sistema di emergenza (acquisto ambulanze) - Adeguamento dei risultati attesi, delle voci di spesa e dei target - Proroga data di conclusione Intervento al 28.02.2022 - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 1278 del 31 marzo 2021) - Trasmissione, da parte di ACT, della proposta di modifica dell'Intervento alle Amministrazioni competenti ai fini della mera presa d'atto (prot. n. 7157 del 08.04.2022)
Seconda modifica	7 ottobre 2025	- Proroga della data di conclusione dell'Intervento - Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario, modifiche rese necessarie a causa del prolungamento dei tempi di consegna delle due ambulanze acquistate nell'ambito della Scheda intervento	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 3935 del 14 ottobre 2025) - Si è ancora in attesa di ricevere l'approvazione da parte del DPCOES

▪ **Intervento "Supporto e potenziamento delle organizzazioni del terzo settore in ambito socio-sanitario e sociale (SN.2)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	26 ottobre 2021	- Acquisto di un'ambulanza e di ecografi portatili - Revisione dei risultati attesi, degli indicatori di realizzazione e di risultato - Proroga della data di conclusione dell'Intervento - Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario - Incremento del costo totale dell'Intervento	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 3367 del 4 novembre 2021) - trasmissione, da parte di ACT, della proposta di modifica dell'Intervento alle Amministrazioni competenti ai fini della mera presa d'atto (prot. n. 7157 del 08.04.2022)
Seconda modifica	22 aprile 2022	- Inserimento, tra i Soggetti attuatori, dell'ANPAS - Messa a disposizione, da parte delle tre Unités, di ulteriori 15.000,00 euro di risorse - Revisione delle tipologie di spesa - Revisione del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 1195 del 27 aprile 2022) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 17165 del 10.08.2022) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 8265 del 21.03.2023)

Terza modifica	13 giugno 2023	- Rimodulazione del Crono-programma delle attività e del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 1381 del 15 giugno 2023) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 23994 del 07.08.2023) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 2553 del 24.10.2023)
Quarta modifica	14 dicembre 2023	- Rimodulazione del Crono-programma delle attività e del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 3218 del 15 dicembre 2023) - Il DPCOES, con nota prot. n. 13116 del 09.07.2024, ha trasmesso la Scheda aggiornata al Tavolo dei Sottoscrittori per informativa e presa d'atto
Quinta modifica (solo proroga)	8 ottobre 2024	- Proroga data di conclusione dell'Intervento al 31.12.2024 - Rimodulazione del Crono-programma delle attività	- Approvazione da parte dell'ARAI (prot. n. 3799 del 10 ottobre 2024)

▪ **Intervento "Servizio di trasporto flessibile nell'Area interna Bassa Valle (MB.1)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	6 settembre 2024	- Variazione dei destinatari del servizio (studenti anziché anziani) - Revisione dei target relativi agli indicatori - Proroga data di conclusione Intervento al 31.12.2025 - Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 2918 del 21 settembre 2021) - trasmissione, da parte di ACT, della proposta di modifica dell'Intervento alle Amministrazioni competenti ai fini della mera presa d'atto (prot. n. 7157 del 08.04.2022)
Seconda modifica	5 maggio 2022	- Revisione delle tratte del servizio "generalista" - Rimodulazione del Cronoprogramma delle attività	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 1360 dell'11 maggio 2022) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 17165 del 10.08.2022) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 8265 del 21.03.2023)
Terza modifica	7 giugno 2023	- Revisione delle modalità di espletamento del servizio "generalista" - Revisione dell'indicatore di realizzazione - Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 1314 dell'8 giugno 2023) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 23994 del 07.08.2023) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 30155 del 24.10.2023)

Quarta modifica	20 giugno 2025	- Affidamento del servizio di trasporto a un nuovo operatore economico, con un regime fiscale diverso rispetto a quello precedente - Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario per anno	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 2971 del 25 luglio 2025) - Informativa al Tavolo dei sottoscrittori inviata dal DPCOES (prot. n. 19128 del 24.09.2025) e contestuale approvazione delle modifiche
-----------------	----------------	---	---

▪ **Intervento "Pista ciclabile della Bassa Valle (MB.2)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	17 gennaio 2020	- Riduzione del percorso originariamente previsto - Integrazione marginale delle voci di spesa - Proroga data di conclusione Intervento al 31.12.2022 - Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 441 del 6 febbraio 2020) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 9855 del 31.07.2020) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 13044 del 21.10.2020), a seguito dei pareri favorevoli del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti competente per materia
Seconda modifica (risorse CIPESS n. 41/2022)	10 maggio 2023	- Integrazione delle risorse finanziarie - Revisione degli importi delle tipologie di spesa - Rimodulazione del Cronoprogramma delle attività e del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 1107 dell'11 maggio 2023) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 21651 del 11.07.2023) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 32577 del 20.11.2023)
Terza modifica (avvenuta contestualmente all'Intervento MB.3)	26 giugno 2024	- Incremento dei fondi per implementazione del servizio a valere su risorse regionali ai sensi della l.r. n. 16/2007 - Proroga data di conclusione Intervento ad inizio 2026 - Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario, che ha previsto l'incremento del costo dell'Intervento, per un importo pari a 349.967,00 euro, derivanti da risorse regionali e lo storno, per un importo pari a 185.000,00 euro, di risorse integrative derivanti dalla Delibera CIPESS n. 41/2022, che sono state destinate all'Intervento "Ciclovía intercomunale della media Valle del Lys (MB.3)"	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 2586 dell'11 luglio 2024) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da DPCOES (prot. n. 16709 del 12.09.2024) - Approvazione comunicata da DPCOES (prot. n. 20212 del 29.10.2024)

Quarta modifica	20 novembre 2024	- Proroga data di conclusione Intervento al 2026 - Rimodulazione del Cronoprogramma delle attività e del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 4378 del 25 novembre 2024) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da DPCOES (prot. n. 1486 del 28.01.2025) - Approvazione comunicata da DPCOES (prot. n. 9458 del 23.04.2025)
-----------------	------------------	--	---

▪ **Intervento "Ciclovía intercomunale della media Valle del Lys (MB.3)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	28 febbraio 2019	- Sostituzione della pista ciclo-pedonale con una ciclovía - Allungamento del tracciato - Proroga data di conclusione Intervento al 31.12.2020 - Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 655 del 1° marzo 2019) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 5719 dell'8.04.2019) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 8195 del 22.05.2019)
Seconda modifica	11 novembre 2021	- Proroga data di conclusione Intervento al 31.12.2023 - Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 3574 del 22 novembre 2021) - Trasmissione, da parte di ACT, della proposta di modifica dell'Intervento alle Amministrazioni competenti ai fini della mera presa d'atto (prot. n. 7157 dell'8.04.2022)
Terza modifica (risorse CIPESS n. 41/2022)	10 maggio 2023	- Integrazione delle risorse finanziarie - Previsione di alcune migliorie tecniche - Revisione degli importi delle tipologie di spesa - Rimodulazione del Cronoprogramma delle attività e del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 1107 del 11 maggio 2023) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 21651 del 11.07.2023) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 32577 del 20.11.2023)
Quarta modifica (avvenuta contestualmente all'Intervento MB.2)	26 giugno 2024	- Incremento dei fondi per implementazione del servizio - Proroga data di conclusione Intervento al 31 marzo 2026 - Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario, che ha previsto l'incremento del costo dell'Intervento, per un importo pari a 185.000,00 euro, con le risorse integrative derivanti dalla Delibera CIPESS n. 41/2022, stornate dall'Intervento "Pista ciclabile della Bassa Valle (MB.2)";	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 2586 dell'11 luglio 2024) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da DPCOES (prot. n. 16709 del 12.09.2024) - Approvazione comunicata da DPCOES (prot. n. 20212 del 29.10.2024)

		l'estensione del percorso di circa 5 km nei Comuni di Lillianes e Fontainemore; la predisposizione di una campagna pubblicitaria finale al fine di promuovere l'opera; la predisposizione della specifica cartellonistica lungo il tracciato della ciclovía; il posizionamento, lungo il percorso, di un paio di stazioni per la riparazione delle biciclette e di alcune panchine	
--	--	--	--

▪ **Intervento "Supporto alla progettazione, gestione, monitoraggio e controllo della Strategia dell'Area interna Bassa Valle (AT.1)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	23 giugno 2021	- Nuova voce di spesa finalizzata a finanziare una risorsa dedicata al coordinamento tecnico-amministrativo della Strategia - Proroga data di conclusione Intervento al 31.12.2024 - Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 2175 del 25 giugno 2021) - Trasmissione da parte di ACT della proposta di modifica dell'Intervento alle Amministrazioni competenti ai fini della mera presa d'atto (prot. n. 7157 dell'8.04.2022)
Seconda modifica	19 novembre 2024	- Proroga data di conclusione Intervento al 30.06.2029, per consentire al Soggetto capofila di svolgere le attività connesse alla Strategia d'Area - Rimodulazione del Cronoprogramma delle attività e del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 4391 del 26 novembre 2024) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da DPCOES (prot. n. 9464 del 23.04.2025) - Approvazione comunicata da DPCOES (prot. n. 9464 del 23.04.2025)
Terza modifica	16 ottobre 2025	- Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario, a seguito della ripartizione dell'onorario ancora spettante alla RTI affidataria del servizio di assistenza tecnica	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 3997 del 20 ottobre 2025) Si è ancora in attesa di ricevere l'approvazione da parte del DPCOES

▪ **Intervento "Quassod (BV01)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	25 marzo 2025	- Modifica della descrizione delle tipologie di spesa, - Rimodulazione del Cronoprogramma delle attività e del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 1283 del 28 marzo 2025) - Avvio, da parte del DPCOES, della procedura di consultazione in forma scritta

			indirizzata ai Soggetti istituzionali interessati (prot. n.22289 del 4.11.2025) - Approvazione comunicata via mail da DPCOES, in data 18 febbraio 2026, in assenza di osservazioni da parte dei Soggetti istituzionali interessati
--	--	--	--

▪ **Intervento "Vers-Fey (BV02)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	25 marzo 2025	- Modifica della descrizione delle tipologie di spesa, - Rimodulazione del Cronoprogramma delle attività e del Cronoprogramma finanziario - Modifica dell'importo complessivo della Scheda a seguito di ulteriori risorse regionali, pari a euro 240.000,00, che hanno portato l'importo totale dell'Intervento a euro 410.000,00	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 1283 del 28 marzo 2025) - Avvio, da parte del DPCOES, della procedura di consultazione in forma scritta indirizzata ai Soggetti istituzionali interessati (prot. n.22289 del 4.11.2025) - Approvazione comunicata via mail da DPCOES, in data 18 febbraio 2026, in assenza di osservazioni da parte dei Soggetti istituzionali interessati

➤ **Intervento "Tetas-Nova Superiore (BV03)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	25 marzo 2025	- Modifica della descrizione delle tipologie di spesa, - Rimodulazione del Cronoprogramma delle attività e del Cronoprogramma finanziario - Modifica dell'importo complessivo della Scheda a seguito dell'assegnazione di ulteriori risorse regionali, pari a euro 325.000,00, che hanno portato l'importo totale dell'Intervento a euro 1.100.000,00	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 1283 del 28 marzo 2025) - Avvio, da parte del DPCOES, della procedura di consultazione in forma scritta indirizzata ai Soggetti istituzionali interessati (prot. n.22289 del 4.11.2025) - Approvazione comunicata via mail da DPCOES, in data 18 febbraio 2026, in assenza di osservazioni da parte dei Soggetti istituzionali interessati

▪ **Intervento "La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – Accademia e bottega (IS.1.1.1)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	5 marzo 2021	- Soppressione attività rivolte alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado - Revisione dei percorsi formativi per la scuola secondaria di 2° grado - Proroga data di conclusione Intervento al 31.12.2023 - Rimodulazione del Crono-programma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 3633 del 12 marzo 2021) - ACT trasmette la proposta di modifica dell'Intervento alle Amministrazioni competenti ai fini della mera presa d'atto (prot. n. 7157 del 08.04.2022)

▪ **Interventi "La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – 'Alternanza scuola-lavoro' e 'Imprenditorialità giovanile' (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO) (IS.1.1.2)" e "La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – Imprenditorialità giovanile (IS.1.1.3)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	11 giugno 2021	- Le attività di alternanza scuola-lavoro e di imprenditorialità giovanile sono state finanziate con fondi regionali - Poiché i fondi regionali sono stati stanziati cumulativamente e ciò non ha consentito di dar conto dell'avanzamento finanziario per singolo Intervento, di tale avanzamento ne verrà dato conto nell'ambito delle successive Relazioni di avanzamento annuale dell'APQ, mediante l'aggiornamento del quadro d'insieme delle risorse complessivamente destinate agli stessi	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 2416 del 19 luglio 2021) - Comunicazione da parte dell'ACT della necessità di modificare le singole Schede, al fine di poter avviare la procedura di consultazione del Tavolo dei sottoscrittori. A seguito della suddetta comunicazione dell'ACT, il RUA ha provveduto a formalizzare la richiesta di modifica delle 2 Schede intervento
Seconda modifica	26 agosto 2022	Per entrambe le Schede: - Rimodulazione delle risorse a seguito dell'erogazione di risorse integrative regionali - Rimodulazione dei cronoprogrammi delle attività - Aggiornamento della denominazione del Soggetto attuatore	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 2233 del 2 settembre 2022) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 19251 del 16.09.2022) - Invio nuova relazione a ACT per fornire le precisazioni richieste nella riunione del 10 novembre 2022 - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 8266 del 21.03.2023)

- **Interventi "Interventi per la formazione di giovani e adulti (SL.5.1)" e "Interventi per la formazione continua interaziendale dei dipendenti e/o titolari delle micro, piccole, medie e grandi imprese (SL.5.2)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	21 luglio 2021	- La Scheda IS.1.1.4 è stata suddivisa nei 2 Interventi IS.1.1.4.1 e IS.1.1.4.2. - Sono state proposte due nuove Schede intervento – denominate "Interventi per la formazione di giovani e adulti (SL.5.1)" e "Interventi per la formazione continua interaziendale dei dipendenti e/o titolari delle micro, piccole, medie e grandi imprese (SL.5.2)" – sostitutive degli Interventi IS.1.1.4.1 e IS.1.1.4.2	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 3041 del 5 ottobre 2021) - Comunicazione, da parte di ACT, che la procedura di modifica di cui trattasi si può considerare conclusa con esito positivo

Nella seguente Tabella 2 si riporta il raffronto tra la copertura finanziaria iniziale dell'APQ e quella al 31.12.2025³, sia per quanto concerne i dati complessivi (che registrano un incremento di quasi 2,4 milioni di euro, pari a +8,1%), sia per quelli riferiti alla sola Area interna Bassa Valle (che registrano un incremento di quasi 4,3 milioni di euro, pari a +27,7%).

3 Rimangono quindi escluse le variazioni derivanti da modifiche approvate dopo il 31.12.2025 o il cui iter di approvazione non risulti ancora concluso.

Tabella 2: Raffronto tra la copertura finanziaria iniziale dell'APQ e quella al 31.12.2025

Fonti di finanziamento	Copertura finanziaria complessiva			Copertura finanziaria Area interna Bassa Valle		
	iniziale*	al 31.12.2025	Variazione %	iniziale	al 31.12.2025	Variazione %
Risorse statali per i Servizi essenziali - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, commi 13-17	3.740.000,00	3.740.000,00	-	3.740.000,00	3.740.000,00	-
Risorse statali integrative per i Servizi essenziali - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 314	-	300.000,00	non quantificabile	-	300.000,00	non quantificabile
Risorse aggiuntive regionali per i Servizi essenziali	3.058.000,00	8.607.967,00	181,5	3.058.000,00	8.607.967,00	181,5
Risorse aggiuntive Enti locali per i Servizi essenziali	-	30.000,00	non quantificabile	-	30.000,00	non quantificabile
Subtotale Servizi essenziali	6.798.000,00	12.677.967,00	86,5	6.798.000,00	12.677.967,00	86,5
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	4.373.600,00	3.076.516,52	- 29,7	1.569.084,00	1.373.369,53	- 12,5
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)	6.047.000,00	1.389.283,71	- 77,0	803.000,00	250.750,30	- 68,8
Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR)	10.272.979,00	8.496.631,81	- 17,3	5.692.979,00	3.029.822,18	- 46,8
Programma operativo complementare (POC) 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta	2.000.000,00	5.574.966,72	178,7	540.000,00	2.217.449,60	310,6
Risorse regionali per lo Sviluppo locale**	-	651.868,77	non quantificabile	-	120.292,04	non quantificabile
Subtotale Sviluppo locale	22.693.579,00	19.189.267,53	- 15,4	8.605.063,00	6.991.683,65	- 18,7
Totale	29.491.579,00	31.867.234,53	8,1	15.403.063,00	19.669.650,65	27,7

* L'importo totale della "Copertura finanziaria complessiva" iniziale dell'APQ (pari a 26.914.579,00 euro) ha subito una variazione in aumento (pari a 2.577.000,00 euro) riconducibile al Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE), a seguito della sostituzione (approvata dall'Agenzia per la coesione territoriale con nota prot. n. 8265 del 21 marzo 2023) degli interventi IS.1.1.4.1 "Studenti in movimento - Stage aziendali all'estero" e IS.1.1.4.2 "Studenti in movimento - Mobilità linguistica all'estero" con gli interventi SL.5.1 "Interventi per la formazione di giovani e adulti" e SL.5.2 "Interventi per la formazione continua interaziendale dei dipendenti e/o titolari delle micro, piccole, medie e grandi imprese".

** Risorse erogate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in via cumulativa per le attività di "Alternanza scuola-lavoro" e di "Imprenditorialità giovanile", ricondotte all'intervento IS.1.1.2 "La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo - 'Alternanza scuola-lavoro' e 'Imprenditorialità giovanile' (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO)", di cui si è dato conto a seguito dell'approvazione della modifica della relativa scheda intervento (cfr. nota prot. n. 8266 del 21 marzo 2023 dell'Agenzia per la coesione territoriale), che inizialmente prevedeva il solo finanziamento a carico del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE).

3. STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Il monitoraggio degli Interventi riconducibili all'APQ "Area interna Bassa Valle" è assicurato, a livello regionale, attraverso i seguenti sistemi informativi:

- Sistema informativo regionale denominato "SISPREG2014" (accreditato presso il SNM), per gli Interventi sui servizi essenziali afferenti al Programma "Strategia Aree interne Regione Valle d'Aosta – Linea Bassa Valle", per gli Interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi e per gli Interventi di sviluppo locale afferenti ai Programmi FESR, FSE e POC 2014/20;
- Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), per gli Interventi di sviluppo locale afferenti al Programma FEASR 2014/22.

In generale, SISPREG2014 consente la gestione informatizzata delle procedure e delle attività, a livello di Programma e di singolo Intervento, da parte di tutti i soggetti coinvolti ed è deputato, fra l'altro, alla trasmissione bimestrale, al SNM dell'IGRUE, delle informazioni previste dall'apposito Protocollo unico di colloquio.

Si riportano, di seguito, le principali criticità riscontrate nell'alimentazione della BDU dell'IGRUE:

- a seguito dell'aggiornamento del "Documento tecnico per il monitoraggio della SNAI" (trasmesso dall'IGRUE con nota prot. n. 277366, in data 4 novembre 2021) è emerso l'obbligo di associare al Progetto un indicatore di risultato comune (TC42), a differenza di quanto previsto dalla lettera dell'IGRUE prot. n. 198959, in data 3 novembre 2017 che, invece, prevedeva di associare al Progetto almeno un indicatore scelto tra quelli presenti in una delle due Tabelle di contesto "TC42-Indicatori di Risultato comuni" e "TC43-Indicatori di Risultato definiti dal Programma". Pertanto si è reso necessario allineare, per quanto possibile, alle ultime indicazioni dell'IGRUE, gli indicatori dei progetti riconducibili all'APQ "Area interna Bassa Valle", che erano stati inseriti inizialmente rispettando le specifiche della lettera dell'IGRUE del 3 novembre 2017⁴;
- per i Programmi FESR e FSE 2014/20 non è stato possibile recepire quanto previsto dalla nota RGS-IGRUE prot. n. 214939 del 4 ottobre 2024, in quanto i Progetti risultavano già conclusi, come già condiviso nel corso dell'incontro bilaterale tra il DPCOES e il Dipartimento politiche strutturali e affari europei (ora Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili), avvenuto in videoconferenza in data 21 ottobre 2025;
- per il Programma FEASR 2014/22 non è stato recepito quanto previsto dalla nota indicata al punto precedente, in quanto non è stato possibile implementare SIAN con i campi "Progetto complesso" e "Strumento attuativo" necessari per ricondurre i Progetti alla SNAI; così come non è stato possibile inserire gli indicatori di output "SNAI_VDA_AI1" e "SNAI_VDA_AI2", presenti nella tabella di contesto TC45, al fine di misurare l'avanzamento finanziario della quota SNAI nell'Area interna di riferimento.

4 A titolo esemplificativo, per i progetti FSE "Divento imprenditore" e "Interventi di animazione territoriale per la diffusione della cultura d'impresa nel periodo 2016-2018", ciò non è stato possibile, in quanto i Progetti si sono conclusi molto prima dell'aggiornamento delle disposizioni dell'IGRUE del 4 novembre 2021.

Per quanto concerne i 30 Interventi previsti nell'Area interna Bassa Valle al 31 dicembre 2025⁵, con riferimento alla sola quota riferita alla stessa, laddove trattasi di interventi con una più ampia estensione, si evidenzia che:

- 22 Interventi risultano conclusi (IS.1.1.2, IS.1.1.3, IS.1.2, SN.1, SN.2, MB.1, BL.1, SL.1.1, SL.1.2, SL.1.3, SL.1.3 bis, SL.1.4, SL.2.1, SL.2.2, SL.3.1, SL.3.4, SL.3.5, SL.4.1, SL.4.2, SL.4.3, SL.5.1 e SL.5.2);
- 5 Interventi risultano in fase di attuazione (IS.1.3, MB.2, MB.3, SL.4.1 bis e AT.1), con differenti gradi di avanzamento e problematiche, come evidenziato nel prosieguo di questa Relazione;
- 3 Interventi risultano non attuabili, di cui 1 riconducibile all'Azione portante "A – *Realizzazione di un polo scolastico di eccellenza*" (IS 1.1.1) e 2 riferibili all'Azione portante "G – *Rilancio della filiera bosco*" (SL.3.2 e SL.3.3), per le motivazioni riportate, rispettivamente, nei paragrafi 3.2.3 e 3.2.4.

Al 31 dicembre 2025, quindi, risultano in fase di attuazione 4 Interventi (IS.1.3, MB.2, MB.3 e AT.1) rispetto agli 8 previsti nell'ambito dei servizi essenziali di cittadinanza (istruzione, sanità e mobilità). Alla stessa data, per gli Interventi riconducibili allo sviluppo locale si registra la presentazione, nella sola Area interna Bassa Valle, di 79 progetti, di cui 72 approvati (cfr. Tabella 3).

5 L'APQ prevedeva inizialmente 27 Interventi, diventati poi 28 nel corso del 2018, a seguito della suddivisione in 2 Azioni dell'intervento IS.1.1.4 (come meglio specificato nel paragrafo 3.2.3), 29 nel corso del 2019, a seguito dell'approvazione di un intervento a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) per lo sviluppo di una banca dati (cfr. paragrafo 3.2.1, intervento SL.1.3 bis) e 30 nel corso del 2020, a seguito dell'approvazione di un intervento a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) per il rafforzamento di servizi offerti presso l'incubatore di impresa e la creazione di un acceleratore di impresa, ora finanziato dal Programma operativo complementare (POC) 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta (cfr. paragrafo 3.2.2, intervento SL.4.1 bis).


Tabella 3: Progetti derivanti dagli Interventi di sviluppo locale per Programma, al 31.12.2025

Programma	Progetti presentati	Progetti in istruttoria	Progetti non approvati	Progetti approvati	Tasso di approvazione
Totale complessivo					
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	26	0	0	26	100,0%
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)	39	0	3	36	92,3%
Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR)	104	0	22	82	78,8%
Programma operativo complementare (POC) 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta	34	0	19	15	44,1%
Totale	203	0	44	159	78,3%
di cui Area interna Bassa Valle					
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	15	0	0	15	100,0%
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)	15	0	1	14	93,3%
Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR)	44	0	5	39	88,6%
Programma operativo complementare (POC) 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta	5	0	1	4	80,0%
Totale	79	0	7	72	91,1%

Con riferimento all'avanzamento finanziario dell'APQ per anno (cfr. Grafico 1, all'interno del quale sono rappresentati i soli dati di attuazione relativi all'Area interna Bassa Valle), si evidenziano le seguenti variazioni rilevate raffrontando i dati degli indicatori finanziari al 31 dicembre 2025 con quelli relativi all'anno precedente, le cui definizioni sono riportate nella Nota metodologica inserita all'inizio di questa Relazione:

- incremento del 4,6% della dotazione finanziaria dell'APQ (pari, in valore assoluto, a +865 mila euro), passata dai 18,8 milioni di euro al 31.12.2024 a 19,7 milioni di euro al 31.12.2025, grazie all'assegnazione di ulteriori risorse regionali a valere sull'Intervento IS.1.3 (quasi +3,4 milioni di euro), controbilanciata dalla riduzione della dotazione su diversi Interventi (la più rilevante è riferita all'Intervento BL.1, pari a -1,75 milioni di euro) a seguito delle operazioni di chiusura finanziaria degli stessi;
- crescita del 6,5% del finanziamento (quasi +1,3 milioni di euro), che ha così raggiunto i 21 milioni di euro. La differenza rispetto ai 19,7 milioni di euro della dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (pari a circa +1,3 milioni di euro) è, prevalentemente, attribuibile alle risorse private riconducibili agli Interventi SL.1.4 e SL.4.2 non conteggiate all'interno della dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025;
- riduzione del 18,7% del costo ammesso (pari a circa -2,5 milioni di euro), che si attesta così a 10,9 milioni di euro, prevalentemente a causa delle operazioni di chiusura finanziaria di diversi Interventi, che hanno portato all'allineamento del costo ammesso ai pagamenti ammessi;
- lieve crescita degli impegni (+2,2%), che raggiungono così i 10,6 milioni di euro (+231 mila euro). Gli impegni ammessi, invece, fanno registrare una lieve flessione (-1,4%), attestandosi a 9,4 milioni di euro (-134 mila euro), a causa dell'allineamento ai pagamenti ammessi in sede di chiusura finanziaria di diversi Interventi, non del tutto compensato dall'incremento degli impegni ammessi relativo agli Interventi ancora in corso di attuazione;

- deciso incremento dei pagamenti (+64,5%), che si attestano così a poco meno di 8 milioni di euro (+3,1 milioni di euro). Il *trend* è in linea con la crescita dei pagamenti ammessi (+62,7%), che raggiungono i 7,5 milioni di euro (+2,9 milioni di euro).

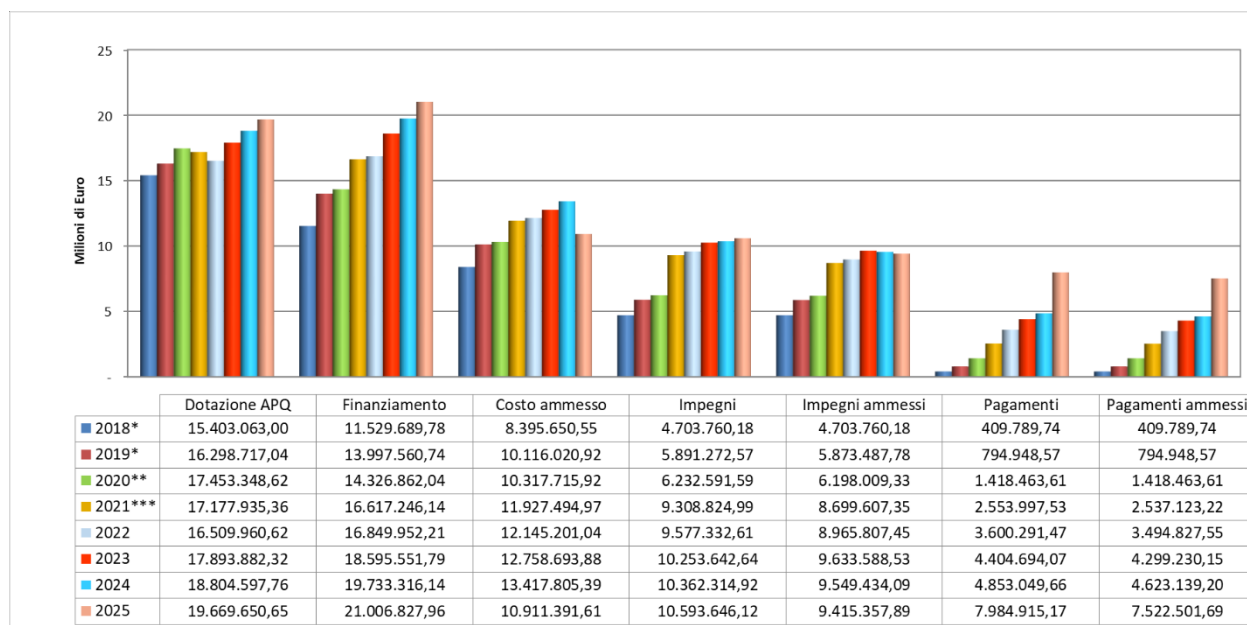Grafico 1: Avanzamento finanziario dell'APQ per anno (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)

* Al 31.12.2018 e al 31.12.2019 non erano disponibili i dati di attuazione finanziaria per i seguenti Interventi: SL.4.1 e SL.4.3.

** Al 31.12.2020 non erano disponibili i dati di attuazione finanziaria per i seguenti Interventi: SL.4.1, SL.4.1 bis e SL.4.3.

*** Dal 31.12.2021 vi è la disponibilità di tutti i dati di attuazione finanziaria.

Ai fini del monitoraggio dell'avanzamento finanziario dell'APQ, appare utile effettuare un raffronto tra l'avanzamento percentuale dei principali indicatori finanziari (Finanziamento, Impegni e Pagamenti) rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025⁶, che rappresenta il valore di riferimento che, gradualmente, dovrebbe essere raggiunto dagli Impegni e dai Pagamenti.

Nei grafici che seguono sono rappresentati – con riferimento ai soli dati riconducibili all'Area interna Bassa Valle – sia l'avanzamento percentuale dei principali indicatori finanziari rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025, sia la capacità di impegno e di spesa, in relazione alla Tipologia degli interventi (cfr. grafici 2 e 3), ai Programmi di riferimento (cfr. grafici 4 e 5), alle Azioni portanti (cfr. grafici 6 e 7) e ai Settori di intervento dei Progetti relativi ai servizi essenziali (cfr. grafici 8 e 9).

6 Si è preferito utilizzare questo indicatore, piuttosto che la Dotazione iniziale dell'APQ, al fine di rapportare i singoli indicatori alla dotazione finanziaria più aggiornata.

Grafico 2: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per tipologia degli Interventi (servizi essenziali e sviluppo locale), rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)

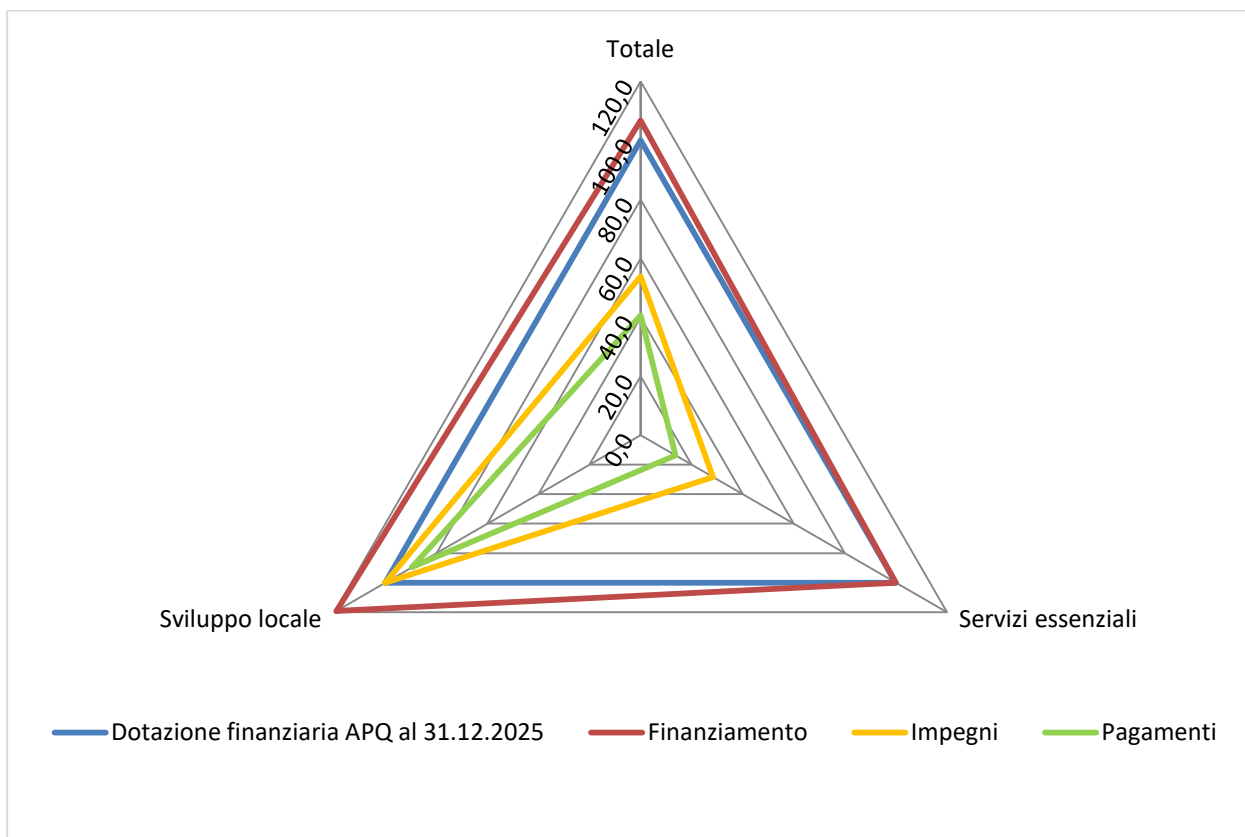


Grafico 3: Capacità di impegno e di spesa degli Interventi (servizi essenziali e sviluppo locale) riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)



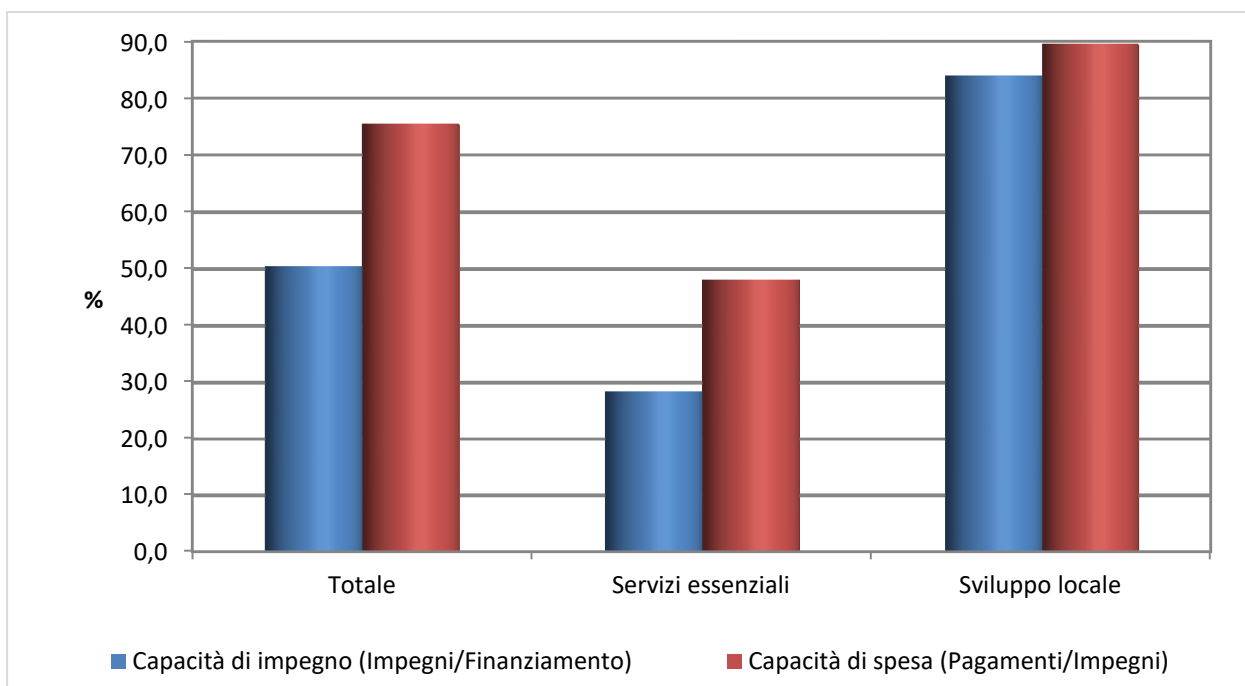


Grafico 4: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per Programma, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)

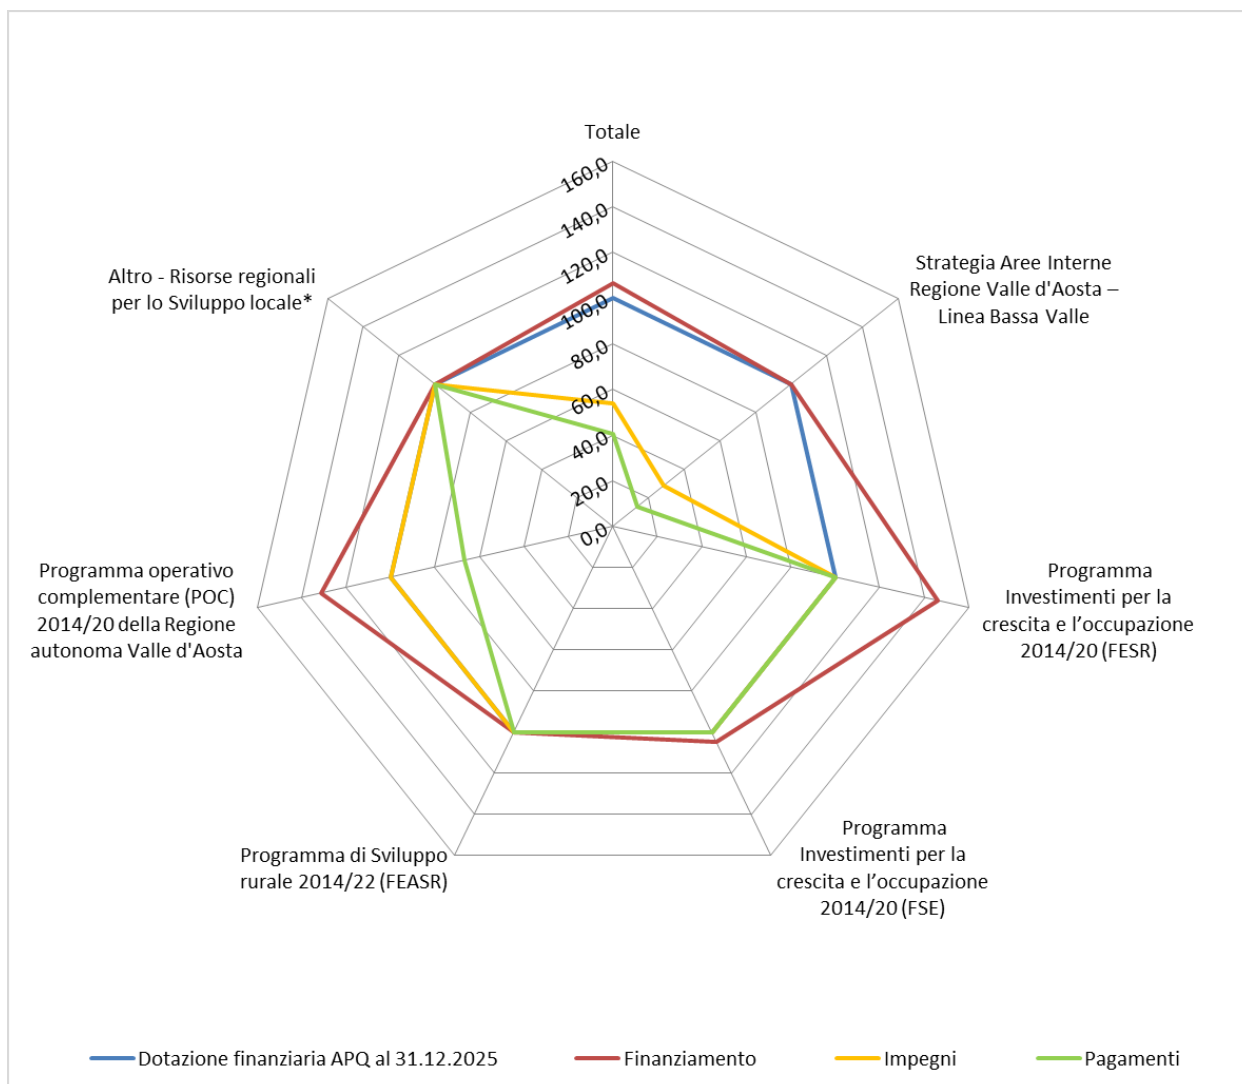


* Risorse erogate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in via cumulativa per le attività di "Alternanza scuola-lavoro" e di "Imprenditorialità giovanile", ricondotte all'Intervento IS.1.1.2 "La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo - "Alternanza scuola-lavoro" e "Imprenditorialità giovanile" (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO)", di cui si è dato conto a seguito dell'approvazione della modifica della relativa Scheda intervento (cfr. nota prot. n. 8266 del 21 marzo 2023 dell'Agenzia per la coesione territoriale), che inizialmente prevedeva il solo finanziamento a carico del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE).

Grafico 5: Capacità di impegno e di spesa dei Programmi riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)

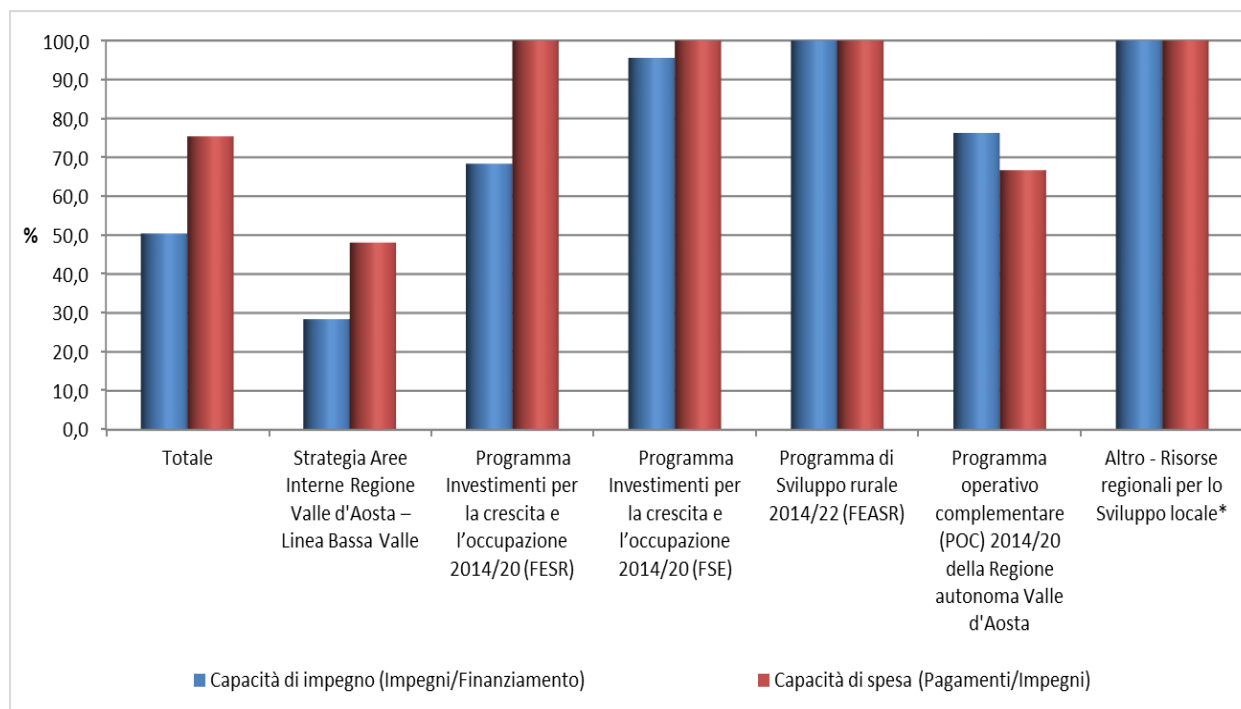


* Risorse erogate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in via cumulativa per le attività di "Alternanza scuola-lavoro" e di "Imprenditorialità giovanile", ricondotte all'intervento IS.1.1.2 "La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo - "Alternanza scuola-lavoro" e "Imprenditorialità giovanile" (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO)", di cui si è dato conto a seguito dell'approvazione della modifica della relativa Scheda intervento (cfr. nota prot. n. 8266 del 21 marzo 2023 dell'Agenzia per la coesione territoriale), che inizialmente prevedeva il solo finanziamento a carico del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE).

Grafico 6: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per Azione portante, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)

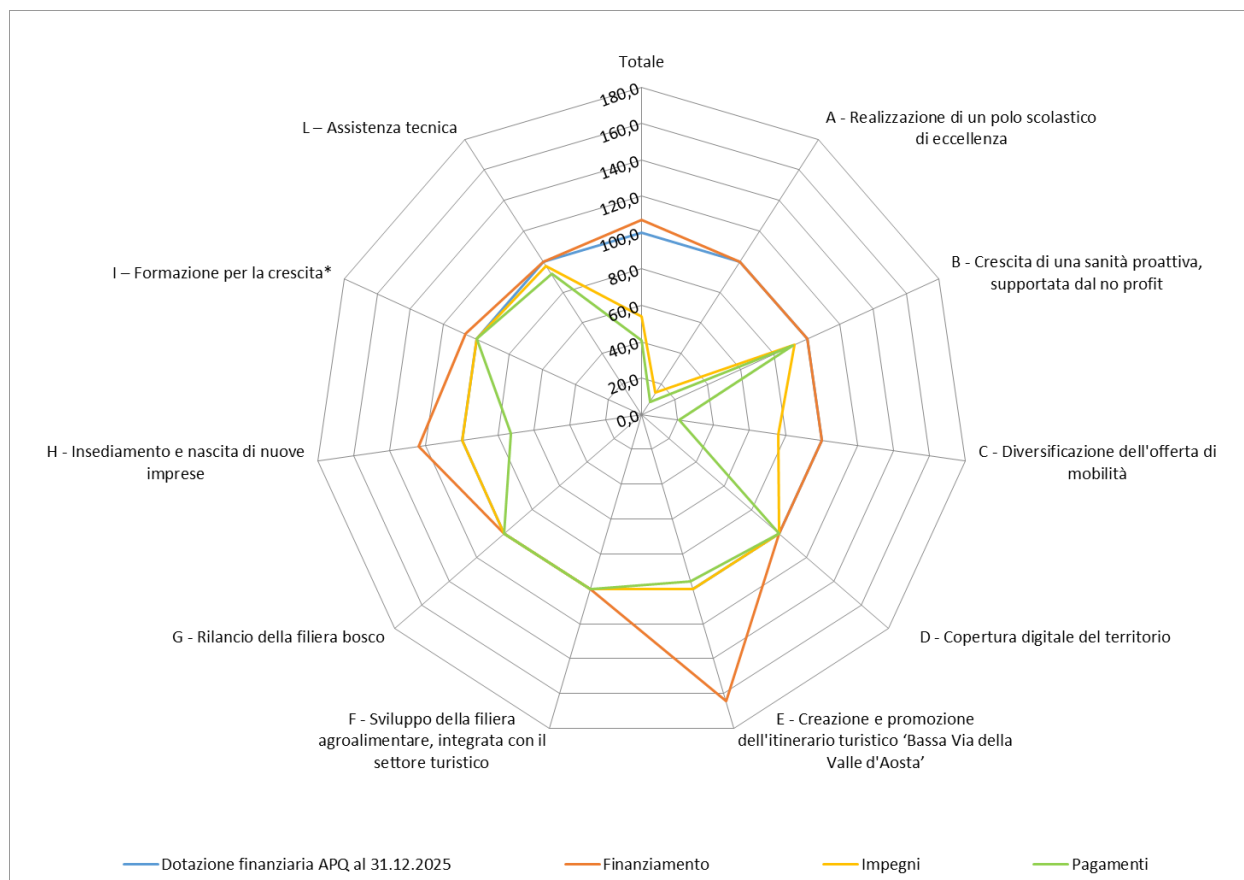

* Azione portante non presente alla data di sottoscrizione dell'APQ Area interna Bassa Valle, ma inserita dopo la sostituzione (approvata dall'Agenzia per la coesione territoriale con nota prot. n. 8265 del 21 marzo 2023) degli interventi IS.1.1.4.1 "Studenti in movimento - Stage aziendali all'estero" e IS.1.1.4.2 "Studenti in movimento - Mobilità linguistica all'estero" con gli interventi SL.5.1 "Interventi per la formazione di giovani e adulti" e SL.5.2 "Interventi per la formazione continua interaziendale dei dipendenti e/o titolari delle micro, piccole, medie e grandi imprese".

Grafico 7: Capacità di impegno e di spesa delle Azioni portanti riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)

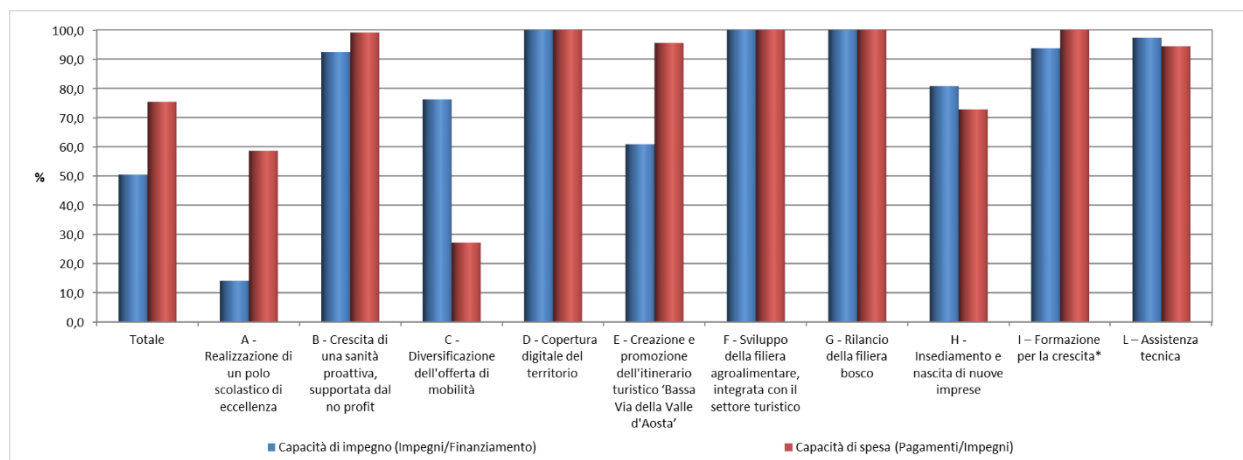

* Azione portante non presente alla data di sottoscrizione dell'APQ Area interna Bassa Valle, ma inserita dopo la sostituzione (approvata dall'Agenzia per la coesione territoriale con nota prot. n. 8265 del 21 marzo 2023) degli interventi IS.1.1.4.1 "Studenti in movimento - Stage aziendali all'estero" e IS.1.1.4.2 "Studenti in movimento - Mobilità linguistica all'estero" con gli interventi SL.5.1 "Interventi per la formazione di giovani e adulti" e SL.5.2 "Interventi per la formazione continua interaziendale dei dipendenti e/o titolari delle micro, piccole, medie e grandi imprese".

Grafico 8: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per i Settori di intervento degli Interventi relativi ai servizi essenziali, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)


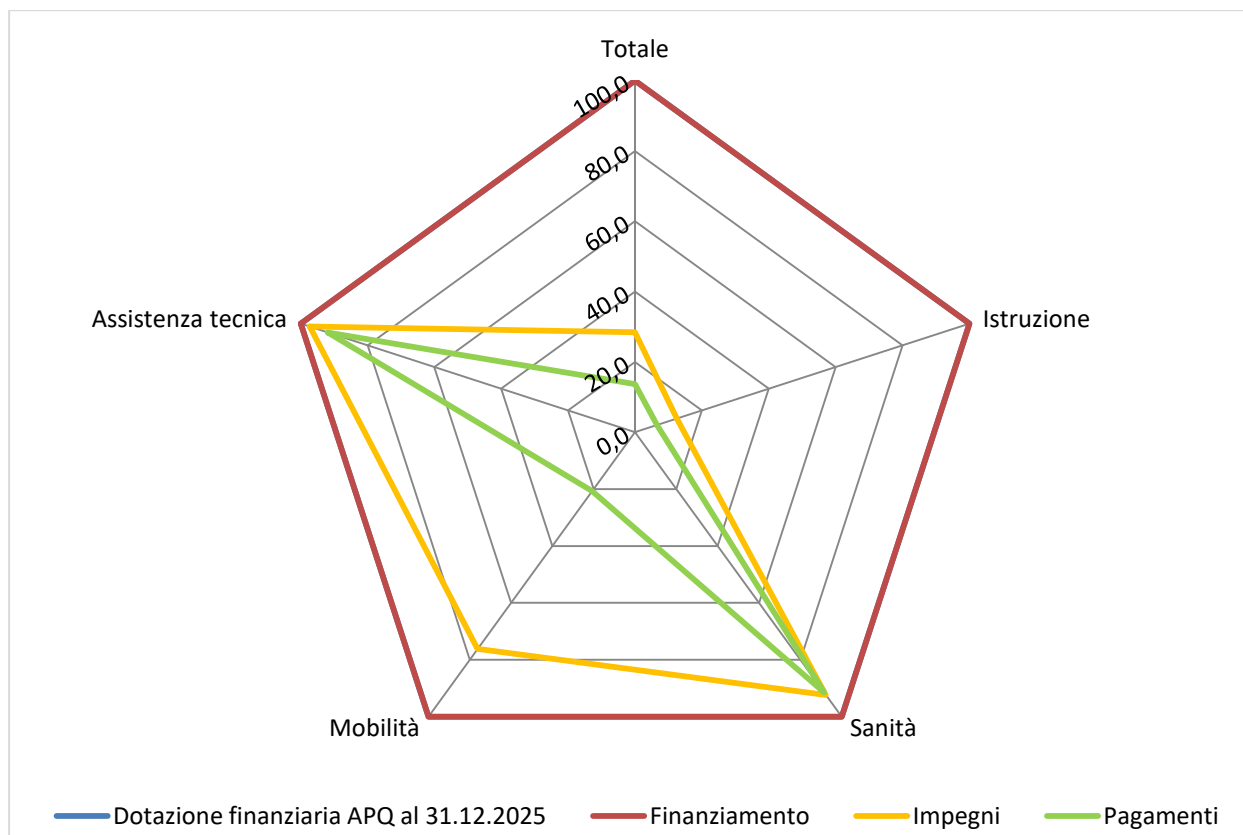


Grafico 9: Capacità di impegno e di spesa dei Settori di intervento degli Interventi relativi ai servizi essenziali riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Bassa Valle)

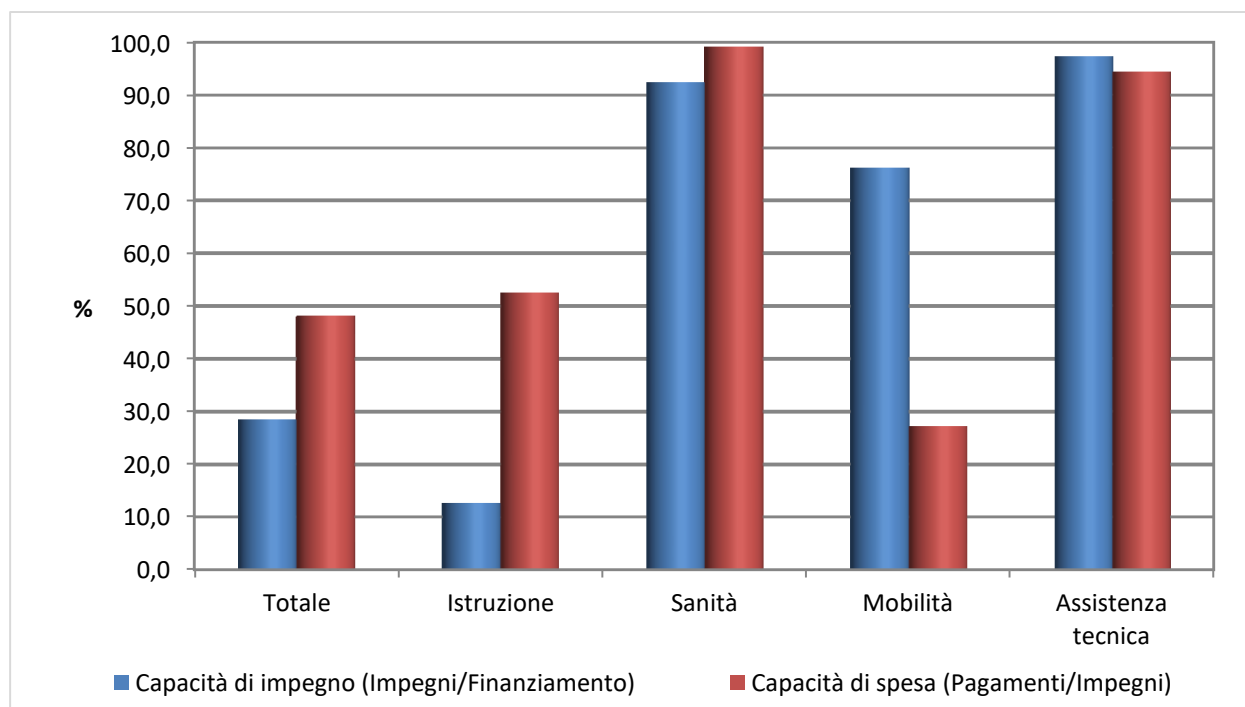

Si riportano, di seguito, le tabelle concernenti l'avanzamento finanziario dell'APQ al 31.12.2025, in relazione alla **Tipologia degli interventi** (cfr. Tabella 4), ai **Programmi di riferimento** (cfr. Tabella 5), alle **Azioni portanti** (cfr. Tabella 6) e ai **Settori di intervento** degli Interventi relativi ai servizi essenziali (cfr. Tabella 7). I dati riportati sono riferiti sia al costo complessivo degli Interventi, sia al costo degli stessi nella sola Area interna Bassa Valle.

Tabella 4: Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Bassa Valle" per tipologia degli Interventi (servizi essenziali e sviluppo locale), al 31.12.2025

Tipologia interventi	Dotazione finanziaria iniziale APQ	Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2025	Numero Progetti				Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
			Presentati	In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Servizi essenziali												
Totale	6.798.000,00	12.677.967,00	8	0	0	8	12.677.967,00	4.040.000,00	3.601.962,47	2.543.966,28	1.732.366,06	1.390.244,62
di cui Area interna Bassa Valle	6.798.000,00	12.677.967,00	8	0	0	8	12.677.967,00	4.040.000,00	3.601.962,47	2.543.966,28	1.732.366,06	1.390.244,62
Sviluppo locale												
Totale	22.693.579,00	19.189.267,53	203	0	44	159	22.686.347,31	18.537.398,76	19.189.267,53	18.537.398,76	17.157.584,64	16.505.715,87
di cui Area interna Bassa Valle	8.605.063,00	6.991.683,65	79	0	7	72	8.328.860,96	6.871.391,61	6.991.683,65	6.871.391,61	6.252.549,11	6.132.257,07
Totale complessivo												
Totale	29.491.579,00	31.867.234,53	211	0	44	167	35.364.314,31	22.577.398,76	22.791.230,00	21.081.365,04	18.889.950,70	17.895.960,49
di cui Area interna Bassa Valle	15.403.063,00	19.669.650,65	87	0	7	80	21.006.827,96	10.911.391,61	10.593.646,12	9.415.357,89	7.984.915,17	7.522.501,69

Tabella 5: Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Bassa Valle" per Programma, al 31.12.2025

Programma	Dotazione finanziaria iniziale APQ	Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2025	Numero Progetti				Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
			Presentati	In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Strategia Aree Interne Regione Valle d'Aosta – Linea Bassa Valle (2018AREINTVALD)												
Totale	6.798.000,00	12.677.967,00	8	0	0	8	12.677.967,00	4.040.000,00	3.601.962,47	2.543.966,28	1.732.366,06	1.390.244,62
di cui Area interna Bassa Valle	6.798.000,00	12.677.967,00	8	0	0	8	12.677.967,00	4.040.000,00	3.601.962,47	2.543.966,28	1.732.366,06	1.390.244,62
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) – (2014IT16RFOP020)												
Totale	4.373.600,00	3.076.516,52	26	0	0	26	4.597.669,39	3.076.516,52	3.076.516,52	3.076.516,52	3.076.516,52	3.076.516,52
di cui Area interna Bassa Valle	1.569.084,00	1.373.369,53	15	0	0	15	2.008.763,45	1.373.369,53	1.373.369,53	1.373.369,53	1.373.369,53	1.373.369,53
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE) – (2014IT05SFOP011)												
Totale	6.047.000,00	1.389.283,71	39	0	3	36	1.525.490,63	1.389.283,71	1.389.283,71	1.389.283,71	1.389.283,71	1.389.283,71
di cui Area interna Bassa Valle	803.000,00	250.750,30	15	0	1	14	262.434,28	250.750,30	250.750,30	250.750,30	250.750,30	250.750,30
Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR) – (2014IT06RDRP013)												
Totale	10.272.979,00	8.496.631,81	104	0	22	82	8.496.631,81	8.496.631,81	8.496.631,81	8.496.631,81	8.481.163,77	8.481.163,77
di cui Area interna Bassa Valle	5.692.979,00	3.029.822,18	44	0	5	39	3.029.822,18	3.029.822,18	3.029.822,18	3.029.822,18	3.029.822,18	3.029.822,18
Programma operativo complementare (POC) 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta – (POCVALLEAOSTA)												
Totale	2.000.000,00	5.574.966,72	34	0	19	15	7.414.686,71	5.574.966,72	5.574.966,72	5.574.966,72	3.558.751,87	3.558.751,87
di cui Area interna Bassa Valle	540.000,00	2.217.449,60	5	0	1	4	2.907.549,01	2.217.449,60	2.217.449,60	2.217.449,60	1.478.315,07	1.478.315,07
Altro - Risorse regionali per lo Sviluppo locale*												
Totale	0,00	651.868,77	0	0	0	0	651.868,77	0,00	651.868,77	0,00	651.868,77	0,00
di cui Area interna Bassa Valle	0,00	120.292,04	0	0	0	0	120.292,04	0,00	120.292,04	0,00	120.292,04	0,00
Totale complessivo												
Totale	29.491.579,00	31.867.234,53	211	0	44	167	35.364.314,31	22.577.398,76	22.791.230,00	21.081.365,04	18.889.950,70	17.895.960,49
di cui Area interna Bassa Valle	15.403.063,00	19.669.650,65	87	0	7	80	21.006.827,96	10.911.391,61	10.593.646,12	9.415.357,89	7.984.915,17	7.522.501,69

* Risorse erogate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in via cumulativa per le attività di "Alternanza scuola-lavoro" e di "Imprenditorialità giovanile", ricondotte all'Intervento IS.1.1.2 "La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – "Alternanza scuola-lavoro" e "Imprenditorialità giovanile" (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO)", di cui si è dato conto a seguito dell'approvazione della modifica della relativa Scheda intervento (cfr. nota prot. n. 8266 del 21 marzo 2023 dell'Agenzia per la coesione territoriale), che inizialmente prevedeva il solo finanziamento a carico del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE). Visto che per le attività riconducibili all'Intervento IS.1.1.2 finanziate con risorse regionali non è possibile quantificare il relativo numero di progetti, lo stesso è conteggiato solo per le medesime attività finanziate dal Programma FSE.

Tabella 6: Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Bassa Valle" per Azione portante, al 31.12.2025

Azione portante	Dotazione finanziaria iniziale APQ	Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2025	Numero Progetti				Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
			Presentati	In istruttoria	Non approvati	Approvati						
A - Realizzazione di un polo scolastico di eccellenza												
Totale	6.350.000,00	10.569.619,00	14	0	2	12	10.611.774,04	1.659.750,23	2.084.533,15	709.132,54	1.506.816,67	538.610,46
di cui Area interna Bassa Valle	5.103.000,00	9.879.649,94	5	0	0	5	9.882.682,73	1.501.357,90	1.394.564,09	550.740,21	816.847,61	380.218,13
B - Crescita di una sanità proattiva, supportata dal no profit												
Totale	458.000,00	488.000,00	2	0	0	2	488.000,00	458.000,00	450.719,82	420.781,32	446.565,29	420.781,29
di cui Area interna Bassa Valle	458.000,00	488.000,00	2	0	0	2	488.000,00	458.000,00	450.719,82	420.781,32	446.565,29	420.781,29
C - Diversificazione dell'offerta di mobilità												
Totale	1.653.000,00	2.302.967,00	3	0	0	3	2.302.967,00	1.953.000,00	1.754.350,80	1.449.824,95	476.908,42	476.908,42
di cui Area interna Bassa Valle	1.653.000,00	2.302.967,00	3	0	0	3	2.302.967,00	1.953.000,00	1.754.350,80	1.449.824,95	476.908,42	476.908,42
D - Copertura digitale del territorio												
Totale	3.572.979,00	5.784.424,00	1	0	0	1	5.784.424,00	5.784.424,00	5.784.424,00	5.784.424,00	5.768.955,96	5.768.955,96
di cui Area interna Bassa Valle	3.572.979,00	1.822.078,24	1	0	0	1	1.822.078,24	1.822.078,24	1.822.078,24	1.822.078,24	1.822.078,24	1.822.078,24
E - Creazione e promozione dell'itinerario turistico "Bassa Via della Valle d'Aosta"												
Totale	4.090.000,00	3.311.304,19	37	0	19	18	5.301.568,51	3.311.304,19	3.311.304,19	3.311.304,19	2.861.304,19	2.861.304,19
di cui Area interna Bassa Valle	1.104.300,00	1.121.821,47	8	0	1	7	1.843.838,30	1.121.821,47	1.121.821,47	1.121.821,47	1.071.821,47	1.071.821,47
F - Sviluppo della filiera agroalimentare, integrata con il settore turistico												
Totale	1.700.000,00	816.354,53	16	0	6	10	816.354,53	816.354,53	816.354,53	816.354,53	816.354,53	816.354,53
di cui Area interna Bassa Valle	560.000,00	169.430,66	4	0	1	3	169.430,66	169.430,66	169.430,66	169.430,66	169.430,66	169.430,66
G - Rilancio della filiera bosco												
Totale	5.000.000,00	1.895.853,28	87	0	16	71	1.895.853,28	1.895.853,28	1.895.853,28	1.895.853,28	1.895.853,28	1.895.853,28
di cui Area interna Bassa Valle	1.560.000,00	1.038.313,28	39	0	4	35	1.038.313,28	1.038.313,28	1.038.313,28	1.038.313,28	1.038.313,28	1.038.313,28
H - Insediamento e nascita di nuove imprese												
Totale	2.503.600,00	5.560.179,05	24	0	0	24	6.930.787,59	5.560.179,05	5.560.179,05	5.560.179,05	3.993.964,20	3.993.964,20
di cui Area interna Bassa Valle	1.074.784,00	2.531.797,20	13	0	0	13	3.135.273,70	2.531.797,20	2.531.797,20	2.531.797,20	1.842.662,66	1.842.662,66
I – Formazione per la crescita*												
Totale	3.977.000,00	951.533,48	26	0	1	25	1.045.585,36	951.533,48	951.533,48	951.533,48	951.533,48	951.533,48
di cui Area interna Bassa Valle	130.000,00	128.592,86	11	0	1	10	137.244,05	128.592,86	128.592,86	128.592,86	128.592,86	128.592,86

L – Assistenza tecnica												
Totale	187.000,00	187.000,00	1	0	0	1	187.000,00	187.000,00	181.977,70	181.977,70	171.694,68	171.694,68
di cui Area interna Bassa Valle	187.000,00	187.000,00	1	0	0	1	187.000,00	187.000,00	181.977,70	181.977,70	171.694,68	171.694,68
Totale complessivo												
Totale	29.491.579,00	31.867.234,53	211	0	44	167	35.364.314,31	22.577.398,76	22.791.230,00	21.081.365,04	18.889.950,70	17.895.960,49
di cui Area interna Bassa Valle	15.403.063,00	19.669.650,65	87	0	7	80	21.006.827,96	10.911.391,61	10.593.646,12	9.415.357,89	7.984.915,17	7.522.501,69

* Azione portante non presente alla data di sottoscrizione dell'APQ Area interna Bassa Valle, ma inserita dopo la sostituzione (approvata dall'Agenzia per la coesione territoriale con nota prot. n. 8265 del 21 marzo 2023) degli interventi IS.1.1.4.1 "Studenti in movimento - Stage aziendali all'estero" e IS.1.1.4.2 "Studenti in movimento – Mobilità linguistica all'estero" con gli interventi SL.5.1 "Interventi per la formazione di giovani e adulti" e SL.5.2 "Interventi per la formazione continua interaziendale dei dipendenti e/o titolari delle micro, piccole, medie e grandi imprese".

Tabella 7: Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Bassa Valle" per i Settori di intervento degli Interventi relativi ai servizi essenziali, al 31.12.2025

Settore di intervento	Dotazione finanziaria iniziale APQ	Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2025	Numero Progetti				Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
			Presentati	In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Istruzione												
Totale	4.500.000,00	9.700.000,00	2	0	0	2	9.700.000,00	1.442.000,00	1.214.914,15	491.382,31	637.197,67	320.860,23
di cui Area interna Bassa Valle	4.500.000,00	9.700.000,00	2	0	0	2	9.700.000,00	1.442.000,00	1.214.914,15	491.382,31	637.197,67	320.860,23
Sanità												
Totale	458.000,00	488.000,00	2	0	0	2	488.000,00	458.000,00	450.719,82	420.781,32	446.565,29	420.781,29
di cui Area interna Bassa Valle	458.000,00	488.000,00	2	0	0	2	488.000,00	458.000,00	450.719,82	420.781,32	446.565,29	420.781,29
Mobilità												
Totale	1.653.000,00	2.302.967,00	3	0	0	3	2.302.967,00	1.953.000,00	1.754.350,80	1.449.824,95	476.908,42	476.908,42
di cui Area interna Bassa Valle	1.653.000,00	2.302.967,00	3	0	0	3	2.302.967,00	1.953.000,00	1.754.350,80	1.449.824,95	476.908,42	476.908,42
Assistenza tecnica												
Totale	187.000,00	187.000,00	1	0	0	1	187.000,00	187.000,00	181.977,70	181.977,70	171.694,68	171.694,68
di cui Area interna Bassa Valle	187.000,00	187.000,00	1	0	0	1	187.000,00	187.000,00	181.977,70	181.977,70	171.694,68	171.694,68
Totale complessivo												
Totale	6.798.000,00	12.677.967,00	8	0	0	8	12.677.967,00	4.040.000,00	3.601.962,47	2.543.966,28	1.732.366,06	1.390.244,62
di cui Area interna Bassa Valle	6.798.000,00	12.677.967,00	8	0	0	8	12.677.967,00	4.040.000,00	3.601.962,47	2.543.966,28	1.732.366,06	1.390.244,62

3.1 Stato di attuazione Interventi finanziati con risorse statali

3.1.1 Istruzione

➤ **Allestimento di laboratori tecnologici nel polo scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado, a Verrès (IS.1.2)**

Dotazione finanziaria da APQ: 200.000,00 euro a valere sulla l. 27 dicembre 2013, n.147 (l. stabilità 2014) art. 1, commi 13-17.

L'Intervento, avviato nel 2019 e conclusosi nel mese di ottobre 2020, era finalizzato al potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature tecnologico-informatiche della scuola per migliorare i processi di apprendimento nelle discipline tecnico-scientifiche e in matematica.

Nell'ambito dell'Intervento sono stati allestiti 2 laboratori informatici (dotati di videoproiettore, lavagna magnetica, casse audio, *notebook*, stampante laser, stampante 3D e scanner 3D, server per l'utilizzo in rete, oltre a vari accessori); 1 laboratorio di elettronica (composto da una dotazione di *notebook*, stampanti e accessori), 1 laboratorio mobile (dotato di *notebook*) e 42 aule attrezzate con le più moderne tecnologie multimediali (Wifi e fibra), videoproiettori laser a soffitto, lavagne magnetiche, casse audio, locali utilizzabili come aula, sala *meeting*, sala corsi, formazione e sala riunioni.

Le operazioni di installazione e collaudo del materiale sono terminate il 27 ottobre 2020, data che coincide con la data di conclusione dell'Intervento.

La realizzazione dei laboratori tecnologici informatici contribuisce alla modernizzazione e alla riqualificazione dei servizi essenziali dell'Area interna Bassa Valle in materia di istruzione e formazione ed è funzionale all'Intervento IS.1.3, descritto al punto successivo.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	200.000,00	200.000,00	199.995,69	199.995,69	197.684,86	197.684,86
di cui Area interna BV	200.000,00	200.000,00	199.995,69	199.995,69	197.684,86	197.684,86

➤ **Realizzazione di un convitto annesso al polo scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado, a Verrès (IS.1.3)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 1.242.000,00 euro a valere sulla l. 27 dicembre 2013, n.147 (l. stabilità 2014), art.1, commi 13-17 e 3.058.000,00 euro a valere sulle risorse finanziarie della Regione, per un totale di 4.300.000,00 euro. La dotazione finanziaria iniziale è stata integrata con risorse aggiuntive regionali in quattro momenti distinti:

- *nel 2018, per un importo pari a 200.000,00 euro, contestualmente all'approvazione dello studio di fattibilità;*
- *nel 2019, per un importo pari a 500.000,00 euro, contestualmente all'approvazione del concorso di progettazione, per la copertura del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza;*
- *nel 2023, per un importo pari a 1.116.849,34 euro;*

- nel 2025, per un importo pari a 3.383.150,66 euro, portando così la dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento a 9.500.000,00 euro.

L'Intervento è stato avviato nel 2019, con l'approvazione del protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori per la stesura del bando di concorso relativo alla progettazione e riguarda la ristrutturazione e il parziale rifacimento di un edificio industriale denominato "ex-cotonificio Brambilla", per la realizzazione di un convitto, posto su tre piani, annesso al polo scolastico di Verrès.

Nel mese di gennaio 2025 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori e, nel successivo mese di febbraio, si è svolta, presso il Foyer della Biblioteca regionale di Aosta, la mostra del concorso di progettazione dell'Intervento.

Nel mese di novembre 2025, la Scheda intervento è stata oggetto di una richiesta di modifica, dovuta alla necessità di incrementare, con risorse aggiuntive regionali, la dotazione finanziaria dell'Intervento, a causa dell'incremento dei prezzi dei materiali e di alcune modifiche progettuali, nonché della volontà del gruppo di progettazione di sviluppare l'opera seguendo criteri guida che mettono in luce il tema della sostenibilità e dell'innovazione energetica. Con la medesima richiesta sono stati modificati anche il cronoprogramma delle attività e il cronoprogramma finanziario e la data di fine intervento, che è stata posticipata al 16.10.2028.

Nello stesso mese di novembre, l'Autorità responsabile per le Aree interne, a seguito della pubblicazione della delibera CIPESS n. 31/2025, esaminata l'istanza e la documentazione trasmessa, ha approvato le modifiche proposte (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2).

Sempre nel mese di novembre 2025 è stato affidato il servizio di redazione del progetto operativo degli interventi di bonifica, che è stato consegnato dall'impresa incaricata nel successivo mese di dicembre. Il progetto è stato sottoposto all'approvazione degli enti competenti che, al 31.12.2025 non avevano ancora completato l'istruttoria. Gli interventi di tale progetto, non scorponabili fisicamente dall'intervento di realizzazione del convitto, dovranno essere recepiti nel progetto esecutivo, ciò che ha comportato la sospensione della redazione di quest'ultimo.

Le principali criticità riscontrate, oltre all'ulteriore incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, hanno riguardato la dilatazione dei tempi di progettazione, che ha comportato la necessità di richiedere una proroga della data di fine Intervento.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	9.500.000,00	1.242.000,00	1.014.918,46	291.386,62	439.512,81	123.175,37
di cui Area interna BV	9.500.000,00	1.242.000,00	1.014.918,46	291.386,62	439.512,81	123.175,37

3.1.2 Salute

➤ **Un territorio a tutta salute – Medicina d'iniziativa, IFeC e empowerment di comunità (SN.1)**

Dotazione finanziaria da APQ: 378.000,00 euro a valere sulla l. 27 dicembre 2013, n.147 (l. stabilità 2014) art. 1, commi 13-17.

L'Intervento è stato avviato nel mese di novembre 2018 e le attività previste, che si sono concluse nel mese di luglio 2025, prevedevano tre ambiti di azione:

- **l'implementazione del servizio IFeC** (Infermiera di Famiglia e di Comunità): il servizio è stato avviato a novembre del 2018 e le attività sono proseguite fino a febbraio 2020, quando le infermiere sono confluite nelle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, istituite a seguito dell'emergenza sanitaria per l'emergenza epidemiologica da covid-19;
- **un percorso formativo**, avviato nel corso del 2020 e proseguito fino al 2023, nell'ambito del quale è stato realizzato un laboratorio con gruppi di cammino su percorsi accessibili nel territorio dell'Intervento e alcuni laboratori legati all'orto e alla coltivazione, al fine di veicolare due messaggi importanti: la coltivazione di prodotti a km zero e lo svolgimento di attività all'aperto quale fonte di benessere interiore;
- **l'acquisto di due ambulanze**, da destinare alle associazioni di volontariato del soccorso presenti nel territorio di intervento, secondo un modello dell'emergenza regionale consolidato. Rispetto a questa linea di azione, a causa dell'aumento dei prezzi di mercato, l'AUSL della Valle d'Aosta ha provveduto all'acquisto di un mezzo nuovo e di un mezzo usato.

Nel mese di ottobre 2025, la Scheda intervento è stata oggetto di una richiesta di modifica, dovuta alla necessità di posticipare la data di conclusione dell'Intervento al 31.10.2025, a causa dei tempi di consegna delle due ambulanze acquistate, estremamente dilatati rispetto a quanto ipotizzato. Tale richiesta ha determinato la necessità di modificare il cronoprogramma delle attività e, conseguentemente, il cronoprogramma finanziario.

Le modifiche proposte non sono ancora state formalmente approvate dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2).

L'ultima ambulanza è stata consegnata nel mese di luglio 2025, data che coincide con la conclusione dell'Intervento. La variazione del totale della spesa deriva soprattutto dall'interruzione del servizio di IFeC e dalla variazione del costo delle due ambulanze acquistate.

Fatta eccezione per l'aumento dei costi delle ambulanze e il dilatarsi dei tempi di consegna, non sono state rilevate criticità amministrative specifiche.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	378.000,00	378.000,00	340.781,32	340.781,32	340.781,29	340.781,29
di cui Area interna BV	378.000,00	378.000,00	340.781,32	340.781,32	340.781,29	340.781,29

➤ **Supporto e potenziamento delle organizzazioni del terzo settore in ambito socio-sanitario e sociale (SN.2)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 80.000,00 euro a valere sulla l. 27 dicembre 2013, n. 147 (l. stabilità 2014), art.1, commi 13-17. La dotazione finanziaria iniziale è stata integrata con risorse aggiuntive delle 3 Unités des Communes valdôtaines dell'Area interna Bassa Valle in due momenti distinti:

- *nel 2022, per un importo pari a 15.000,00 euro;*
- *nel 2023, per un importo pari a ulteriori 15.000,00 euro.*

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento ammonta quindi a 110.000,00 euro.

L'Intervento, finalizzato a supportare le attività delle organizzazioni del terzo settore favorendo l'estensione e il miglioramento dei servizi in ambito socio-sanitario e sociale, nasce strutturato su tre attività:

- servizio di supporto tecnico-amministrativo;
- supporto alle organizzazioni dei volontari del soccorso;
- supporto alle attività di promozione e formazione.

Dal 2019, anno di avvio dell'Intervento, a ottobre del 2021, nell'ambito di tali attività, sono stati individuati i professionisti per il supporto amministrativo-fiscale, della trasparenza e dei progetti europei; sono stati organizzati dei corsi PTC (*Prehospital Trauma Care*) di base e pediatrico e BLSD (*Basic Life Support-early Defibrillation*) pediatrico, nonché dei corsi di formazione focalizzati, prevalentemente, sulla promozione e sugli strumenti di *marketing* per le associazioni di volontariato.

A seguito delle quattro modifiche apportate alla Scheda intervento, a partire dal 2021 (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2), sono state ripensate le azioni previste per il sostegno alle associazioni di volontariato e, in particolare, per quelle che si occupano di emergenza e di soccorso, al fine di contribuire all'efficientamento del modello di emergenza-urgenza sul territorio e valorizzare la sinergia tra gli enti locali, l'Azienda USL regionale e il volontariato. E' stato, quindi, deciso, una volta completate le attività di formazione già previste e assegnate, di impiegare i fondi restanti per l'acquisto di un'autoambulanza, di ecografi portatili e di eventuali accessori e materiali di consumo utili al suo funzionamento, grazie anche al contributo delle tre Unités des Communes valdôtaines, pari a 30.000,00 euro complessivi.

Nel mese di settembre 2024, l'ANPAS Valle d'Aosta ha proceduto ad affidare all'operatore economico aggiudicatario la fornitura dell'ambulanza oggetto della procedura di acquisto e con le economie di spesa venutesi a creare dal ribasso d'asta sono stati acquistati: un monitor a supporto dell'attività degli operatori sanitari da installare sull'ambulanza e un *autopulse* (rianimatore automatico in caso di arresto cardiaco).

L'ambulanza, il monitor e l'*autopulse* sono stati consegnati nel mese di dicembre 2024 e le relative fatture sono state liquidate, tutte le attività previste dall'Intervento risultano, quindi, realizzate.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	110.000,00	80.000,00	109.938,50	80.000,00	105.784,00	80.000,00
di cui Area interna BV	110.000,00	80.000,00	109.938,50	80.000,00	105.784,00	80.000,00

3.1.3 Mobilità

➤ Servizio di trasporto flessibile nell'Area interna Bassa Valle (MB.1)

Dotazione finanziaria da APQ: 290.967,00 euro a valere sulla l. 27 dicembre 2013, n. 147 (l. stabilità 2014), art.1, commi 13-17.

L'Intervento prevede un servizio di trasporto flessibile rivolto ai residenti e ai turisti affidato agli operatori di noleggio con conducente (NCC) operanti nell'Area e si articola in due parti:

- un servizio "*generalista-turistico*" (che si svolge solo nel periodo estivo, da giugno a ottobre), aperto a tutti, ma con una spiccata valenza turistica, per rendere raggiungibili le località della Bassa Valle depositarie di ricchezze paesaggistiche, storiche, artistiche e culturali.

Il servizio è stato avviato nel mese di giugno 2022 ed è proseguito anche nel corso del 2024 e del 2025 su due tratte: Cumarial - Lago Vargno e Verrès-Chevrère.

Sulla prima tratta è stata garantita l'operatività nei giorni di sabato e domenica nei mesi di giugno e settembre; nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nel mese di luglio e tutti i giorni nel mese di agosto. Nel 2025 sono stati effettuati 926 passaggi, registrando una diminuzione complessiva del servizio rispetto al 2024, quando i passaggi erano stati 1.105, ma è stata registrata una crescita nei mesi di giugno (quando i passaggi sono raddoppiati, passando da 46 a 93) e agosto (da 650 a 676 passaggi).

Sulla seconda tratta, operativa nei mesi di agosto e settembre, sono stati effettuati 356 passaggi, in crescita rispetto al 2024, quando i passaggi erano stati 207.

Il servizio oggetto dell'appalto triennale si è concluso nel mese di settembre 2025;

- un servizio "*sociale*" (che si svolge da settembre a giugno), rivolto in modo particolare agli studenti e alle studentesse, al fine di favorire la più agevole fruizione delle strutture per l'istruzione da parte della popolazione residente nelle valli laterali, contribuendo alle misure di contrasto alla dispersione scolastica.

Anche questo servizio è stato oggetto di un appalto triennale, che è stato avviato nel mese di settembre 2022 e si è concluso nel mese di giugno 2025. Nei tre anni è stato attivo su due tratte: Ayas-Aosta, che ha visto confermato il numero dei 22 iscritti dell'anno precedente e Gressoney-Aosta, dove gli iscritti sono risultati in crescita, arrivando ad un totale di 31 studenti e studentesse.

Le Unité des Communes valdôtaines della Bassa Valle hanno deciso di finanziare, con risorse proprie, il proseguimento del servizio anche per l'anno scolastico 2025/2026, con un'adesione pari a 52 studenti.

Nel mese di luglio 2025 la Scheda intervento è stata oggetto di una richiesta di modifica, che si è resa necessaria a seguito dell'affidamento del servizio di trasporto a un nuovo operatore

economico, che adottava un regime fiscale diverso rispetto a quello dell'impresa affidataria precedente. Tale richiesta ha determinato la necessità di rimodulare il "Cronoprogramma finanziario per anno".

Le modifiche proposte sono state trasmesse, per informativa, dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, al Tavolo dei sottoscrittori, nel mese di settembre 2025 e si, intendono, pertanto, approvate (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2).

Le attività previste dall'Intervento si sono concluse nel mese di settembre 2025.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	290.967,00	290.967,00	283.902,18	283.902,18	281.544,69	281.544,69
di cui Area interna BV	290.967,00	290.967,00	283.902,18	283.902,18	281.544,69	281.544,69

➤ **Pista ciclabile della Bassa Valle (MB.2)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 1.232.033,00 euro a valere sulla l. 27 dicembre 2013, n. 147 (l. stabilità 2014), art.1, commi 13-17. L'importo è stato incrementato di 50.000,00 euro, derivanti dalle risorse integrative previste dalla Delibera CIPESS n. 41/2022, e da risorse integrative regionali pari a 349.967,00 euro, portando il costo complessivo dell'Intervento a 1.632.000,00 euro.

L'Intervento, avviato nel 2018, prevede:

- il collegamento ciclabile di fondovalle dal Comune di Pont-Saint-Martin al Comune di Donnas, per una lunghezza di circa 4,5 km (6,1 km se si considera il tratto esistente);
- la realizzazione di percorsi secondari di raccordo a mete e servizi presenti all'interno di entrambi i Comuni per una lunghezza di circa 1,5 km;
- la realizzazione di una segnaletica sia orizzontale, sia verticale, univoca e riconoscibile, che consenta ai fruitori di identificare chiaramente il percorso.

Il percorso, pertanto, sarà destinato sia ai residenti, per gli spostamenti sistematici ed occasionali, sia ai turisti, per l'accesso a zone di pregio e ai servizi. L'Intervento si pone in sinergia con il più ampio progetto di pista ciclabile della Valle d'Aosta, di cui costituirà il tratto iniziale, e con le infrastrutture ciclabili previste nell'ambito del Progetto Bassa Via della Valle d'Aosta.

Nel mese di marzo 2025 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori e nel successivo mese di giugno è stato stipulato il relativo contratto con l'operatore economico affidatario.

Nel mese di settembre 2025 è stato affidato il servizio tecnico per il collaudo statico, cui sono seguite, nei mesi a seguire, due variazioni del cronoprogramma dei lavori.

La data di conclusione dell'Intervento è prevista al 31.7.2026.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	1.632.000,00	1.282.033,00	1.425.230,89	1.120.705,04	184.029,72	184.029,72
di cui Area interna BV	1.632.000,00	1.282.033,00	1.425.230,89	1.120.705,04	184.029,72	184.029,72

➤ **Ciclovía intercomunale della media Valle del Lys (MB.3)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 130.000,00,00 euro a valere sulla l. 27 dicembre 2013, n. 147 (l. stabilità 2014), art.1, commi 13-17. L'importo è stato incrementato di 250.000,00 euro, derivanti dalle risorse integrative previste dalla Delibera CIPESS n. 41/2022, portando il costo complessivo dell'Intervento a 380.000,00 euro.

L'Intervento, avviato nel 2020, prevede, tramite l'ampliamento e la sistemazione del sentiero esistente, il completamento del percorso della ciclovía tra i Comuni di Issime e Fontainemore, con un'estensione pari a circa 14 km.

Dato l'aumento considerevole dell'importo dei lavori, avvenuto nel 2024, rispetto a quanto inizialmente ipotizzato (il costo dell'Intervento è stato incrementato, per un importo pari a 185.000,00 euro, cfr. Capitolo 2) si è provveduto a conferire un nuovo incarico di progettazione a decorrere da gennaio 2025 e ad avviare le procedure di esproprio, ove necessario.

Nel mese di giugno 2025 è stato consegnato il Progetto di fattibilità tecnico economica, rispetto al quale sono state richieste alcune integrazioni da parte delle Strutture regionali competenti. Tali integrazioni sono state sviluppate e trasmesse dai progettisti; si è in attesa di ricevere i pareri delle suddette Strutture, al fine di procedere all'approvazione della progettazione.

La conclusione dell'Intervento è prevista al 31.12.2027.

In relazione a quanto sopra esposto, si riporta di seguito l'avanzamento finanziario al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	380.000,00	380.000,00	45.217,73	45.217,73	11.334,01	11.334,01
di cui Area interna BV	380.000,00	380.000,00	45.217,73	45.217,73	11.334,01	11.334,01

3.1.4 Associazionismo e assistenza tecnica

➤ **Supporto alla progettazione, gestione, monitoraggio e controllo della Strategia dell'Area interna Bassa Valle (AT.1)**

Dotazione finanziaria da APQ: 187.000,00 euro a valere sulla l. 27 dicembre 2013, n. 147 (l. stabilità 2014), art.1, commi 13-17.

L'Intervento è stato avviato ancor prima della stipula dell'APQ, nel mese di maggio 2015 e le attività, proseguite regolarmente nel corso degli anni successivi, sono state svolte dal personale

interno all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, con il supporto dell'Assistenza tecnica fornita da consulenti esterni.

Le attività svolte nel corso dell'anno 2025 hanno riguardato, in modo particolare, il coordinamento sull'attuazione della Strategia, la rendicontazione delle spese e la promozione/comunicazione degli Interventi realizzati, o in corso di realizzazione.

Attività di coordinamento e rendicontazione

Nell'ambito delle attività di coordinamento sull'attuazione della Strategia sono state esaminate e condivise, con l'Assistenza tecnica, tutte le modifiche apportate agli Interventi e, in modo particolare, è stato fornito il supporto alla predisposizione delle modifiche dell'Intervento "Servizio di trasporto flessibile nell'area interna Bassa Valle" (MB.1), alla stesura della relazione finale e alla rendicontazione delle spese relative all'Intervento "Supporto e potenziamento delle organizzazioni del terzo settore" (SN.2).

E' stato, inoltre, fornito supporto ai referenti degli Interventi ai fini della redazione delle Relazioni annuali di attuazione al 2024, con riferimento all'avanzamento finanziario e all'aggiornamento del cronoprogramma delle attività e, a seguire, sono state esaminate le relazioni prodotte, anche al fine di monitorare le attività svolte ed è stata predisposta la relazione per il Comitato di pilotaggio che si è tenuto l'11 dicembre 2025.

In relazione alle ore rendicontate sul programma SISPREG2014, si evidenzia che il numero complessivo di ore effettivamente svolte dal personale dell'Unité è di gran lunga superiore; tuttavia, il monte ore effettivo non ha potuto essere interamente rendicontato a causa dell'insufficienza dei fondi SNAI per l'esercizio 2025. Si precisa che le attività dell'Intervento sono state portate avanti ugualmente con fondi dell'Unité.

Promozione e Comunicazione

L'Unité Mont-Rose ha promosso e veicolato informazioni utili agli Enti dell'Area interna attraverso l'aggiornamento puntuale e continuo della sezione del sito istituzionale, con i rimandi ai fondi disponibili per il finanziamento di iniziative varie e eterogenee; la puntuale segnalazione in merito alle possibili fonti di finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo del territorio; la diffusione, attraverso il proprio sito istituzionale, di *news* su eventi e iniziative inerenti all'Area interna Bassa Valle o in favore dei Comuni dei comprensori delle 3 Unités.

Attività di monitoraggio

Trasversale e funzionale a tutta l'attività di assistenza tecnica è stato, infine, come avvenuto per le annualità precedenti, l'aggiornamento costante, condotto mediante il confronto tra l'Assistenza tecnica e il Dipartimento politiche strutturali e affari europei della Regione, della matrice di monitoraggio finalizzata a restituire un quadro complessivo dell'avanzamento delle azioni dal punto di vista finanziario, delle attività realizzate e in programma e delle eventuali criticità emerse.

La Scheda intervento è stata oggetto di una richiesta di modifica nel mese di ottobre 2025, in quanto si è reso necessario rimodulare il cronoprogramma finanziario, a seguito della ripartizione dell'onorario ancora spettante alla RTI affidataria del servizio di assistenza tecnica.

La data di conclusione dell'Intervento, inoltre, è stata prorogata al 31.12.2029.

Le modifiche sono ancora in attesa di essere approvate dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud.

L'attività di Assistenza tecnica è stata svolta regolarmente e non sono state segnalate particolari criticità, oltre a quelle già riportate nelle relazioni precedenti, legate principalmente al protrarsi di alcuni Interventi oltre la data di conclusione inizialmente prevista.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	187.000,00	187.000,00	181.977,70	181.977,70	171.694,68	171.694,68
di cui Area interna BV	187.000,00	187.000,00	181.977,70	181.977,70	171.694,68	171.694,68

3.1.5 Interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi

➤ Quassod (BV01)

Dotazione finanziaria: 200.000,00 euro ex art. 4, comma 2, d.l. 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2021, n. 155.

L'Intervento è stato avviato nel 2022 e prevede la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale della pista forestale con funzione antincendio boschivo, in località Quassod, nel Comune di Verrès.

Nel mese di febbraio 2025 l'archeologo incaricato del servizio ha consegnato la documentazione fotografica delle strutture esistenti.

Nel mese di marzo 2025, la Scheda intervento è stata oggetto di una richiesta di modifica, che ha riguardato la rimodulazione del cronoprogramma delle attività e del cronoprogramma finanziario, a seguito del dilatarsi dei tempi di progettazione, oltreché la modifica delle tipologie di spesa. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, nel mese di novembre 2025, ha avviato una procedura di consultazione in forma scritta indirizzata ai Soggetti istituzionali interessati. La conclusione con esito favorevole della procedura e l'approvazione delle modifiche, non essendo pervenute osservazioni in merito, sono state comunicate solo nel mese di febbraio 2026 (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2). Le modifiche si intendono, pertanto, approvate in tale data.

Nel corso del 2025 sono stati realizzati parte dei lavori previsti, che hanno subito una sospensione nel mese di giugno, in quanto è intervenuta una variante in corso d'opera, la quale necessita di una perizia e di specifiche autorizzazioni. Il termine per la conclusione dei lavori è previsto al 30.06.2027, mentre la conclusione delle operazioni di collaudo e, quindi, dell'Intervento è prevista al 31.12.2027. Sarà predisposta apposita richiesta di variazione della Scheda intervento, per

apportare le modifiche necessarie al cronoprogramma delle attività e, conseguentemente, al cronoprogramma finanziario.

Nel corso del 2025 non sono state segnalate particolari criticità a eccezione dello scostamento dei tempi di espletamento delle singole attività rispetto alle previsioni iniziali, già comunicate con la precedente relazione, al quale si è aggiunta la richiesta di una variante tecnica non suppletiva che, necessitando di apposite autorizzazioni, ha ulteriormente dilatato il termine di conclusione dei lavori.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	200.000,00	200.000,00	4.373,60	4.373,60	4.373,60	4.373,60
di cui Area interna BV	200.000,00	200.000,00	4.373,60	4.373,60	4.373,60	4.373,60

➤ **Vers-Fey (BV02)**

Dotazione finanziaria: 30.556,00 euro ex art. 4, comma 2, d.l. 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2021, n. 155 e 139.444,00 euro a valere sulle risorse finanziarie della Regione, per un totale di 170.000,00 euro.

L'Intervento prevede la realizzazione di una condotta idrica di carico e la realizzazione di una vasca di accumulo ai fini antincendio nella frazione di Vers-Fey, nei Comuni di Lillianes e Perloz.

L'Intervento è stato avviato nel 2018 sulla base della progettazione già in possesso dell'Amministrazione regionale.

Nel mese di marzo 2025, la Scheda intervento è stata oggetto di una richiesta di modifica, che ha riguardato la rimodulazione del cronoprogramma delle attività e del cronoprogramma finanziario, a seguito del dilatarsi dei tempi di progettazione, oltreché la modifica delle tipologie di spesa. L'importo è stato incrementato di 240.000,00 euro, derivanti da risorse regionali, portando il costo complessivo dell'Intervento a 410.000,00 euro. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, nel mese di novembre 2025, ha avviato una procedura di consultazione in forma scritta indirizzata ai Soggetti istituzionali interessati. La conclusione con esito favorevole della procedura e l'approvazione delle modifiche, non essendo pervenute osservazioni in merito, sono state comunicate solo nel mese di febbraio 2026 (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2). Le modifiche si intendono, pertanto, approvate in tale data.

Nel mese di novembre 2025 è stato rilasciato il permesso di costruire dall'Amministrazione Comunale di Perloz ed è stata validata la progettazione di fattibilità tecnico-economica, successivamente approvata dalla Giunta regionale nello stesso mese.

Il dilatarsi dei tempi di progettazione rispetto alle tempistiche inizialmente ipotizzate ha fatto sì che si allungassero i tempi inseriti nel cronoprogramma delle attività della Scheda intervento

approvata: il termine per la conclusione dei lavori è previsto al 31.03.2027, mentre la conclusione delle operazioni di collaudo e, quindi, dell'Intervento è prevista al 31.12.2027.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	170.000,00	30.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Area interna BV	170.000,00	30.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00

➤ **Tetas-Nova Superiore (BV03)**

Dotazione finanziaria: 775.000,00 euro ex art. 4, comma 2, d.l. 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2021, n. 155.

L'Intervento – che prevede la realizzazione di una pista forestale con funzione antincendio boschivo di collegamento tra le località Tetas e Nova Superiore, nel Comune di Fontainemore – è stato avviato nel 2023.

Nel mese di marzo 2025, la Scheda intervento è stata oggetto di una richiesta di modifica, resasi necessaria a seguito del dilatarsi dei tempi di progettazione, in ragione della complessità dell'Intervento da realizzare, essendo situato in una zona geologicamente non stabile. Le modifiche proposte hanno riguardato la rimodulazione del cronoprogramma delle attività e del cronoprogramma finanziario, oltreché la modifica delle tipologie di spesa. L'importo è stato, inoltre, incrementato di 325.000,00 euro, derivanti da risorse regionali, portando il costo complessivo dell'Intervento a 1.100.000,00 euro. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, nel mese di novembre 2025, ha avviato una procedura di consultazione in forma scritta indirizzata ai Soggetti istituzionali interessati. La conclusione con esito favorevole della procedura e l'approvazione delle modifiche, non essendo pervenute osservazioni in merito, sono state comunicate solo nel mese di febbraio 2026 (per maggiori dettagli cfr. Capitolo 2). Le modifiche si intendono, pertanto, approvate in tale data.

Nel mese di dicembre 2024 è stata consegnata al Beneficiario la progettazione di fattibilità tecnico-economica per il quale sono state richieste integrazioni e modifiche al professionista incaricato.

Durante l'iter autorizzativo sono emerse molteplici incognite sull'inserimento dell'opera all'interno del contesto naturale, in quanto dalle risultanze della relazione geologica e geotecnica è emersa la necessità imprescindibile di procedere alla realizzazione di una campagna geognostica completa del tracciato, nonché di un sistema di monitoraggio topografico e strumentale del versante oggetto dell'Intervento, poiché dai dati raccolti emerge che il versante è soggetto ad un costante, lento, movimento franoso. Il monitoraggio dello stato del versante non garantisce, d'altronde, la fattibilità dell'opera secondo i criteri e la prassi della perfetta esecuzione a regola d'arte, data l'assoluta incertezza del risultato dei dati geologici.

Sono attualmente in corso le valutazioni del caso da parte delle Strutture regionali competenti per materia, circa la possibilità di portare a termine l'Intervento.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Area interna BV	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Stato di attuazione Interventi su altri fondi

Si premette che tra gli Interventi inclusi nell'APQ "Area interna Bassa Valle", finanziati dai Programmi FESR, POC, FSE e FEASR, alcuni sono intesi come "Scheda Azione" (dalla quale derivano i singoli Progetti, selezionati tramite un avviso a evidenza pubblica), mentre altri sono "Progetti ad individuazione diretta", già definiti nei relativi Programmi. Pertanto, per quanto concerne le Schede azione, si precisa che nelle tabelle concernenti l'avanzamento fisico e finanziario riportati nei seguenti paragrafi, i dati relativi al Finanziamento e al Costo ammesso sono riferiti alle sole risorse dei progetti finora approvati e non alla dotazione finanziaria (iniziale o al 31.12.2025) da APQ.

3.2.1 FESR

➤ **Bassa Via della Valle d'Aosta – Sentieristica (SL.1.1)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 400.950,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 1.485.000,00 euro, riferito all'intero Intervento insistente anche su altri comuni esterni all'Area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle e il costo dell'Intervento a livello regionale sono stati allineati all'importo del relativo costo ammesso (pari, rispettivamente, a 623.748,78 euro e 1.360.574,91 euro).

L'Intervento è stato avviato all'inizio del 2017 e riguardava l'infrastrutturazione integrata della rete sentieristica locale e il miglioramento del collegamento tra i punti di interesse dislocati lungo l'itinerario Bassa Via della Valle d'Aosta. Le attività previste si sono concluse nel mese di ottobre 2024.

Ad oggi il tracciato dell'itinerario della Bassa Via/Cammino Balteo, con una lunghezza complessiva di 356,07 km, suddiviso in 23 tappe, è completamente percorribile e interamente segnalato.

Per gli interventi affidati alle squadre forestali, che sono intervenute su tutte le tappe dell'itinerario con l'esecuzione di lavori, principalmente, di segnaletica (sia orizzontale, sia verticale) e con piccole sistemazioni, le spese connesse hanno trovato copertura su fondi regionali.

Per quanto concerne la segnaletica, si dà evidenza che sono state realizzate e collocate sui cartelli lungo il percorso le alette con il marchio del "Cammino Balteo", nell'ambito dell'Intervento "Bassa Via della Valle d'Aosta – Promozione (SL.1.2)".

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Intervento:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	1.485.000,00	1.360.574,91	1.360.574,91	1.360.574,91	1.360.574,91	1.360.574,91
di cui Area interna BV	648.614,00	623.748,78	623.748,78	623.748,78	623.748,78	623.748,78

➤ **Bassa Via della Valle d'Aosta – Promozione (SL.1.2)**

Dotazione finanziaria da APQ: 85.050,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 315.000,00 euro, riferito all'intero Intervento insistente anche su altri comuni esterni all'Area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR).

L'Intervento riguardava la definizione e l'attuazione di strategie di marketing, comunicazione e promozione del prodotto turistico Bassa Via della Valle d'Aosta, al fine di incrementare l'offerta turistica regionale.

Tutte le attività previste dalla Scheda intervento (produzione di materiali promozionali cartacei e *online*, siti *web*, canali *social*, campagne pubblicitarie, ecc.) sono state realizzate e si sono concluse in data 30 novembre 2021, ma sono stati mantenuti online il sito internet dedicato (link); la pagina del sito della Regione autonoma Valle d'Aosta (link); le pagine *social* di Facebook (link) e Instagram (link).

Lungo la rete sentieristica sono stati realizzati dei pannelli turistici (dimensione 100X150), quali elemento di arredo urbano e di informazione, collocati all'ingresso dei borghi di Nus, Saint-Marcel, Châtillon, Saint-Vincent, Donnas e Verrès, allo scopo di permettere ai camminatori di ritrovare il sentiero all'uscita dei centri abitati, nonché di segnalare le cose da vedere.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Intervento:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
di cui Area interna BV	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00

➤ **Bassa Via della Valle d'Aosta - Tecnologie e servizi innovativi (SL.1.3).**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 78.300,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 290.000,00 euro, riferito all'intero Intervento insistente anche su altri comuni esterni all'Area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle e il costo dell'Intervento a livello regionale sono stati allineati all'importo del relativo costo ammesso (pari, rispettivamente, a 31.525,47 euro e 116.761,00 euro).

L'Intervento, avviato nel 2016, prevedeva la predisposizione di un portale plurilingue dedicato all'itinerario escursionistico "Cammino balteo", che attraversa il territorio di 48 Comuni valdostani, e di un *application web*, che consentisse la creazione e la fruizione di un itinerario da parte degli utenti.

Le attività previste si sono concluse al 31.12.2020, attraverso la realizzazione di un sito internet dedicato (<https://balteus.lovevda.it/>), disponibile in tre versioni: italiano, francese e inglese. Il sito è ottimizzato per i dispositivi mobili e costituisce il canale principale per veicolare le informazioni sui punti di interesse e i servizi presenti sul territorio del Cammino Balteo e nelle zone adiacenti. Nella sezione tappe è possibile visualizzare le schede delle 23 tappe dell'itinerario e attraverso la mappa del tracciato complessivo, presente in *homepage*, è possibile selezionare i punti di interesse.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Intervento:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	136.146,48	116.761,00	116.761,00	116.761,00	116.761,00	116.761,00
di cui Area interna BV	36.759,55	31.525,47	31.525,47	31.525,47	31.525,47	31.525,47

➤ **Bassa Via della Valle d'Aosta – Banca Dati (SL.1.3 bis).**

Dotazione finanziaria iniziale dell'Intervento (non presente nell'APQ): 83.315,34 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 308.575,32 euro, riferito all'intero Intervento insistente anche su altri comuni esterni all'Area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle e il costo dell'Intervento a livello regionale sono stati allineati all'importo del relativo costo ammesso (pari, rispettivamente, a 81.497,22 euro e 301.841,56 euro).

L'Intervento (non presente nell'APQ perché inserito successivamente) è nato a seguito della rimodulazione dell'Intervento "Bassa Via della Valle d'Aosta – Tecnologie e servizi innovativi (SL.1.3)", da cui ha ereditato le economie derivanti dallo stralcio delle attività non effettuate (pari a 153.853,52 euro). Tali economie sono state integrate con uno stanziamento aggiuntivo di 154.721,80 euro, portando l'Intervento a una dotazione finanziaria complessiva di 308.575,32 euro.

L'Intervento, avviato nel 2019, prevedeva l'attività di sviluppo, recupero dati e collaudo per la realizzazione della nuova banca dati delle informazioni turistiche a supporto di tutti gli strumenti digitali di promozione ed informazione, si è concluso nel mese di aprile 2023, quando la banca dati è entrata concretamente in esercizio consentendo l'abilitazione degli operatori al nuovo sistema.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Intervento:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	308.575,32	301.841,56	301.841,56	301.841,56	301.841,56	301.841,56
di cui Area interna BV	83.315,34	81.497,22	81.497,22	81.497,22	81.497,22	81.497,22

➤ **Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da inserire in Valle d'Aosta – Rafforzamento servizi offerti presso gli incubatori di impresa (SL.4.1)**

Dotazione finanziaria da APQ: 740.784,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 1.683.600,00 euro, riferito all'intero Intervento insistente anche su altri comuni esterni all'Area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle e il costo dell'Intervento a livello regionale sono stati allineati all'importo del relativo costo ammesso (pari, rispettivamente, a 218.334,82 euro e 496.215,49 euro).

L'Intervento – avviato nel mese di aprile 2017 e conclusosi il 7 agosto 2020 – prevedeva l'affidamento, a un soggetto esperto, del servizio di accompagnamento alle imprese e di animazione degli incubatori di imprese, con le connesse attività di *scouting*, selezione, tutoraggio, consulenza e informazione.

Dall'avvio del servizio, negli incubatori di imprese denominate "*Pépinières d'Entreprises Espace Aosta*" e "*Pépinières d'Entreprises di Pont-Saint-Martin*", si sono insediate 18 nuove *startup*, di cui 10 nella Pépinière di Aosta e 8 nella Pépinière di Pont-Saint-Martin.

Nel rispetto delle politiche europee in materia di sviluppo sostenibile, le imprese insediate operano negli ambiti tecnologici previsti dalla Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Valle d'Aosta per il periodo 2014/20. Inoltre, nell'ottica della specializzazione produttiva, agli incubatori di imprese sono attribuite finalità vocazionali: l'ambito tecnologico delle imprese incubate nella Pépinière d'Entreprises Espace Aosta è la "*Montagna sostenibile*", mentre quello delle imprese incubate nella Pépinière d'Entreprises di Pont-Saint-Martin è la "*Montagna di eccellenza*".

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Intervento:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	1.683.600,00	496.215,49	496.215,49	496.215,49	496.215,49	496.215,49
di cui Area interna BV	740.784,00	218.334,82	218.334,82	218.334,82	218.334,82	218.334,82

➤ **Supporto allo sviluppo delle imprese insediate o da insediare in Valle d'Aosta – Locazione spazi ed erogazione servizi di base (SL.4.2)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 264.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 600.000,00 euro, riferito all'intero Intervento insistente anche su altri comuni esterni all'Area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle è stata allineata all'importo del costo ammesso dei 10 progetti conclusi (pari a 333.213,24 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 21 progetti conclusi (pari a 486.123,56 euro).

L'Intervento, avviato nel 2016, prevedeva l'erogazione di contributi alle imprese incubate presso le Pépinière d'entreprises di Aosta e Pont-Saint-Martin, di proprietà di Vallée d'Aoste Structure s.r.l., a parziale copertura del canone di locazione da esse sostenuto per la fruizione dei servizi logistici di base messi a disposizione alle imprese.

Dal mese di giugno 2016 al 31.12.2023, data in cui si è concluso l'Intervento, si sono insediate, nelle Pépinière d'entreprises, 24 imprese, di cui 12 all'interno della Pépinière di Pont-Saint-Martin (Area interna Bassa Valle).

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione precisando che il numero dei Progetti è inferiore al numero delle imprese effettivamente insediate nelle

Pépinières d'entreprises, in quanto si tiene conto solo dei Progetti certificati a valere sul Programma FESR 2014/20:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	21	0	0	21	669.347,59	486.123,56	486.123,56	486.123,56	486.123,56	486.123,56
AI BV	10	0	0	10	414.240,56	333.213,24	333.213,24	333.213,24	333.213,24	333.213,24

3.2.2 POC

➤ **Bassa Via della Valle d'Aosta – Sostegno ai servizi turistici (SL.1.4).**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 540.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 2.000.000,00 euro, riferito all'intero Intervento insistente anche su altri comuni esterni all'Area interna), a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR), poi ricondotto al Programma Operativo Complementare (POC) 2014/20. La dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle è stata allineata all'importo del costo ammesso al 31.12.2025 dei 3 progetti conclusi (pari a 300.000,00 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso al 31.12.2025 dei 14 progetti approvati/conclusi (pari a 1.217.126,72 euro).

L'Intervento, avviato a giugno del 2018, era volto a stimolare, mediante la concessione di contributi in conto capitale in regime "de minimis", la nascita di nuove attività economiche, in particolare nei tratti meno presidiati dell'itinerario turistico "Cammino Balteo", nonché l'ampliamento e la diversificazione in chiave turistica delle attività svolte dalle PMI già operanti nei territori interessati.

A seguito dei due Avvisi pubblicati, nel 2018 e nel 2019, sono stati ammessi a finanziamento 16 progetti (3 nel 2018 e 13 nel 2019).

Al 31 dicembre 2025, due progetti su sedici, sono stati revocati per rinuncia da parte dei richiedenti. Tutti gli altri sono stati conclusi ed è stata presentata la richiesta di rendicontazione entro la data del 30 novembre 2025; è in corso l'istruttoria sulla documentazione rendicontata per l'erogazione del contributo a saldo.

Non sono state segnalate criticità particolari, oltre a quelle già comunicate con le relazioni precedenti.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Azione al 31.12.2025:

	Numero Progetti*				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	33	0	19	14	3.056.846,71	1.217.126,72	1.217.126,72	1.217.126,72	767.126,72	767.126,72
AI BV	4	0	1	3	990.099,41	300.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00

➤ **Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da inserire in Valle d'Aosta – Rafforzamento servizi offerti presso l'incubatore d'impresa e creazione di un acceleratore d'impresa (SL.4.1 bis)**

Dotazione finanziaria dell'Intervento (non presente nell'APQ): 1.917.449,60 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 4.357.840,00 euro, riferito all'intero Intervento insistente anche su altri comuni esterni all'Area interna), a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) 2014/20.

L'Intervento, avviato nel mese di giugno 2021, prevede la gestione di un incubatore di imprese, denominato *StartAlp*, e di un acceleratore di imprese, denominato *ScaleAlp*, con le connesse attività di promozione, *scouting* e selezione dei soggetti da insediare, fornitura di servizi logistici, tutoraggio, consulenza, informazione, formazione, comunicazione, *business development* e *pitch coaching* a favore dei soggetti insediati, o che possono insediarsi, nell'incubatore/acceleratore. Prevede, inoltre, l'allestimento, nell'acceleratore, di un laboratorio di prototipazione e la predisposizione, all'interno dell'incubatore, di uno spazio di *co-working*.

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- popolazione dell'incubatore e dell'acceleratore con imprese rispondenti alle finalità vocazionali della *Smart Specialisation Strategy* della Valle d'Aosta;
- creazione, all'interno dell'incubatore e dell'acceleratore di imprese, di un clima favorevole allo sviluppo delle imprese insediate;
- sviluppo di una fattiva collaborazione con l'Ente committente e le sue società controllate per contribuire allo sviluppo economico della Valle d'Aosta.

Da giugno 2021 al 31 dicembre 2025, sono state realizzate le seguenti attività:

- 13 *Call* per la selezione di *startup* innovative presso gli incubatori;
- 106 eventi divulgativi presso la Pépinière di Aosta;
- servizi di assistenza e tutoraggio alle imprese su base mensile presso le sedi delle *startup*;
- azioni di promozione e valorizzazione delle imprese e degli incubatori;
- fornitura di servizi informativi on-line, con l'invio ogni mese di una newsletter e la diffusione di notizie attraverso altri canali quali *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* e *Linkedin*;
- attività di *scouting* e animazione territoriale, al fine di favorire la creazione di nuovi rapporti con gli *stakeholder* territoriali e di altre regioni;
- assistenza alle imprese nella fase di uscita dagli incubatori.

Dall'avvio del servizio si sono insediate 20 nuove *startup*, di cui 13 nella Pépinière di Aosta e 7 nella Pépinière di Pont-Saint-Martin.

L'Intervento è stato inserito nel Programma Operativo Complementare (POC) 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta. Il POC 2014/20 è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1299 in data 28 ottobre 2024 e, successivamente, con deliberazione del CIPESS n. 3 in data 30 gennaio 2025.

Durante l'esecuzione del servizio non sono state riscontrate particolari criticità. La data di conclusione dell'Intervento è prevista al 30.11.2026.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	4.357.840,00	4.357.840,00	4.357.840,00	4.357.840,00	2.791.625,15	2.791.625,15
di cui Area interna BV	1.917.449,60	1.917.449,60	1.917.449,60	1.917.449,60	1.228.315,07	1.228.315,07

3.2.3 FSE

➤ **La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – Accademia e bottega (IS.1.1.1)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 350.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 450.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE). La dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle e a scala regionale è stata azzerata, poiché a seguito della pubblicazione del bando non sono state presentate proposte.

A febbraio 2022, la Struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'Intervento ha approvato l'Avviso pubblico "Accademia e bottega" per la presentazione delle proposte progettuali. L'avviso era volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, attraverso la promozione della scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo. Alla scadenza dell'Avviso, nonostante il notevole sforzo amministrativo, volto ad adeguare l'Intervento ai fabbisogni delle Istituzioni scolastiche potenzialmente interessate, non è stata presentata alcuna proposta progettuale.

L'Intervento risulta, pertanto, non attuato.

➤ **La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – "Alternanza scuola-lavoro" e "Imprenditorialità giovanile" (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO) (IS.1.1.2)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 156.500,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 830.400,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle è pari a 161.290,67 euro (importo frutto della somma del costo ammesso dei 2 progetti FSE conclusi, pari a 40.998,63 euro, e delle risorse regionali previste dalla l.r. n. 4/2018, pari a 120.292,04 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è pari a 816.967,71 euro (importo frutto della somma del costo ammesso dei 6 progetti FSE conclusi, pari a 165.098,94 euro, e delle risorse regionali previste dalla l.r. n. 4/2018, pari a 651.868,77 euro).

Le attività degli Interventi "Alternanza scuola-lavoro (IS.1.1.2)" e "Imprenditorialità giovanile (IS.1.1.3)" sono iniziate nel corso dell'anno scolastico 2017/18 (come previsto dalle relative Schede intervento allegate all'APQ) con la prima sessione di presentazione dei progetti – a valere sull'Avviso a scala regionale del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20

(FSE) – che ha visto, limitatamente all'Area interna Bassa Valle, l'approvazione di 2 Progetti riconducibili all'Intervento IS.1.1.2 e un Progetto riconducibile all'Intervento IS.1.1.3.

Le successive sessioni di presentazione dei progetti, previste per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, non sono, invece, state avviate con le modalità e le risorse individuate dall'APQ, poiché i percorsi di "Alternanza scuola-lavoro" e di "Imprenditorialità giovanile"⁷ – entrate a far parte del curriculum dello studente⁸ ai sensi della legge 13 luglio 2005, n. 107 – sono state finanziate con fondi regionali, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 29 marzo 2018, n. 4⁹.

Nonostante l'utilizzo di una fonte finanziaria diversa rispetto a quella prevista dall'APQ, gli Interventi IS.1.1.2 e IS.1.1.3 sono stati attuati perseguendo le stesse finalità inizialmente previste, con la sola differenza che i fondi regionali, essendo stati erogati cumulativamente per i due Interventi, non consentono di dar conto dell'avanzamento finanziario per singolo Intervento.

Per quanto concerne l'Area interna Bassa Valle, l'ISILTP di Verrès, sulla base delle esigenze formative rilevate, ha destinato l'intero importo erogato dalla Regione allo svolgimento di attività di "Alternanza scuola-lavoro".

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti*				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	7	0	1	6	852.681,86	165.098,94	816.967,71	165.098,94	816.967,71	165.098,94
Al BV	2	0	0	2	164.313,73	40.998,63	161.290,67	40.998,63	161.290,67	40.998,63

* Il numero dei progetti è riferito esclusivamente alle attività finanziate dal Programma FSE, poiché non è possibile quantificare il numero di progetti per le attività di "Alternanza scuola-lavoro" finanziate con risorse regionali.

➤ **La scuola come impresa formativa e come agente del contesto sociale e produttivo – Imprenditorialità giovanile (IS.1.1.3)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 96.500,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 569.600,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle è stata allineata all'importo del costo ammesso dell'unico Progetto concluso (pari a 18.359,27 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 4 progetti conclusi (pari a 52.651,29 euro).

Le attività degli Interventi "Alternanza scuola-lavoro (IS.1.1.2)" e "Imprenditorialità giovanile (IS.1.1.3)", iniziate nel corso dell'anno scolastico 2017/18 (come previsto dalle relative Schede intervento allegate all'APQ) con la prima sessione di presentazione dei progetti – a valere

7 Tali percorsi sono stati rinominati "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", ai sensi dell'art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8 Ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

9 La l.r. n. 4/2018 ha, tra l'altro, modificato la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 recante "Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta".

sull'Avviso a scala regionale del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE) – ha visto, limitatamente all'Area interna Bassa Valle, l'approvazione di 2 Progetti riconducibili all'Intervento IS.1.1.2 e un Progetto riconducibile all'Intervento IS.1.1.3.

Le successive sessioni di presentazione dei progetti, previste per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, non sono, invece, state avviate con le modalità e le risorse individuate dall'APQ, poiché i percorsi di "Alternanza scuola-lavoro" e di "Imprenditorialità giovanile"¹⁰ – entrate a far parte del curriculum dello studente¹¹ ai sensi della legge 13 luglio 2005, n. 107 – sono state finanziate con fondi regionali, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 29 marzo 2018, n. 4¹².

Nonostante l'utilizzo di una fonte finanziaria diversa rispetto a quella prevista dall'APQ, gli Interventi IS.1.1.2 e IS.1.1.3 sono stati attuati perseguendo le stesse finalità inizialmente previste, con la sola differenza che i fondi regionali, essendo stati erogati cumulativamente, non consentono di dar conto dell'avanzamento finanziario per singolo Intervento.

Per quanto concerne l'Area interna Bassa Valle, considerato che l'ISILTP di Verrès, sulla base delle esigenze formative rilevate, ha destinato l'intero importo erogato dalla Regione allo svolgimento di attività di "Alternanza scuola-lavoro", i dati riportati nella tabella sottostante sono riferiti esclusivamente alle attività finanziate a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE).

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	5	0	1	4	59.092,18	52.651,29	52.651,29	52.651,29	52.651,29	52.651,29
Al BV	1	0	0	1	18.369,00	18.359,27	18.359,27	18.359,27	18.359,27	18.359,27

➤ **Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa (SL.4.3)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 70.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 220.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle è stata allineata all'importo del costo ammesso dell'unico Progetto concluso (pari a 62.799,54 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è rimasto invariato.

L'Intervento era finalizzato a finanziare iniziative di animazione territoriale per la diffusione della cultura di impresa quali: sensibilizzare i giovani alle tematiche relative alla cultura d'impresa;

10 Tali percorsi sono stati rinominati "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", ai sensi dell'art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

11 Ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

12 La l.r. n. 4/2018 ha, tra l'altro, modificato la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 recante "Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta".

favorire lo sviluppo delle idee di impresa e la loro trasformazione in progetti imprenditoriali; offrire alle *startup* l'opportunità di confrontarsi con persone già coinvolte nel mondo produttivo.

L'Intervento è stato avviato nel mese di gennaio 2016, con l'approvazione della Scheda Azione "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa (OCC.10205.16AG.0)", dalla quale è derivato un unico Progetto denominato "Interventi di animazione territoriale per la diffusione della cultura d'impresa", attuato da Vallée d'Aoste Structure s.r.l.

Le attività riconducibili all'Intervento si sono concluse nell'annualità 2018, mentre le operazioni di chiusura finanziaria dello stesso si sono concluse nel 2025.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	1	0	0	1	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Al BV	1	0	0	1	62.799,54	62.799,54	62.799,54	62.799,54	62.799,54	62.799,54

➤ **Interventi per la formazione di giovani e adulti (SL.5.1)**

Dotazione finanziaria iniziale dell'Intervento (non presente nell'APQ, ma è stata ereditata parte della dotazione finanziaria dell'Intervento IS.1.1.4 stimata per l'Area interna Bassa Valle): 30.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 2.477.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle è stata allineata all'importo del costo ammesso della quota parte dei 6 progetti conclusi (pari a 84.791,34 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dell'intera quota dei 6 progetti conclusi (pari a 558.352,27 euro).

L'Intervento è stato avviato nel mese di giugno 2021 e si è concluso il 13 giugno 2023.

In questo arco di tempo sono stati pubblicati due Avvisi pubblici: l'Avviso 21AC, per il finanziamento di iniziative formative finalizzate all'occupabilità e promosse dagli organismi di formazione accreditati e l'Avviso 21AH, per il finanziamento di corsi per l'acquisizione di competenze linguistiche 2022.

Nell'ambito del primo Avviso pubblico (21AC) sono stati avviati 6 Progetti (di cui 1 è stato poi oggetto di revoca), che si sono conclusi al 31.12.2023; mentre nell'ambito del secondo Avviso pubblico (21AH), finalizzato al finanziamento di corsi per l'acquisizione di competenze linguistiche per l'anno 2022, è stato approvato il Progetto "Parole senza frontiere", che ha proposto 9 corsi di lingua (inglese e francese), per un totale complessivo di 400 ore di formazione, organizzati in tutta la Regione e rivolti in particolare ai disoccupati. Nello specifico, per l'Area interna Bassa Valle sono stati realizzati un corso di lingua francese e un corso di lingua inglese.

Il Progetto si è concluso il 13.06.2023.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	7	0	1	6	639.529,36	558.352,27	558.352,27	558.352,27	558.352,27	558.352,27
Al BV	7	0	1	6	93.442,53	84.791,34	84.791,34	84.791,34	84.791,34	84.791,34

➤ **Interventi per la formazione continua interaziendale dei dipendenti e/o titolari delle micro, piccole, medie e grandi imprese (SL.5.2)**

Dotazione finanziaria iniziale dell'Intervento (non presente nell'APQ, ma è stata ereditata parte della dotazione finanziaria dell'Intervento IS.1.1.4 stimata per l'Area interna Bassa Valle): 100.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 1.500.000,00 euro, a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle è stata allineata all'importo del costo ammesso della quota parte dei 4 progetti conclusi (pari a 43.801,52 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dell'intera quota dei 19 progetti conclusi (pari a 393.181,21 euro).

L'Intervento è stato avviato nel mese di maggio 2021, con l'approvazione dell'Avviso pubblico su base regionale per la formazione continua per le annualità 2021/2022 (Avviso 21AA), che prevedeva fino a 10 punti di premialità per gli interventi formativi che coinvolgessero imprese con sede operativa nell'Area interna Bassa Valle e che avessero come finalità la valorizzazione delle specificità e delle potenzialità locali riguardanti: la tutela del territorio e delle comunità locali; la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile; i sistemi agro-alimentari e lo sviluppo locale; il risparmio energetico e le filiere locali di energia rinnovabile; il saper fare e l'artigianato.

Nell'ambito di tale Avviso sono stati approvati 4 progetti interaziendali:

- "Manutentore del verde - VI edizione", cod. OCC.10402.21AA.1.0007.FIM, per la valorizzazione della tutela del territorio;
- "AREV: corso di produzione e trasformazione delle carni Valdostane", cod. OCC.10402.21AA.1.0013.FIM, finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità locali dei sistemi agro-alimentari;
- "VALLE 2022-2023 – CUVDA", cod. OCC.10402.21AA.1.0017.FIM, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
- "Manutentore del verde - VIII edizione", cod. OCC.10402.21AA.1.0023.FIM, per la valorizzazione della tutela del territorio.

L'Intervento si è concluso il 30.06.2023.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	19	0	0	19	406.056,00	393.181,21	393.181,21	393.181,21	393.181,21	393.181,21
Al BV	4	0	0	4	43.801,52	43.801,52	43.801,52	43.801,52	43.801,52	43.801,52

3.2.4 FEASR

➤ **Infrastrutturazione digitale dell'Area interna Bassa Valle (BL.1)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 3.572.979,00 euro a valere sul Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). Si precisa che tale importo è riferito alla sola quota stimata attribuibile all'Area interna Bassa Valle, in quanto nell'APQ è stata presa in considerazione la sola parte dell'Intervento riguardante tale Area, nonostante l'Intervento riguardi sia l'intero territorio regionale (con una dotazione finanziaria pari a 5.784.424,00 euro), sia l'intero territorio nazionale (con una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 1,6 miliardi di euro). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle è stata allineata all'importo del relativo costo ammesso (pari a 1.822.078,24 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è rimasto invariato.

L'Intervento è stato avviato nel mese di gennaio 2018 e, al 31.12.2025, tutti i lavori finalizzati alla riduzione del divario digitale delle aree rurali – realizzati attraverso lo sviluppo della banda ultra larga, sia relativi alla posa della fibra ottica, sia relativi ai collegamenti *wireless* – risultano conclusi in tutti i Comuni della Regione (i Comuni di Pont-Saint-Martin, Challand-Saint-Victor e Challand-Saint-Anselme sono stati esclusi dagli Interventi, poiché già serviti da connettività veloce).

L'Intervento risulta, quindi, concluso.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Intervento:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale*	5.784.424,00	5.784.424,00	5.784.424,00	5.784.424,00	5.768.955,96	5.768.955,96
di cui Area interna BV	1.822.078,24	1.822.078,24	1.822.078,24	1.822.078,24	1.822.078,24	1.822.078,24

* Gli importi relativi alla riga totale sono riferiti alle risorse finanziarie riconducibili all'intero territorio regionale, nonostante nella Scheda intervento allegata all'APQ sia stata presa in considerazione la sola parte dell'Intervento riguardante l'Area interna Bassa Valle.

➤ **Supporto alla cooperazione tra piccoli operatori agroalimentari e turistici (SL.2.1)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 530.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 1.600.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle è stata allineata all'importo del costo ammesso dei 2 progetti conclusi (pari a 101.073,89 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 9 progetti conclusi (pari a 747.997,76 euro).

L'Intervento è stato avviato nel mese di maggio 2019. A seguito di una modifica alla Strategia di Sviluppo locale del Gal Valle d'Aosta la dotazione complessiva della misura è stata diminuita da 1.600.000 euro ad 1.000.000 di euro, e di conseguenza sono state riviste anche le stime per le ricadute nell'Area Interna Bassa Valle.

In fase di validazione del bando e su richiesta dell'organismo pagatore la misura 16.3 è stata suddivisa in due bandi:

- 16.3 sotto-intervento 1 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse" – dotazione finanziaria prevista 200.000,00 euro;
- 16.3 sotto-intervento 2 "Cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo" – dotazione finanziaria prevista 800.000,00 euro.

In relazione a tali bandi sono stati approvati, per l'Area interna Bassa Valle, i seguenti due progetti.

- **"Samstag Märkt. Il mercato del sabato"**: riconducibile al bando "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse", prevedeva la creazione di un modello di collaborazione tra aziende che, condividendo valori comuni legati alla genuinità dei prodotti offerti, si sono poste l'obiettivo di promuovere e offrire al pubblico un paniere di prodotti tipici di montagna di alta qualità (orticoltura, confetture, miele, formaggi d'alpeggio e prodotti da forno). La rete, composta da 7 aziende, si è costituita attraverso un Contratto di rete registrato presso la Camera di commercio.

Dall'avvio del Progetto, nel 2020, la rete ha creato un proprio marchio e una pagina *Facebook* dedicata e ha acquistato gli *stand* di legno necessari per l'allestimento del mercato; sono stati organizzati, inoltre, una serie di laboratori e degli incontri sulle attività di animazione sul territorio.

Il Progetto si è concluso il 29 novembre 2023, ma le attività della rete sono proseguite anche negli anni successivi.

- **"Sentieri del Lys"**: riconducibile al bando "Cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo", era finalizzato a valorizzare il territorio montano della Valle del Lys attraverso una rete di sentieristica, che inizia in mezzo ai vigneti del fondo valle per arrivare ai ghiacciai del Monte Rosa. La progettazione dei percorsi di *trekking*, rivolti a differenti *target*, prevedeva un pacchetto completo con la sosta notturna e diurna nelle strutture ricettive della rete e il trasporto bagagli da una tappa all'altra. La rete è composta da 13 aziende che si sono costituite in Associazione Temporanea di Scopo.

Nella prima fase di attuazione dell'Intervento è stata creata la pagina *Facebook* dedicata; sono stati realizzati lavori di tracciatura di alcuni tratti di sentieri, il video promozionale del Progetto e l'*APP* dei percorsi.

Già a partire dal primo anno di attuazione i risultati raggiunti sono stati soddisfacenti: durante il periodo natalizio sono state effettuate prenotazioni per la stagione estiva dell'anno successivo; i tour completi venduti sono cresciuti dell'11%; i clienti sono aumentati del 32%, i pernottamenti del 28% e il fatturato del 51%.

Nel 2023 la rete di imprese ha realizzato il proprio sito internet in tre lingue: inglese, italiano e tedesco <https://sentieridellys.it/>.

L'Intervento si è concluso nel mese di aprile 2024, ma le attività della rete sono proseguite anche negli anni successivi.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati *	Approvati						
Totale	13	0	4	9	747.997,76	747.997,76	747.997,76	747.997,76	747.997,76	747.997,76
AI BV	3	0	1	2	101.073,89	101.073,89	101.073,89	101.073,89	101.073,89	101.073,89

* Tra i progetti 'Non approvati' (4) sono stati conteggiati anche 2 progetti non entrati in istruttoria (un Progetto ritenuto irricevibile e un Progetto non ammissibile), entrambi non afferenti all'Area interna Bassa Valle.

➤ **Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (SL.2.2)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 30.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 100.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle e il costo dell'Intervento a livello regionale sono stati allineati all'importo del costo ammesso dell'unico Progetto concluso (pari a 68.356,77 euro).

L'Intervento, avviato nel mese di maggio 2019 con la pubblicazione del bando del GAL Valle d'Aosta riconducibile alla sottomisura 16.4.1 della propria Strategia di sviluppo locale, si è concluso nel mese di luglio 2022.

Nell'ambito del bando sono stati presentati 3 Progetti, di cui 1 nell'Area interna Bassa Valle, l'unico a essere stato approvato, intitolato "To.Gre.Val." e volto a valorizzare la "Toma di Gressoney" attraverso un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI), che si è occupata della diffusione del prodotto, organizzando momenti divulgativi e informativi anche con le Amministrazioni pubbliche della vallata e realizzando il percorso formativo "IN-FORMA", disponibile sul sito <http://www.togreval.it/>.

Il Progetto ha avuto ottimi riscontri in quanto la toma prodotta dai venditori è risultata insufficiente a coprire le richieste del mercato.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	3	0	2	1	68.356,77	68.356,77	68.356,77	68.356,77	68.356,77	68.356,77
AI BV	1	0	0	1	68.356,77	68.356,77	68.356,77	68.356,77	68.356,77	68.356,77

➤ **Investimenti non produttivi – recupero e manutenzione dei tradizionali muretti a secco (SL.3.1)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 300.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 900.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle è stata allineata all'importo del costo ammesso dei 25 progetti conclusi (pari a 445.768,72 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 44 progetti conclusi (pari a 763.007,70 euro).

L'Intervento è stato avviato nel mese di maggio 2019, a seguito della pubblicazione del Bando regionale di cui alla Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", Sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali", inerente alla ricostruzione dei tradizionali muretti a secco.

A seguito del Bando, è stato concesso il contributo in conto capitale in favore di 44 Beneficiari, di cui 25 riconducibili all'Area interna Bassa Valle che, al 31.12.2023, avevano presentato domanda di pagamento per un valore complessivo di 445.768,72 euro. L'intervento ha riscosso un notevole successo anche grazie alle campagne informative realizzate e all'organizzazione di incontri nelle aree di maggiore interesse.

L'Intervento è da ritenersi concluso.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	52	0	8	44	763.007,70	763.007,70	763.007,70	763.007,70	763.007,70	763.007,70
Al BV	26	0	1	25	445.768,72	445.768,72	445.768,72	445.768,72	445.768,72	445.768,72

➤ **Gestione e sfruttamento delle risorse forestali – Strutturazione della filiera del bosco (SL.3.2)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 30.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 100.000,00 euro), a valere sul bando, a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). La dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle è stata azzerata, poiché non sono state presentate proposte progettuali in tale Area. Il costo dell'Intervento a livello regionale è stato azzerato a seguito della rinuncia, da parte del beneficiario nel 2025, dell'unico Progetto approvato nel 2024.

Nel mese di novembre del 2019 è stato pubblicato un bando, riconducibile alla sottomisura 16.6 "Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali" del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR), andato deserto per le difficoltà oggettive riscontrate dai professionisti nella creazione di una rete di cooperazione finalizzata a unire soggetti differenti

(Comuni e soggetti privati). Diversi attori hanno richiesto di pubblicare un nuovo bando nel corso del 2021, ma ciò non è stato possibile a causa di anomalie bloccanti nel sistema nazionale di gestione dei bandi (SIAN).

Per il secondo Bando, pubblicato nel mese di marzo 2022, sono state presentate 2 domande, di cui 1 non ammissibile e 1 approvata, non riferibile all'Area interna Bassa Valle, che è stata, però, oggetto di rinuncia da parte del beneficiario nel 2025. Alla luce di quanto sopra l'Intervento risulta non attuabile.

Si riporta di seguito l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	1	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Al BV	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

➤ **Gestione e sfruttamento delle risorse forestali – Elaborazione di piani di gestione forestale (SL.3.3)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 30.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 100.000,00 euro), a valere sul bando, a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito di una rimodulazione del piano finanziario del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR), l'Intervento è stato soppresso.

L'Intervento è riconducibile alla sottomisura 16.8 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti" del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR).

In relazione a tale Intervento è stato pubblicato un Bando nel mese di novembre 2019, con scadenza 30 marzo 2020, andato deserto, anche a causa delle difficoltà oggettive riscontrate dai professionisti nella creazione di una rete di cooperazione finalizzata a unire soggetti differenti (Comuni e soggetti privati).

Non essendo prevista la pubblicazione di ulteriori Bandi, è stato modificato il piano finanziario del PSR 2014/22 e l'Intervento è stato soppresso.

➤ **Gestione e sfruttamento delle risorse forestali – investimenti in tecnologie silvicole (SL.3.4)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 300.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 1.000.000,00 euro), a valere sul bando, a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle è stata allineata all'importo del costo ammesso dei 7 progetti conclusi (pari a 291.994,41 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 17 progetti conclusi (pari a 448.094,60 euro).

L'Intervento è riconducibile alla sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR).

Dal 2017 al 2022 sono stati pubblicati 5 bandi (per le annualità 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022), rispetto ai quali sono state presentate complessivamente 18 domande di sostegno (di cui 8 riconducibile all'Area interna Bassa Valle), delle quali 17 sono state approvate (di cui 7 nell'Area interna Bassa Valle).

Nel 2025 sono stati effettuati gli ultimi pagamenti a saldo e l'Intervento risulta concluso all'1.12.2025.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	18	0	1	17	448.094,60	448.094,60	448.094,60	448.094,60	448.094,60	448.094,60
AI BV	8	0	1	7	291.994,41	291.994,41	291.994,41	291.994,41	291.994,41	291.994,41

➤ **Gestione e sfruttamento delle risorse forestali – Interventi di selvicoltura, in attuazione di piani di gestione forestale (SL.3.5)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 900.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area interna Bassa Valle, sul totale di 2.900.000,00 euro), a valere sul bando, a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area interna Bassa Valle è stata allineata all'importo del costo ammesso dei 3 progetti conclusi (pari a 300.550,15 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 10 progetti conclusi (pari a 684.750,98 euro).

L'Intervento è riconducibile alla sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR).

Dal 2016 al 2022 sono stati pubblicati 7 bandi (uno per ogni annualità dal 2016 al 2022), rispetto ai quali sono state presentate complessivamente 16 domande di sostegno, di cui 5 riconducibili all'Area interna Bassa Valle. Rispetto alle 16 domande presentate, 10 sono state approvate (di cui 3 riconducibili a tale Area), 6 non sono state approvate (di cui 2 riferibili all'Area interna Bassa Valle). Negli anni successivi non sono stati pubblicati ulteriori bandi.

L'Intervento si è concluso nel mese di ottobre 2025 e tutti i pagamenti sono stati effettuati.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	16	0	6	10	684.750,98	684.750,98	684.750,98	684.750,98	684.750,98	684.750,98
AI BV	5	0	2	3	300.550,15	300.550,15	300.550,15	300.550,15	300.550,15	300.550,15

4. GESTIONE E CONTROLLO

In termini generali, per quanto concerne l'attuazione, a livello regionale, della Strategia nazionale per le Aree interne, si evidenzia quanto segue:

- in relazione agli Interventi sui servizi essenziali si applicano le disposizioni e gli obblighi inseriti nel relativo Accordo di programma quadro (APQ) e quanto stabilito nel relativo Si.Ge.Co. riferito ai servizi essenziali, approvato, nella sua prima versione, con deliberazione della Giunta regionale n. 32 in data 31 gennaio 2020;
- rispetto agli Interventi di sviluppo locale valgono le disposizioni dettate dai regolamenti (UE) di riferimento e le regole proprie di ciascun Programma, definite negli appositi Si.Ge.Co.

Nell'ambito di tale quadro di riferimento, in considerazione delle criticità riscontrate nell'attuazione degli Interventi relativi ai servizi essenziali delle due Aree interne valdostane ("*Bassa Valle*" e "*Grand-Paradis*") – che hanno comportato la necessità di intervenire ripetutamente sulle Schede intervento già approvate, al fine di garantirne la realizzabilità e la sostenibilità – il Dipartimento politiche strutturali e affari europei (ora Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili) in qualità di Struttura di riferimento del Responsabile unico dell'attuazione degli APQ "*Area interna Bassa Valle*" e "*Area interna Grand-Paradis*", nel 2021, ha curato la predisposizione di una nuova versione del Si.Ge.Co. con l'obiettivo di introdurre semplificazioni procedurali. In tale versione – approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1413 in data 8 novembre 2021 – oltre a un puntuale aggiornamento del quadro di riferimento normativo e amministrativo alla luce delle ultime novità introdotte:

- sono state inserite delle semplificazioni in merito alla disciplina delle fasi di attuazione, modifica e possibilità di proroga degli Interventi (a titolo esemplificativo, con riguardo alle modifiche, è stato previsto di non attivare la procedura di consultazione del Tavolo dei sottoscrittori per le sole riprogrammazioni tra voci di spesa esistenti di valore inferiore al 20% del costo totale dell'Intervento, nel caso in cui le stesse non modifichino il valore complessivo dell'Intervento, mentre, con riferimento alla proroga, è stato previsto il mero invio di una nota di richiesta al RUA per tutti quei casi in cui non si ricada nelle fattispecie per le quali è richiesta l'attivazione del Tavolo dei sottoscrittori);
- è stata allineata la disciplina in materia di informazione e pubblicità alle indicazioni fornite dall'Agenzia per la coesione territoriale;
- sono stati meglio precisati gli aspetti inerenti al controllo di primo livello degli Interventi (definendo gli elementi su cui verte il controllo in loco);
- sono stati implementati i paragrafi relativi al trattamento delle irregolarità e ai pagamenti.

Sempre nella logica di semplificazione delle modalità procedurali, il Dipartimento politiche strutturali e affari europei ha, altresì, ritenuto necessario e opportuno predisporre un documento di indirizzo finalizzato a fornire delle linee guida utili ad agevolare la gestione delle Schede intervento da parte dei Beneficiari/attuatori degli Interventi relativi ai servizi essenziali nel caso in cui dette Schede siano oggetto di proposta di modifiche.

Nel 2024 il documento è stato ulteriormente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, n. 780 in data 8 luglio 2024, al fine di meglio precisare gli obblighi specifici in capo ai Beneficiari


degli Interventi, il trattamento delle irregolarità e dei recuperi delle somme indebitamente corrisposte, gli aspetti concernenti l'informazione e la pubblicità e per aggiornare i relativi allegati.

Al fine di garantire uniformità di trattamento agli Interventi finanziati con risorse SNAI, con la medesima deliberazione, è stato, altresì, deciso di estendere l'applicazione del "*Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) degli Interventi relativi ai servizi essenziali nelle Aree interne della Valle d'Aosta*" anche agli Interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle Aree interne, di cui al decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Per quanto concerne il sistema di monitoraggio utilizzato per gli Interventi inclusi nell'APQ si rimanda a quanto riportato all'inizio del Capitolo 3.

5. LA GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE

Come riportato nel documento "Monitoraggio del sistema intercomunale permanente – Analisi dello stato di avanzamento del processo di associazione delle funzioni e servizi e del modello organizzativo per la realizzazione della SNAI – Area interna Bassa Valle" – predisposto a dicembre 2020 da Formez PA per conto del CTAI – la governance per l'attuazione dell'APQ "Area interna Bassa Valle" può essere rappresentata dal seguente modello e analizzata in relazione alle tre macro-dimensioni di seguito riportate.

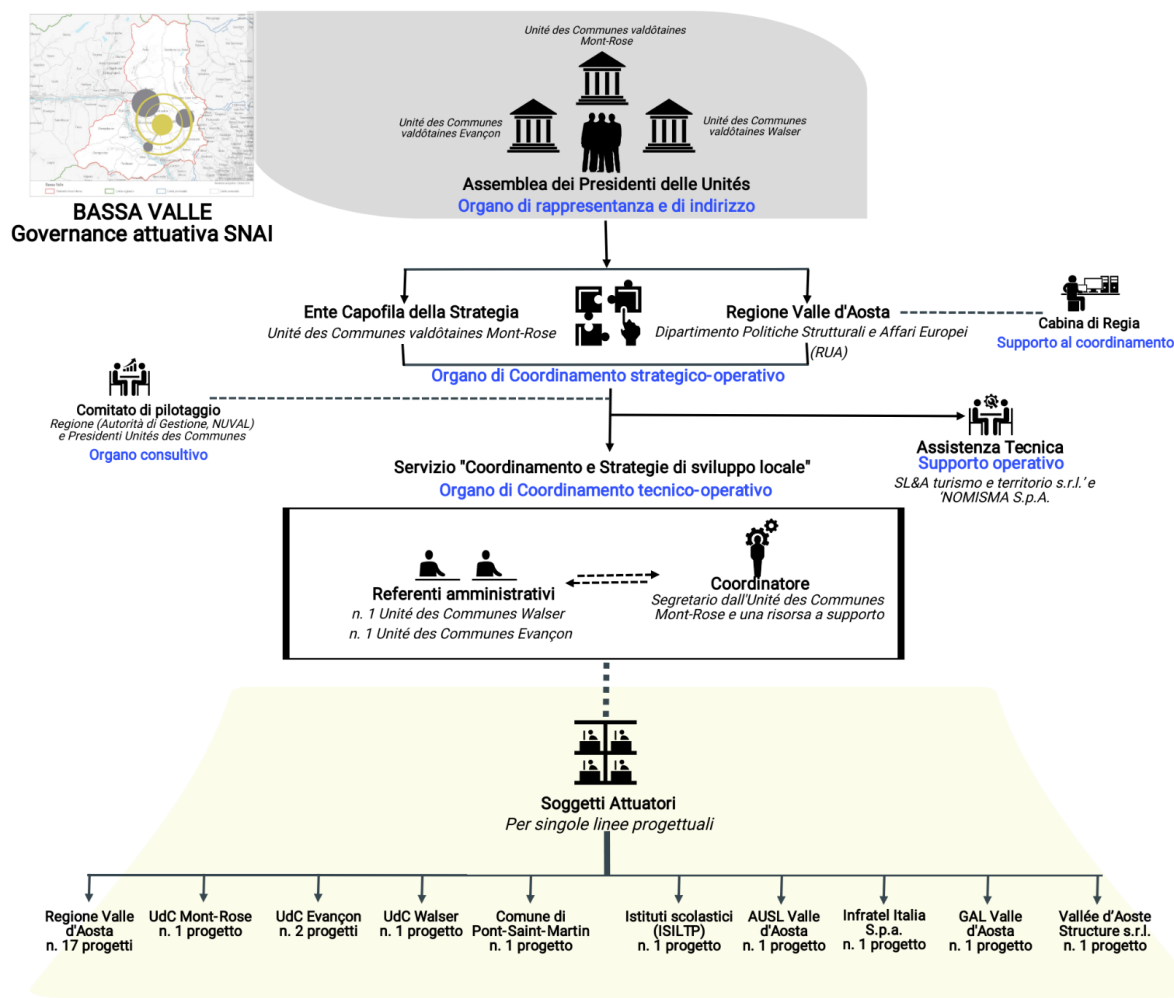

- 1. Rappresentatività politico-istituzionale:** tale rappresentatività, intesa come capacità di coinvolgimento degli attori comunali nei processi decisionali e di indirizzo della Strategia d'Area, si svolge nell'ambito dell'Assemblea dei Presidenti delle 3 Unités des Communes valdôtaines coinvolte (Mont-Rose, Evançon e Walser), che garantisce un'elevata coesione e rappresentatività politico-istituzionale dei Comuni associati nelle singole Unités, agendo da soggetto unitario di raccordo delle istanze territoriali e favorendone la ricomposizione e socializzazione durante l'intero svolgimento delle attività previste dalla Strategia d'Area.

2. **Coordinamento tecnico-operativo:** l'attività di coordinamento amministrativo e tecnico-operativo – sia verticale (verso l'organo decisionale), sia orizzontale (tra i Soggetti attuatori e i relativi Interventi) – è svolta di concerto tra l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose (Soggetto capofila dell'Area) e il Dipartimento politiche strutturali e affari europei della Regione (ora Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili, il cui Coordinatore riveste il ruolo di Autorità responsabile per le Aree interne), all'interno del quale è stato strutturato un apposito Ufficio Aree interne, di supporto all'attuazione delle Strategie delle Aree interne valdostane. A un livello più operativo è stata prevista una specifica struttura, il Servizio "*Coordinamento e Strategia dello sviluppo locale*", composto da una figura di coordinamento (individuata nel Segretario dell'Unité Mont-Rose), affiancata nelle attività da una risorsa appositamente reclutata e da un referente amministrativo per ciascuna delle altre due Unités.

Inoltre, a supporto operativo degli uffici delle tre Unités (con impegno prevalente verso quelli dell'Unité capofila), è attiva l'Assistenza tecnica individuata nel raggruppamento SL&A Turismo e Territorio - Nomisma.

È previsto, infine, anche un organo consultivo, il Comitato di Pilotaggio, che vede il coinvolgimento dei Presidenti delle tre Unités e i relativi Sindaci, le Autorità di gestione dei programmi europei e gli esperti del Nucleo di valutazione dei Programmi a finalità strutturale (NUVAL) della Valle d'Aosta.

3. **Gestione operativa:** considerato che quasi il 75% degli Interventi dell'APQ sono in capo all'Amministrazione regionale, la maggior parte delle attività tecnico-amministrative del processo attuativo sono a carico delle Strutture regionali, maggiormente dotate di personale esperto e qualificato. Le modalità collaborative poste in essere dall'Ufficio Aree interne hanno, poi, consentito di sviluppare un forte raccordo operativo con le strutture locali, sia nella fase di progettazione, sia in quella di attuazione dei singoli Interventi.

Al fine di rafforzare la governance complessiva, con deliberazione della Giunta regionale n. 1669, in data 13 dicembre 2021, è stato riorganizzato il Comitato per lo sviluppo locale¹³, che è così composto:

- dal Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei – ora Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili – con funzione di Presidente del Comitato;
- dalle Autorità di gestione dei Programmi regionali FESR, FSE+ e FEASR;
- dal Responsabile regionale dei Programmi di Cooperazione territoriale europea;
- dal componente esperto esterno del NUVAL in sviluppo rurale e locale, nonché in sviluppo sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici e rischi;
- dal componente esperto esterno del NUVAL in sviluppo territoriale, con particolare riferimento alla Cooperazione territoriale europea e ai partenariati multilivello;
- dai Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines coinvolte nelle Aree interne;
- dai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta ricompresi nelle Aree interne interessate;

¹³ Il Comitato per lo sviluppo locale svolge anche le attività residue poste in capo al Comitato per lo sviluppo locale previsto nell'ambito del Quadro strategico regionale 2014/20 e costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 369 in data 18 marzo 2016.

- dal Dirigente della Struttura regionale Sistemi tecnologici, relativamente alla tematica *Smart Villages*.

Il Comitato per lo sviluppo locale assicura, nella nuova composizione, il processo partecipativo – anche come strumento di riflessione condivisa sul futuro del territorio regionale – e permette di rilevare i fabbisogni, raccogliere e far convergere le istanze e la volontà dei diversi attori territoriali coinvolti; favorisce, inoltre, la gestione della Strategia in corso, sia in una logica prospettica, per cogliere le nuove opportunità del PNRR, sia per sviluppare una progettazione territoriale integrata.

Rispetto alle figure regionali e locali previste dall'APQ "Area interna Bassa Valle" sottoscritto in data 16 febbraio 2018, si segnala che – a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale – la competenza relativa alle Aree interne, incardinate nell'ambito del Dipartimento politiche strutturali e affari europei – ora Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili – sono passate dall'allora Assessorato agli affari europei, politiche del lavoro inclusione sociale e trasporti, all'Assessorato all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate e, infine, all'Assessorato agli affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna, ora ridenominato Assessorato agli affari europei, innovazione, PNRR, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili.

Si segnala, infine, che la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella *governance* dell'APQ ha consentito di far fronte alle criticità emerse sui vari Interventi e, in particolare, su quelli per i quali è stato necessario attivare la procedura di consultazione del Tavolo dei sottoscrittori (cfr. Capitolo 2).

6. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Un'attività di comunicazione continua è stata svolta in modo diretto da parte dei responsabili dei singoli Interventi, attraverso canali propri e per mezzo di strumenti di comunicazione tradizionali e *social*. Tale attività ha avuto ricadute nella stampa e nei media locali, anche grazie ai comunicati rilanciati dall'Ufficio stampa della Regione o da canali di settore (il canale tematico "*Europa*" del sito regionale, curato da Europe Direct Vallée d'Aoste, il sito "*Webécole*" curato dal Dipartimento Sovrintendenza agli studi, ecc.).

In particolare, rispetto agli Interventi relativi ai servizi essenziali, si segnala quanto segue:

- nell'ambito della **mobilità**, la promozione delle attività è stata gestita dall'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose (Soggetto Capofila), nella sezione dedicata alla Strategia Aree interne (vedi *link*) e sul sito delle altre Unités des Communes della Bassa Valle; sono state, inoltre, realizzate delle locandine, trasmesse ai vari Comuni per l'affissione;
- nell'ambito **sanità**, con riferimento all'Intervento SN.1, tutte le iniziative sono state promosse attraverso *recall*, locandine e cartoline-invito. Ai Comuni coinvolti è stata richiesta la divulgazione tramite i rispettivi canali tematici del materiale promozionale inviato. Sono state, inoltre, organizzate dall'Azienda USL della Valle d'Aosta quattro serate sul tema "*L'Orto per la salute – Coltiviamo il nostro benessere*", finalizzate allo stare bene della persona, attraverso una sana alimentazione, derivante dalla coltivazione di prodotti genuini. Sul sito dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose (vedi *link*) è stata, inoltre, promossa la collaborazione delle tre Unités della Bassa Valle per l'acquisto di un ecografo utile per il servizio delle ambulanze attive sul territorio dell'Area interna interessata;
- nell'ambito **istruzione**, relativamente agli Interventi SL.5.1 "*Interventi per la formazione di giovani e adulti*" e SL.5.2 "*Interventi per la formazione continua interaziendale dei dipendenti e/o titolari delle micro, medie e grandi imprese*", prima dell'approvazione dell'Avviso, sono stati organizzati incontri con gli enti di formazione valdostani accreditati e con le Associazioni di categoria, al fine di presentare e promuovere l'azione intrapresa e recepire i loro eventuali suggerimenti e/o necessità da mettere in atto. Ad avvenuta approvazione, l'Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- per quanto concerne le attività di **Assistenza tecnica**, sono stati organizzati diversi incontri, ai quali hanno partecipato il RUP e, successivamente, il gruppo di lavoro. La comunicazione è stata seguita principalmente dall'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, con il supporto dell'Assistenza tecnica. I principali canali di comunicazione utilizzati sono stati il sito istituzionale dell'Ente e il protocollo, tramite il quale sono state diffuse le informazioni agli *stakeholder*. Particolare attenzione è stata rivolta alle Amministrazioni comunali dell'Area, verso le quali è stata svolta, tramite il sito *web* e le comunicazioni via e-mail, un'attività di informazione sui fondi fruibili dai Comuni, tra i quali quelli per l'avvio di progetti inerenti al PNRR. È stata, altresì, avviata un'attività informativa a diversi gruppi di destinatari, (biblioteche della Regione, media, associazioni di categoria, ordini e collegi regionali) al fine di veicolare l'informazione verso una platea di *stakeholders* più ampia.

Si riportano, inoltre, le seguenti informazioni, suddivise per Programma di riferimento.

Programma FESR 2014/20:

- per l'Intervento "**Bassa Via della Valle d'Aosta – Sentieristica (SL.1.1)**", nel Canale tematico "*Risorse naturali*" del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta, è presente una sezione nella quale si possono trovare informazioni in merito alla descrizione dell'Intervento, al tracciato, ai file GPS, GPX e KML delle tappe, alla percorribilità dell'itinerario aggiornata, oltre ad alcune immagini promozionali. Inoltre, in attuazione degli obblighi in materia di informazione e pubblicità dell'operazione, si segnala che l'emblema dell'Unione europea, assieme al simbolo dello Stato italiano e della Regione autonoma Valle d'Aosta, nonché il riferimento al Programma FESR sono stati inseriti all'interno della sezione dedicata all'Intervento, nella pagina *web* istituzionale. Analogamente, tali emblemi e il riferimento al FESR, sono stati apposti sui cartelli di cantiere dei vari Interventi, in modo da rendere visibile, in fase di attuazione, il cofinanziamento ricevuto per l'itinerario "**Bassa Via – Sentieristica**";
- per l'Intervento "**Bassa Via della Valle d'Aosta – Promozione (SL.1.2)**", sono state attivate iniziative promo-pubblicitarie che si sono tradotte principalmente in pagine pubblicitarie, articoli, monografie dedicate al "*Cammino Balteo*", che hanno permesso di informare e comunicare il prodotto "*Balteus*" sia in Italia, sia all'estero;
- per l'Intervento "**Bassa Via della Valle d'Aosta – Tecnologie e servizi innovativi (SL.1.3)**", è stato implementato e aggiornato il sito internet dedicato al "*Cammino Balteo*" (vedi link) che contiene tutte le informazioni per la fruizione del percorso già descritte nel paragrafo 3.2.1;
- nell'ambito del "**Supporto allo sviluppo delle imprese insediate e da insediare in Valle d'Aosta**", la diffusione e l'informazione delle attività svolte è avvenuta attraverso i *Social Network Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn*.

Programma FEASR 2014/22:

- per l'Intervento "**Infrastrutturazione digitale dell'Area interna Bassa Valle (BL.1)**", a seguito dell'approvazione delle "*Linee guida del piano di comunicazione per la Banda Ultralarga*" da parte del Comitato per la Banda Ultralarga (COBUL), sono stati avviati i primi progetti di informazione e formazione destinati agli Enti locali (Comuni) e alle imprese per il tramite delle Camere di commercio¹⁴. Tali progetti consistono in due campagne di informazione e comunicazione a livello territoriale nella fase di realizzazione delle infrastrutture e di attivazione dei servizi. Periodicamente Infratel Italia S.p.A. pubblica i dati di avanzamento dell'Intervento relativi alla Valle d'Aosta sul sito (vedi [link](#));
- per gli Interventi "**Supporto alla cooperazione tra piccoli operatori agroalimentari e turistici (SL.2.1)**" e "**Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie (SL.2.2)**", sono proseguite le attività di comunicazione tramite le rispettive pagine di *Facebook* nelle quali vengono pubblicati aggiornamenti, foto e video rispetto alle attività realizzate. In particolare, rispetto ai progetti attuati sul territorio dell'Area interna Bassa Valle, si segnala che:

¹⁴ Per la Regione autonoma Valle d'Aosta i progetti di informazione sono stati avviati per il tramite della *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*.

- per il Progetto "*Samstag Märkt. Il mercato del sabato*" (SL.2.1), la Rete ha organizzato una serie di incontri di approfondimento sul Sistema di Garanzia Partecipata: un processo di certificazione dal basso che si adatta al contesto locale ma con una visione condivisa: cibo buono pulito e giusto;
- per il Progetto "*Sentieri del Lys*" (SL.2.1), nel 2023 la Rete ha realizzato il proprio sito internet, che è online in tre lingue: inglese, italiano e tedesco (vedi [link](#));
- i bandi relativi agli Interventi concernenti la **gestione e lo sfruttamento delle risorse forestali** (Interventi SL.3.4, e SL.3.5) sono stati pubblicizzati sul sito istituzionale della Regione e sui quotidiani locali. Al fine di coinvolgere i portatori di interesse (proprietari, imprese e professionisti) nella creazione di una filiera legno sono stati realizzati una serie di incontri sul territorio.
