



Regione autonoma Valle d'Aosta

Accordo di programma quadro

“Area interna Grand-Paradis”

Relazione di avanzamento annuale al 31 dicembre 2025¹

¹ Approvata, in data 26 giugno 2026, dal Comitato per lo sviluppo locale di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 1669/2021 e 211/2023.

Assessorato affari europei, innovazione, PNRR, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili
Assessorat des affaires européennes, de l'innovation, du PNRR, des politiques nationales de la
montagne et des politiques de la jeunesse

Département des affaires européennes, de l'innovation et des politiques de la montagne et de la
jeunesse
Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili

INDICE

Acronimi	5
Nota metodologica	6
Premessa.....	8
1. STATO DI "CANTIERABILITÀ" DEI SINGOLI INTERVENTI.....	12
2. MODIFICHE APPORTATE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO	13
3. STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO	21
3.1 Stato di attuazione Interventi finanziati con risorse statali	33
3.1.1 Istruzione	33
3.1.2 Salute.....	35
3.1.3 Mobilità.....	39
3.1.4 Associazionismo e assistenza tecnica.....	42
3.1.5 Interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi.....	43
3.2 Stato di attuazione Interventi su altri fondi.....	44
3.2.1 POC	44
3.2.2 FSE	45
3.2.3 FEASR	47
4. GESTIONE E CONTROLLO	55
5. LA GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE	57
6. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	60

INDICE DELLE TABELLE E DEI GRAFICI

Cartina 1:	Comuni Area interna Grand-Paradis.....	11
Tabella 1:	Numero Interventi cantierabili per anno	12
Tabella 2:	Raffronto tra la copertura finanziaria iniziale dell'APQ e quella al 31.12.2025.....	20
Tabella 3:	Progetti derivanti dagli Interventi di sviluppo locale per Programma, al 31.12.2025	22
Grafico 1:	Avanzamento finanziario dell'APQ per anno (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis).....	23
Grafico 2:	Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per tipologia degli interventi (servizi essenziali e sviluppo locale), rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis).....	24
Grafico 3:	Capacità di impegno e di spesa degli interventi (servizi essenziali e sviluppo locale) riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis).....	24
Grafico 4:	Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per Programma, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis).....	25
Grafico 5:	Capacità di impegno e di spesa dei Programmi riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis)	25
Grafico 6:	Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per Azione portante, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis).....	26
Grafico 7:	Capacità di impegno e di spesa delle Azioni portanti riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis).....	26
Grafico 8:	Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per i Settori di intervento degli Interventi relativi ai servizi essenziali, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis)	27
Grafico 9:	Capacità di impegno e di spesa dei Settori di intervento degli Interventi relativi ai servizi essenziali riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis)	27
Tabella 4:	Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Grand-Paradis" per tipologia degli interventi (servizi essenziali e sviluppo locale), al 31.12.2025.....	29
Tabella 5:	Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Grand-Paradis" per Programma, al 31.12.2025.....	30
Tabella 6:	Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Grand-Paradis" per Azione portante, al 31.12.2025.....	31
Tabella 7:	Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Grand-Paradis" per i Settori di intervento degli Interventi relativi ai servizi essenziali, al 31.12.2025	32

Acronimi

ACT	Agenzia per la coesione territoriale (facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)
AGEA	Agenzia per le erogazioni in agricoltura
APQ	Accordo di programma quadro
ARAI	Autorità responsabile per le Aree interne
BDU	Banca dati unitaria (dell'IGRUE)
CIPE	Comitato interministeriale per la programmazione economica
CIPESS	Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
CTAI	Comitato tecnico Aree interne (facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)
DPCOES	Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud (facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)
DGR	Deliberazione della Giunta regionale (della Regione autonoma Valle d'Aosta)
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
FESR	Fondo europeo per lo sviluppo regionale
FSE	Fondo sociale europeo
GAL	Gruppo di azione locale (della Valle d'Aosta)
GURI	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
IGRUE	Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze)
POC	Programma operativo complementare 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta
PSR	Programma di Sviluppo rurale
PUC	Protocollo unico di colloquio (con la Banca dati unitaria dell'IGRUE)
RAA	Relazione di avanzamento annuale
RAVA	Regione autonoma Valle d'Aosta
RUA	Responsabile unico dell'attuazione (dell'Accordo di programma quadro), ora Autorità responsabile per le Aree interne
RUP	Responsabile unico del procedimento
RUPA	Responsabile unico delle parti (uno per la parte regionale – Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei – e uno per la parte locale – Segretario dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis)
SIAN	Sistema informativo agricolo nazionale
SISPREG2014	Sistema informativo della Politica regionale di sviluppo 2014/20 (della Valle d'Aosta)
SNAI	Strategia nazionale per le Aree interne
SNM	Sistema nazionale di monitoraggio

Nota metodologica

La presente Relazione di avanzamento annuale (RAA) elaborata in attuazione dell'art. 11, comma 1 dell'Accordo di programma quadro "Area interna Grand-Paradis", costituisce il Rapporto di monitoraggio sull'attuazione degli Interventi e sui risultati raggiunti, che sarà inoltrato al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud (prima Agenzia per la coesione territoriale), al Comitato tecnico Aree interne, ai fini del rispetto della previsione di cui al punto 5 della delibera CIPE n. 9 del 2015.

Le informazioni utilizzate nella RAA sono state reperite, tramite un apposito modello predisposto dal Responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo di programma quadro (RUA), ora Autorità responsabile per le Aree interne, presso i Beneficiari degli Interventi e dal sistema informativo regionale SISPREG2014. Nella relazione sono rappresentati lo stato di attuazione degli Interventi e i dati di attuazione al **31.12.2025**.

Per una corretta comprensione dei dati inseriti nella RAA, è utile riassumere, in breve, il significato e le specificità dei seguenti termini ricorrenti con particolare riferimento all'attuazione finanziaria.

- **Dotazione finanziaria iniziale APQ:** corrisponde alle risorse finanziarie nominali di un Intervento al momento della sottoscrizione dell'APQ.
- **Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2025:** corrisponde alle risorse finanziarie nominali di un Intervento disponibili al 31.12.2025. Tale dotazione tiene conto, pertanto, di eventuali variazioni intervenute a seguito della sottoscrizione dell'APQ e, di norma, coincide con la somma delle risorse pubbliche di un Intervento (anche se non riconducibili al Costo ammesso).
- **Finanziamento:** è la somma di tutte le fonti di finanziamento (pubbliche e, talvolta, private) che contribuiscono alla copertura finanziaria di un Intervento.
- **Costo ammesso:** è il costo pubblico totale dell'Intervento approvato e ammesso al finanziamento del Programma di riferimento.
- **Impegni:** rappresentano la quota parte del finanziamento di un Intervento approvato che si è tradotta in obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) intendendosi l'atto di affidamento dei lavori, servizi e forniture, o affidamenti di servizi e concessioni di contributi agli Enti di formazione, alle Istituzioni scolastiche e alle imprese, a conclusione delle relative procedure. In quanto tali, rappresentano un indicatore utile a monitorare l'effettivo avvio delle attività di un Intervento.
- **Impegni ammessi:** rappresentano la quota parte degli impegni di un Intervento che risulta ammissibile a valere sul Programma di riferimento. Nella maggior parte dei casi l'importo del singolo impegno ammesso di un Intervento coincide con l'importo del corrispondente impegno, ma se l'Intervento è cofinanziato anche con fonti di finanziamento non riconducibili al Costo ammesso, l'importo può essere inferiore (poiché solo una parte è finanziata e, quindi, risulta ammissibile, a valere sul Programma di riferimento).

- **Pagamenti:** sono le spese effettivamente pagate dal Beneficiario di un Intervento e indicano, di norma, l'avanzamento effettivo della realizzazione delle attività.
- **Pagamenti ammessi:** rappresentano la quota parte dei pagamenti di un Intervento che risulta ammissibile a valere sul Programma di riferimento.

Si precisa che tutti i valori riportati nella presente RAA sono da intendersi:

- al netto dei Progetti oggetto di rinuncia da parte dei Beneficiari, prima o dopo l'istruttoria, oppure ad avvenuta approvazione;
- al netto dell'Intervento "*Saint-Nicolas (GP01)*", finalizzato alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi, non rientrando tale Intervento nell'APQ "*Area interna Grand-Paradis*". Di questo Intervento si dà atto solo all'interno del paragrafo 3.1.5.

Considerato che negli allegati all'APQ si fa riferimento sia al costo complessivo degli Interventi, sia al costo degli stessi nella sola Area interna Grand-Paradis, nella presente RAA, sono stati riportati, ove ritenuto opportuno – oltre ai dati di attuazione riferiti alla sola Area interna – anche i dati complessivi riferiti alle ricadute degli Interventi sull'intero territorio regionale.


Premessa

Titolo dell'APQ	Accordo di programma quadro Regione autonoma Valle d'Aosta "Area interna Grand-Paradis".
Data approvazione Strategia d'Area	La Strategia dell'Area interna Grand-Paradis è stata approvata contestualmente all'APQ in data 4 marzo 2020 (data di sottoscrizione dell'APQ da parte dell'ultimo firmatario – Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute – mentre il primo firmatario – Direttore dell'Area progetti e strumenti dell'Agenzia per la coesione territoriale – ha apposto la propria firma in data 14 gennaio 2020). A livello regionale, la Strategia è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1796 in data 30 dicembre 2019, contestualmente all'approvazione della stipula del relativo APQ.
Programmi coinvolti	▪ Strategia Aree interne Regione Valle d'Aosta – Linea Grand-Paradis (2018AREAINVALD); ▪ Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE) – (2014IT05SFOP011); ▪ Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR) – (2014IT06RDRP013); ▪ Programma operativo complementare (POC) 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta – (POCVALLAOSTA).
RUA e RUPA regionale	Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei (ora Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili) della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Soggetto capofila e RUPA locale	Segretario dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.
Legge statale di riferimento per gli interventi relativi ai servizi essenziali	▪ Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, commi 674 e 675; ▪ Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 314 (per le risorse integrative di cui alla delibera CIPESS n. 41/2022).
Delibera CIPE/ CIPESS di assegnazione delle risorse statali per gli interventi riconducibili ai servizi essenziali	▪ Delibera CIPE n. 43, del 10 agosto 2016 (GURI n. 301, del 27 dicembre 2016); ▪ Delibera CIPESS n. 41, del 2 agosto 2022 (GURI n. 278, del 28 novembre 2022).

Assegnazione risorse per gli Interventi finalizzati al contrasto degli incendi boschivi	▪ Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155; ▪ Delibera CIPESS n. 8, del 14 aprile 2022 (GU n.149 del 28-6-2022).
Attivazione delle procedure di erogazione finanziaria Fondi SNAI per interventi riconducibili ai servizi essenziali	In data 23 marzo 2021 il RUA ha inviato ai competenti Uffici dell'IGRUE la richiesta di anticipazione delle risorse statali di cui all'art.1, commi 674 e 675, della legge di stabilità n. 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Nel dettaglio, rispetto alla quota totale di risorse riferite alla linea di finanziamento "legge di stabilità" assegnata all'APQ "Area interna Grand-Paradis", pari a 3.740.000,00 euro, è stato chiesto all'IGRUE di rendere disponibile un'anticipazione corrispondente a circa il 33,5% di tale importo, pari a 1.253.399,60 euro, di cui 427.416,00 euro per il settore "Istruzione", 539.200,00 euro per il settore "Sanità", 211.983,60 euro per il settore "Mobilità" e 74.800,00 euro per "Assistenza tecnica". A seguito della suddetta richiesta, la Banca d'Italia ha provveduto, in data 13 aprile 2021, ad accreditare ai singoli Beneficiari degli Interventi l'importo dell'anticipo richiesto. In data 1° dicembre 2025 l'ARAI ha inviato ai competenti Uffici dell'IGRUE un'ulteriore richiesta di anticipazione delle risorse statali di cui all'art.1, commi 674 e 675, della legge di stabilità n. 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni, e delle risorse integrative di cui all'art. 1, comma 314, della legge n. 160/2019. Nel dettaglio, considerato l'ammontare massimo dei prefinanziamenti spettanti, pari a euro 1.616.000,00 – e la quota richiesta a titolo di anticipazione nell'annualità 2021, pari a euro 1.253.399,60 – è stata richiesta l'erogazione di ulteriori anticipazioni pari euro 6.900,00 per il settore "Istruzione", euro 90.497,40 per il settore "Mobilità" ed euro 22.602,60 per il settore "Assistenza Tecnica", per un totale complessivo pari a euro 120.000,00. A seguito della suddetta richiesta, la Banca d'Italia ha provveduto, in data 22 dicembre 2025, ad accreditare ai singoli Beneficiari l'importo dell'anticipo richiesto. In data 22 agosto 2025, inoltre, è stata trasmessa la richiesta di pagamento intermedio, riferita alla chiusura dell'Intervento "<i>Summer school - Una montagna da imparare</i>" (IS.3), per un importo pari a euro 61.013,29.
Popolazione	L'Area interna Grand-Paradis, situata all'estremità occidentale della Regione autonoma Valle d'Aosta, si estende su 826 km ² , con una popolazione complessiva di 15.371 unità (dati ISTAT al 31.12.2024) e comprende 13 comuni che, nella programmazione 2014/20, erano ripartiti in due ambiti specifici, così definiti (cfr. Cartina 1):

	▪ Area progetto, comprendente i Comuni più distanti dal Capoluogo regionale e, dunque, con maggiori difficoltà dal punto di vista dell'accessibilità e dei collegamenti: Cogne, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Valgrisenche e Valsavarenche; ▪ Area strategica, comprendente gli altri Comuni dell'Unité Grand-Paradis, che si trovano lungo l'asse centrale della Valle e sono, quindi, facilmente accessibili: Aymavilles, Arvier, Avise, Introd, Saint-Pierre, Sarre e Villeneuve. L'Area interna Grand-Paradis è stata riconfermata nel periodo di programmazione 2021/27, con il superamento della distinzione, tra Area progetto e Area strategica, presente nel precedente periodo di programmazione 2014/20. Pertanto ora tutti i 13 Comuni sopracitati, rientrano a pieno titolo nella Strategia d'Area interna Grand-Paradis.
Quadro copertura finanziaria al 31.12.2025 delle sole risorse riconducibili all'Area interna Grand-Paradis (per il raffronto con la dotazione iniziale cfr. Tabella 2)	▪ 3.740.000,00 euro – Risorse statali per i servizi essenziali (legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 674 e 675); ▪ 300.000,00 euro – Risorse statali integrative per i servizi essenziali (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 314); ▪ 218.899,40 euro – Risorse aggiuntive regionali per i servizi essenziali; ▪ 10.143,50 euro – Risorse aggiuntive Enti locali per i servizi essenziali; ▪ 500.000,00 euro – Programma operativo complementare (POC) 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta; ▪ 25.845,88 euro – Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE); ▪ 2.898.525,77 euro – Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR); ▪ 7.693.414,55 euro – Totale risorse Area interna Grand-Paradis.

Cartina 1: Comuni Area interna Grand-Paradis

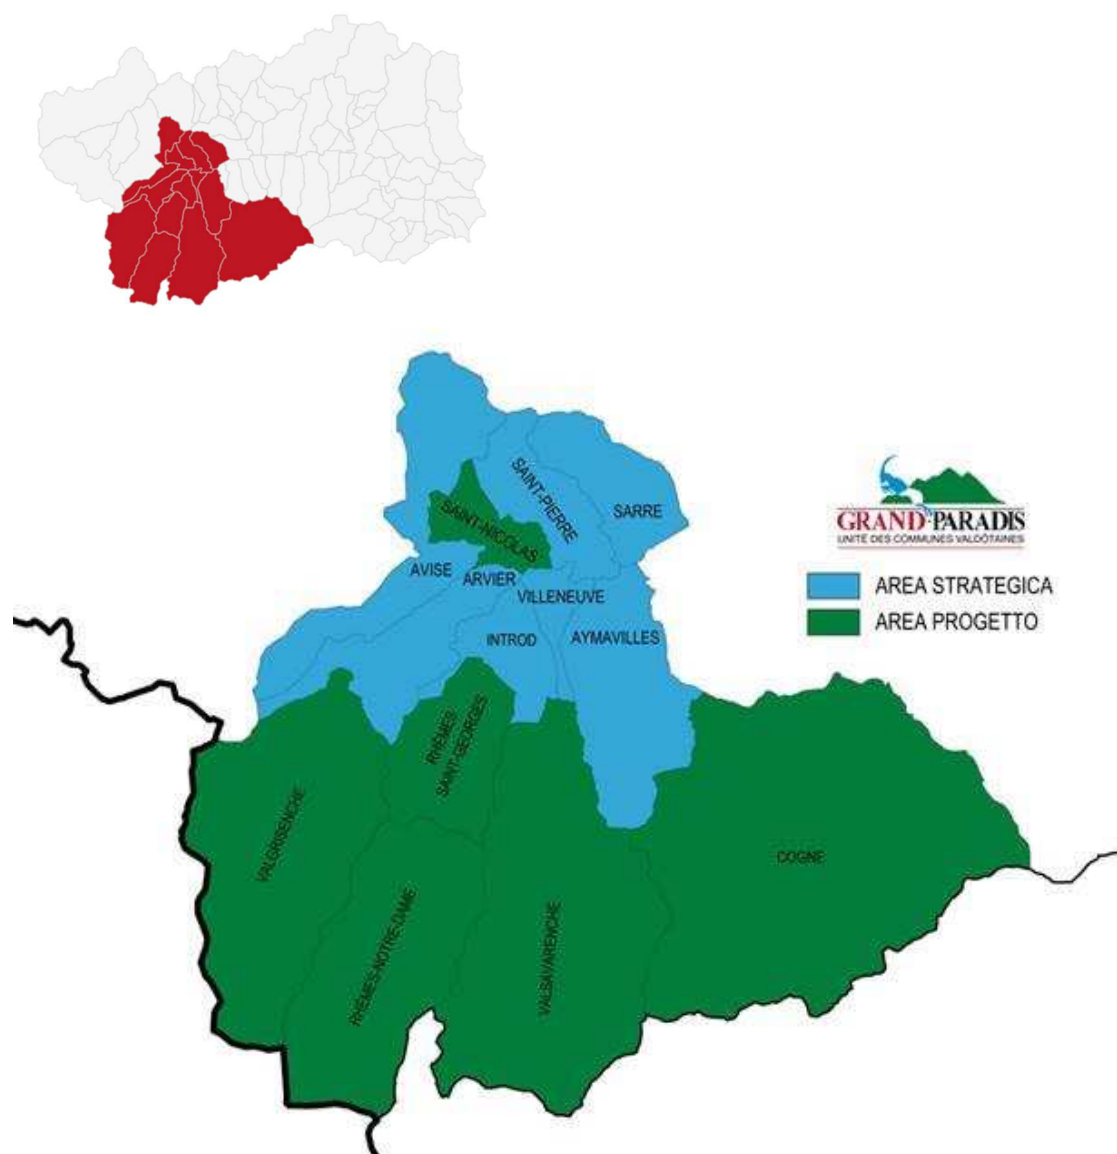

1. STATO DI "CANTIERABILITÀ" DEI SINGOLI INTERVENTI

Tabella 1: Numero Interventi cantierabili per anno

Anno	N. Interventi cantierabili (All. 3)*	N. Interventi non cantierabili	N. Totale Interventi
2020 (Anno di sottoscrizione APQ)	13	12	25
2021	16	9	25
2022	18	7	25
2023	18	7	25
2024	19	6	25
2025	19	6	25

* All'atto della sottoscrizione dell'APQ erano stati considerati cantierabili 13 Interventi, come riportato nell'allegato 3 all'APQ. A partire dall'anno 2021 sono stati considerati cantierabili:

- per gli Interventi intesi come "Scheda Azione" (dalla quale derivano i singoli Progetti, selezionati tramite un avviso ad evidenza pubblica), gli Interventi con almeno un Progetto approvato nell'ambito dell'Area interna Grand-Paradis;
- per gli Interventi definiti fin dall'origine come singoli Progetti, i soli Interventi il cui relativo Progetto risulta approvato.

2. MODIFICHE APPORTATE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Si riportano, di seguito, in ordine di Intervento – come dettagliato al capitolo 3.1 "*Stato di attuazione Interventi su legge di stabilità*" – e, all'interno di ciascun Intervento, in ordine cronologico di presentazione, le modifiche apportate alle Schede intervento di cui all'allegato 2a dell'APQ, formalmente approvate.

Sono, altresì, riportate le proroghe degli Interventi autorizzate dall'Autorità responsabile, a livello regionale, delle Aree interne (ARAI) e l'approvazione delle modifiche di competenza della stessa, a seguito della pubblicazione della delibera CIPESS 23 luglio 2025 n. 31, che non sono state trasmesse al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, ma sono state puntualmente riportate al successivo capitolo 3 "*Stato di attuazione Interventi*".

Si precisa che sono incluse tutte le modifiche richieste entro il 31 dicembre 2025, anche se approvate formalmente nell'anno 2026.

▪ Intervento "Formazione e scambi per una scuola di eccellenza Grand-Paradis (IS.1)"

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	1° febbraio 2022	- Revisione articolazione attività nella tabella " <i>Tipologia di spesa</i> " - Proroga data di conclusione Intervento al 30.06.2024 - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 469 del 10 febbraio 2022) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 7607 del 15.04.2022) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 8289 del 21.03.2023)
Seconda modifica (assegnazione risorse aggiuntive Delibera CIPESS n. 41/2022)	26 aprile 2023	- Destinazione di € 17.250,00 per il proseguimento delle attività di potenziamento della lingua inglese per l'intero anno scolastico 2023/24	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 1107 dell'11 maggio 2023) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 21651 dell'11.07.2023) - Approvazione comunicata dal DPCOES (prot. n. 10660 del 05.06.2024)
Terza modifica	26 giugno 2024	- Proroga data di conclusione Intervento al 30.06.2025 - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 2437 del 27 giugno 2024) - Trasmissione da parte del DPCOES, per informativa al Tavolo dei Sottoscrittori e presa d'atto, della richiesta di modifica (prot. n. 13117 del 09.07.2024)
Quarta modifica	30 giugno 2025	- Proroga data di conclusione dell'Intervento al 30.09.2026, per la prosecuzione delle attività, al fine di utilizzare le economie di spesa generate - Rimodulazione delle attività previste dall'Intervento - Rimodulazione del cronoprogramma delle attività e del cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 2794 del 11 luglio 2025) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata dal DPCOES (prot. n. 18052-P del 4 settembre 2025) - Approvazione comunicata da DPCOES (prot. n. 18341-P del 10 settembre 2025) a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del Ministero dell'Istruzione e del Merito, competente per materia

▪ **Intervento "Ambienti di apprendimento innovativi Grand-Paradis (IS.2)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	1° febbraio 2022	- Revisione descrizione delle voci di spesa - Proroga data di conclusione Intervento al 20.09.2024 - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 470 del 10 febbraio 2022) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 7607 del 15.04.2022) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 8289 del 21.03.2023)
Seconda modifica (solo proroga)	24 settembre 2024	- Proroga data di conclusione Intervento al 31.12.2024	- Approvazione da parte dell'ARAI (prot. n. 3680 del 3 ottobre 2024)
Terza modifica	13 dicembre 2024	- Proroga data di conclusione Intervento al 31.03.2025 - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 4890 del 20 dicembre 2024) - Trasmissione da parte del DPCOES, per informativa al Tavolo dei Sottoscrittori e presa d'atto, della richiesta di modifica (prot. n. 2309 del 10.02.2025)

▪ **Intervento "Summer School – Una montagna da imparare (IS.3)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	25 marzo 2021	- Riduzione durata delle Summer School - Annullamento ricorso alle risorse private - Adeguamento dettaglio voci di spesa - Variazione tipologia partecipanti e indicatore di risultato	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 1264 del 31 marzo 2021) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 7607 del 15.04.2022) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 8289 del 21.03.2023)

▪ **Intervento "Rafforzamento presidio medico Grand-Paradis (SN.1)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	28 marzo 2023	- Costituzione Tavolo di monitoraggio e individuazione coordinatore sanitario - Rimodulazione corsi e revisione spese - Proroga data di conclusione Intervento al 30.06.2025 - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 839 del 6 aprile 2023) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 16010 del 19.05.2023) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 18749 del 14.06.2023)

▪ **Intervento "Unité in movimento per la salute Grand-Paradis (SN.2)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	14 agosto 2023	- Estensione dell'Intervento a tutti i 13 Comuni dell'Unité Grand-Paradis	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 1987 del 25 agosto 2023) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 30159 del 24.10.2023) - Approvazione comunicata dal DPCOES (prot. n. 14848 del 01.08.2024)
Seconda modifica (solo proroga)	23 ottobre 2025	- Proroga data di conclusione Intervento al 31.12.2025	- Approvazione da parte dell'ARAI (prot. n. 4409 del 12 novembre 2025)

▪ **Intervento "Assistant de hameau Grand-Paradis (SN.3)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	27 novembre 2020	- Proroga data di conclusione Intervento al 31.12.2023 - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario - Introduzione dell'operatore di comunità	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 3389 del 9 dicembre 2020) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 5030 del 16.04.2021) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 10361 del 30.07.2021)

Seconda modifica	12 luglio 2022	- Aggiornamento soggetto attuatore e responsabile dell'attuazione dell'Intervento - Rimodulazione descrizione e importi relativi alle voci di spesa; - Proroga data di conclusione Intervento al 30.06.2025 - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 1870 del 19 luglio 2022) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 17227 dell'11.08.2022) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 19273 del 16.09.2022)
Terza modifica	14 ottobre 2024	- Estensione dell'ambito territoriale dell'azione ai comuni dell'Area strategica (Avisse, Arvier, Aymavilles, Introd, Saint-Pierre, Sarre e Villeneuve)	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 4059 del 25 ottobre 2024) - Con nota prot. 2773 del 17.02.2025, il DPCOES ha ritenuto non accoglibile la richiesta, poiché <i>"eventuali interventi nell'Area strategica sono ammessi solo se in grado di apportare vantaggi anche ai comuni dell'Area progetto"</i>
Quarta modifica	18 giugno 2025	- Proroga della data di fine intervento al 14 ottobre 2025 - Rimodulazione degli importi relativi alle voci di spesa - Rimodulazione del Cronoprogramma delle attività e del Cronoprogramma finanziario per anno	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 2441 in data 23 giugno 2025) - Approvazione da parte del DPCOES in data 9 luglio 2025 (trasmessa al Tavolo dei Sottoscrittori per informativa)

▪ **Intervento "Riorganizzazione TPL – Trasporto a chiamata (MB.1)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	15 febbraio 2023	- Articolazione dell'Intervento in 2 azioni: servizio scolastico (periodo 15 settembre/15 giugno) e servizio a chiamata estivo - Riduzione del costo dell'Intervento - Variazione del CUP per errore materiale - Inserimento del Comune di Cogne nella <i>"Localizzazione dell'intervento"</i> - Revisione descrizione delle voci di spesa - Slittamento data di conclusione Intervento al 30.09.2025 - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 497 del 20 febbraio 2023) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 8296 del 21.03.2023) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 16009 del 19.05.2023)

Seconda modifica	22 dicembre 2023	/	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 59 del 09 gennaio 2024) - Tale proposta di modifica (rispetto alla quale il TdS non si era ancora espresso) è stata integrata dalla proposta del 18.06.2024 che, pertanto, include anche le modifiche di questa proposta
Terza modifica	17 giugno 2024	- Eliminazione del riferimento all'Unité Grand-Paradis quale soggetto attuatore e responsabile dell'attuazione/RUP - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 2368 del 18 giugno 2024) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 13114 del 09.07.2024) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 16717 del 12.09.2024)

▪ **Intervento "Riorganizzazione TPL – Corse scolastiche (MB.2)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	22 settembre 2020	- Estensione del servizio di trasporto agli studenti dell'alta Valle di Rhêmes senza incremento della spesa dell'Intervento - Rimodulazione del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 2548 del 2 ottobre 2020) - Trasmissione da parte dell'ACT, per informativa al Tavolo dei Sottoscrittori e presa d'atto, della richiesta di modifica (prot. n. 13042 del 21.10.2020) - ACT comunica che "la nota di presa d'atto non necessita di alcun atto aggiuntivo"
Seconda modifica	1° febbraio 2022	- Proroga data di conclusione Intervento al 31.12.2023 - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 494 del 14 febbraio 2022) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 7607 del 15.04.2022) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 8289 del 21.03.2023)
Terza modifica (risorse CIPESS n. 41/2022)	26 aprile 2023	- Destinazione di euro 100.996,50, derivanti dalla Delibera CIPESS n. 41/2022, per la prosecuzione del servizio fino alla conclusione dell'anno scolastico 2024/25	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 1107 dell'11 maggio 2023) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 21651 dell'11.07.2023) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 32577 del 20.11.2023)

Quarta modifica	30 giugno 2025	- Proroga data di conclusione dell'Intervento al 31.12.2026 - Rimodulazione del Cronoprogramma delle attività e del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 2794 del 11 luglio 2025) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata dal DPCOES (prot. n. 18052-P del 4 settembre 2025) - Approvazione comunicata da DPCOES (prot. n. 18341-P del 10 settembre 2025) a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per materia
-----------------	----------------	---	---

▪ **Intervento "Mobilità sostenibile Grand-Paradis (MB.3)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	22 settembre 2021	- Proroga data di conclusione Intervento al 31.12.2022 - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 2997 del 29 settembre 2021) - Questa prima richiesta di modifica è stata annullata e sostituita dalla seconda richiesta di modifica, di seguito riportata
Seconda modifica	1° febbraio 2022	- Proroga data di conclusione Intervento al 30.07.2023 - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 468 del 10 febbraio 2022) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 7607 del 15.04.2022) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 8289 del 21.03.2023)
Terza modifica (risorse CIPESS n. 41/2022)	26 aprile 2023	- Destinazione di euro 125.247,00, derivanti dalla Delibera CIPESS n. 41/2022, per far fronte all'aumento dei prezzi per l'acquisto dei mezzi elettrici previsti - Proroga data di conclusione Intervento al 30.06.2025	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 1107 dell'11 maggio 2023) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 21651 dell'11.07.2023) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 32577 del 20.11.2023)
Quarta modifica	30 giugno 2025	- Proroga data di conclusione dell'Intervento al 30.06.2027 - Stralcio dell'installazione di due postazioni di ricarica nei Comuni di Valgrisenche e Saint-Nicolas - Stralcio dell'acquisto di un minibus per il Comune di Cogne, per l'impossibilità di trovare un mezzo con le caratteristiche richieste - Acquisto di ulteriori veicoli elettrici da utilizzare da parte del Comune di Cogne e dell'Unité Grand-Paradis	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 2794 del 11 luglio 2025) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata dal DPCOES (prot. n. 18052-P del 4 settembre 2025) - Approvazione comunicata da DPCOES (prot. n. 18341-P del 10 settembre 2025) a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per materia

		- Rimodulazione del Cronoprogramma delle attività e del Cronoprogramma finanziario	
--	--	--	--

▪ **Intervento "Supporto nella definizione e nell'attuazione della Strategia dell'Area Grand-Paradis (AT.1)"**

Modifiche	Data invio richiesta da parte del Beneficiario	Oggetto della modifica	Iter di condivisione
Prima modifica	1° febbraio 2022	- Inserimento di una nuova voce di spesa - Proroga data di conclusione Intervento al 30.09.2024 - Rimodulazione Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 471 del 10 febbraio 2022) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 7607 del 15.04.2022) - Approvazione comunicata da ACT (prot. n. 8289 del 21.03.2023)
Seconda modifica	26 aprile 2023	- Destinazione di euro 56.506,50, derivanti dalla Delibera CIPESS n. 41/2022, a copertura del costo del personale a tempo indeterminato (fino alla fine del 2024) e per l'assunzione di una ulteriore unità di personale per 10 mesi	- Invio richiesta a ACT (prot. n. 1107 dell'11 maggio 2023) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata da ACT (prot. n. 21651 dell'11.07.2023) - Approvazione comunicata da DPCOES (prot. n. 10660 del 05.06.2024)
Terza modifica	30 giugno 2025	- Proroga data di conclusione dell'Intervento al 31.07.2027 - Utilizzo delle economie di spesa generate al fine di integrare le risorse finanziarie destinate a coprire il costo del personale dipendente dedicato all'attuazione della Strategia d'Area e dei progetti a essa complementari - Rimodulazione del cronoprogramma delle attività e del Cronoprogramma finanziario	- Invio richiesta a DPCOES (prot. n. 2794 del 11 luglio 2025) - Consultazione Tavolo sottoscrittori avviata dal DPCOES (prot. n. 18052-P del 4 settembre 2025) - Approvazione comunicata da DPCOES (prot. n. 18341-P del 10 settembre 2025)

Nella seguente Tabella 2 si riporta il raffronto tra la copertura finanziaria iniziale dell'APQ e quella al 31.12.2025², sia per quanto concerne i dati complessivi (che registrano una diminuzione di circa 2,9 milioni di euro, pari a -6,2%), sia per quelli riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis (che registrano un incremento di circa 64 mila euro, pari al +0,8%).

² Rimangono quindi escluse le variazioni derivanti dalle modifiche approvate dopo il 31.12.2025 o il cui iter di approvazione non risulti ancora concluso.

Tabella 2: Raffronto tra la copertura finanziaria iniziale dell'APQ e quella al 31.12.2025

Fonti di finanziamento	Copertura finanziaria complessiva			Copertura finanziaria Area interna Grand-Paradis		
	iniziale	al 31.12.2025	Variazione %	iniziale	al 31.12.2025	Variazione %
Risorse statali per i Servizi essenziali - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, commi 674 e 675	3.740.000,00	3.740.000,00	-	3.740.000,00	3.740.000,00	-
Risorse statali integrative per i Servizi essenziali - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 314	-	300.000,00	non quantificabile	-	300.000,00	non quantificabile
Risorse aggiuntive regionali per i Servizi essenziali	425.167,00	218.899,40	- 48,5	425.167,00	218.899,40	- 48,5
Risorse aggiuntive Enti locali per i Servizi essenziali	10.143,50	10.143,50	-	10.143,50	10.143,50	-
Risorse aggiuntive Azienda USL della Valle d'Aosta per i Servizi essenziali	1.063.156,50	1.063.156,50	-	-	-	-
Risorse aggiuntive Privati per i Servizi essenziali	18.000,00	-	- 100,0	18.000,00	-	- 100,0
Subtotale Servizi essenziali	5.256.467,00	5.332.199,40	1,4	4.193.310,50	4.269.042,90	1,8
Programma operativo complementare (POC) 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)	285.003,60	692.235,21	142,9	100.000,00	25.845,88	- 74,2
Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR)	41.400.434,75	37.998.412,71	- 8,2	2.836.042,00	2.898.525,77	2,2
Subtotale Sviluppo locale	42.185.438,35	39.190.647,92	- 7,1	3.436.042,00	3.424.371,65	- 0,3
Totale	47.441.905,35	44.522.847,32	- 6,2	7.629.352,50	7.693.414,55	0,8

3. STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Il monitoraggio degli Interventi riconducibili all'APQ "Area interna Grand-Paradis" è assicurato, a livello regionale, attraverso i seguenti sistemi informativi:

- Sistema informativo regionale denominato "SISPREG2014" (accreditato presso il SNM), per gli Interventi sui servizi essenziali afferenti al Programma "Strategia Aree interne Regione Valle d'Aosta – Linea Grand-Paradis", per gli Interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi e per gli Interventi di sviluppo locale afferenti ai Programmi POC e FSE 2014/20;
- Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), per gli Interventi di sviluppo locale afferenti al Programma FEASR 2014/22.

In generale, SISPREG2014 consente la gestione informatizzata delle procedure e delle attività, a livello di Programma e di singolo Progetto, da parte di tutti i soggetti coinvolti ed è deputato, fra l'altro, alla trasmissione bimestrale, al SNM dell'IGRUE, delle informazioni previste dall'apposito Protocollo unico di colloquio.

Si riportano, di seguito, le principali criticità riscontrate nell'alimentazione della BDU dell'IGRUE:

- a seguito dell'aggiornamento del "Documento tecnico per il monitoraggio della SNAI" (trasMESSO dall'IGRUE con nota prot. n. 277366, in data 4 novembre 2021) è emerso l'obbligo di associare al Progetto un indicatore di risultato comune (TC42), a differenza di quanto previsto dalla lettera dell'IGRUE prot. n. 198959, in data 3 novembre 2017 che, invece, prevedeva di associare al Progetto almeno un indicatore scelto tra quelli presenti in una delle due Tabelle di contesto "TC42-Indicatori di Risultato comuni" e "TC43-Indicatori di Risultato definiti dal Programma"). Pertanto si è reso necessario allineare, per quanto possibile, alle ultime indicazioni dell'IGRUE, gli indicatori dei progetti riconducibili all'APQ "Area interna Grand-Paradis", che erano stati inseriti inizialmente rispettando le specifiche della lettera dell'IGRUE del 3 novembre 2017³;
- per il Programma FSE 2014/20 non è stato possibile recepire quanto previsto dalla nota RGS-IGRUE prot. n. 214939 del 4 ottobre 2024, in quanto i Progetti risultavano già conclusi, come già condiviso nel corso dell'incontro bilaterale tra il DPCOES e il Dipartimento politiche strutturali e affari europei (ora Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili), avvenuto in videoconferenza in data 21 ottobre 2025;
- per il Programma FEASR 2014/22 non è stato recepito quanto previsto dalla nota indicata al punto precedente, in quanto non è stato possibile implementare SIAN con i campi "Progetto complesso" e "Strumento attuativo" necessari per ricondurre i Progetti alla SNAI; così come non è stato possibile inserire gli indicatori di output "SNAI_VDA_AI1" e "SNAI_VDA_AI2", presenti nella tabella di contesto TC45, al fine di misurare l'avanzamento finanziario della quota SNAI nell'Area interna di riferimento.

Per quanto concerne i 25 Interventi previsti nell'Area interna Grand-Paradis, al 31 dicembre 2025, con riferimento alla sola quota riferita alla stessa, laddove trattasi di interventi estesi all'intero territorio regionale, si evidenzia che:

3 A titolo esemplificativo, per l'Intervento FSE "SL.2.3 – Interventi di animazione territoriale per la diffusione della cultura d'impresa", ciò non è stato possibile, in quanto l'Intervento si è concluso molto prima dell'aggiornamento delle disposizioni dell'IGRUE del 4 novembre 2021.

- 7 Interventi risultano in fase di attuazione (IS.1, SN.1, SN.2, MB.1, MB.2, MB.3 e AT.1), con differenti gradi di avanzamento e problematiche, come meglio evidenziato nel prosieguo della Relazione;
- 12 Interventi risultano conclusi (IS.2, IS.3, SN.3, BL.1, SL.1, SL.2.1, SL.2.2, SL.3.1, SL.3.2, SL.3.5, SL.3.7 e SL.3.9);
- 6 Interventi risultano non attuabili, di cui 1 riconducibile all'Azione portante "F – Formazione per la crescita del potenziale umano" (SL.2.3) e 5 all'Azione portante "G – Sviluppo produttivo e valorizzazione di una montagna sostenibile" (SL.3.3, SL.3.4, SL.3.6, SL.3.8 e SL.3.10).

Al 31 dicembre 2025, quindi, risultano in fase di attuazione 7 Interventi (IS.1, SN.1, SN.2, MB.1, MB.2, MB.3 e AT.1) rispetto ai 10 previsti nell'ambito dei servizi essenziali di cittadinanza (istruzione, sanità e mobilità). Alla stessa data, per gli Interventi riconducibili allo sviluppo locale si registra la presentazione, nella sola Area interna Grand-Paradis, di 43 progetti, di cui 36 approvati (cfr. Tabella 3).

Tabella 3: Progetti derivanti dagli Interventi di sviluppo locale per Programma, al 31.12.2025


Programma	Progetti presentati	Progetti in istruttoria	Progetti non approvati	Progetti approvati	Tasso di approvazione
Totale complessivo					
Programma operativo complementare (POC) 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta	1	0	0	1	100,0%
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)	23	0	2	21	91,3%
Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR)	793	0	155	638	80,5%
Totale	817	0	157	660	80,8%
di cui Area interna Grand-Paradis					
Programma operativo complementare (POC) 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta	1	0	0	1	100,0%
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)	5	0	2	3	60,0%
Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR)	37	0	5	32	86,5%
Totale	43	0	7	36	83,7%

Con riferimento all'avanzamento finanziario dell'APQ per anno (cfr. Grafico 1, all'interno del quale sono rappresentati i soli dati di attuazione relativi all'Area interna Grand-Paradis), si evidenziano le seguenti variazioni rilevate raffrontando i dati degli indicatori finanziari al 31 dicembre 2025 con quelli relativi all'anno precedente, le cui definizioni sono riportate nella Nota metodologica inserita all'inizio di questa Relazione:

- lieve flessione (-1%) della dotazione finanziaria dell'APQ (pari, in valore assoluto, a circa -80 mila euro), passata dai 7,77 milioni di euro al 31.12.2024 ai 7,69 milioni di euro al 31.12.2025, a causa della riduzione della dotazione su 3 Interventi (SL.2.2, SL.3.1 e SL.3.9) a seguito delle operazioni di chiusura finanziaria degli stessi;
- marginale contrazione del finanziamento e del costo ammesso (per entrambi -0,9% e -67 mila euro), pressoché per le stesse ragioni riportate al punto precedente;
- crescita dell'11,8% degli impegni e del 10,7% degli impegni ammessi, che si attestano così, rispettivamente, a 6,7 milioni di euro (+714 mila euro) e a 6,6 milioni di euro (+641 mila euro);

- deciso incremento dei pagamenti (+32,2%), che raggiungono i 6,6 milioni di euro (+1,6 milioni di euro). Il *trend* è in linea con la crescita dei pagamenti ammessi (+31,1%), che si attestano a 6,5 milioni di euro (+1,5 milioni di euro).

Grafico 1: Avanzamento finanziario dell'APQ per anno (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis)

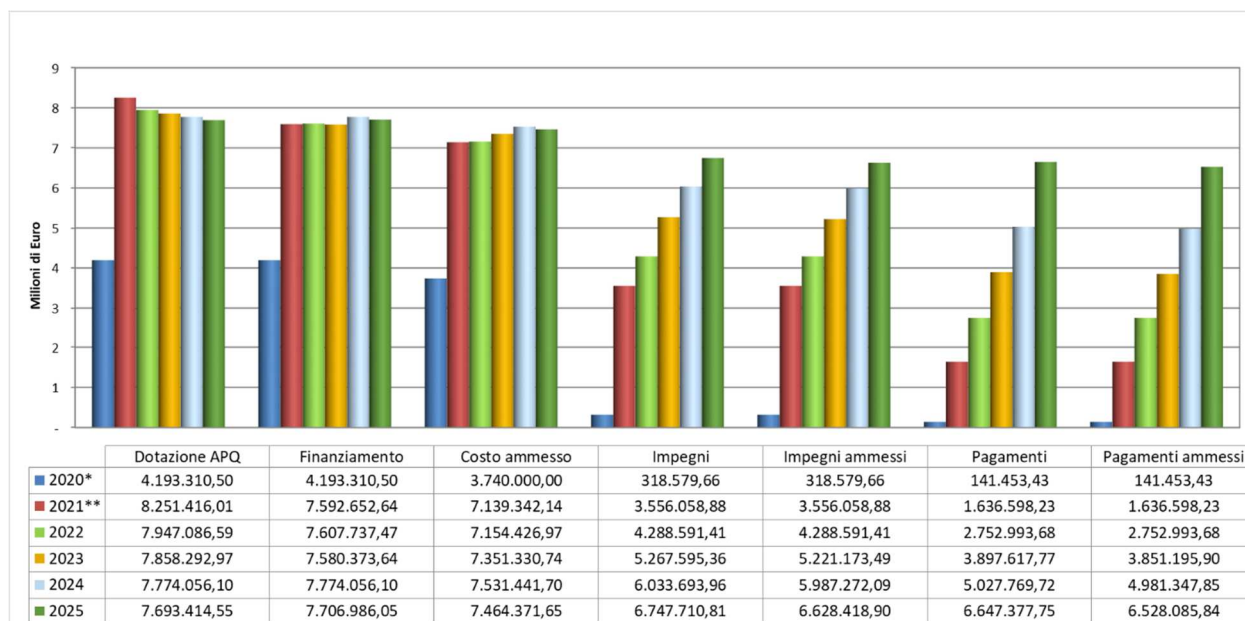

* Al 31.12.2020 erano disponibili i soli dati di attuazione finanziaria relativi agli Interventi riconducibili ai servizi essenziali.

** Dal 31.12.2021 vi è la disponibilità di tutti i dati di attuazione finanziaria.

Ai fini del monitoraggio dell'avanzamento finanziario dell'APQ, appare utile effettuare un raffronto tra l'avanzamento percentuale dei principali indicatori finanziari (Finanziamento, Impegni e Pagamenti) rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025⁴, che rappresenta il valore di riferimento che, gradualmente, dovrebbe essere raggiunto dagli Impegni e dai Pagamenti.

Nei grafici che seguono sono rappresentati – con riferimento ai soli dati riconducibili all'Area interna Grand-Paradis – sia l'avanzamento percentuale dei principali indicatori finanziari rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31 dicembre 2025, sia la Capacità di impegno e di spesa, in relazione alla Tipologia degli interventi (cfr. grafici 2 e 3), ai Programmi di riferimento (cfr. grafici 4 e 5), alle Azioni portanti (cfr. grafici 6 e 7) e ai Settori di intervento dei Progetti relativi ai servizi essenziali (cfr. grafici 8 e 9).

4 Si è preferito utilizzare questo indicatore, piuttosto che la Dotazione iniziale dell'APQ, al fine di rapportare i singoli indicatori alla dotazione finanziaria più aggiornata.

Grafico 2: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per tipologia degli interventi (servizi essenziali e sviluppo locale), rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis)

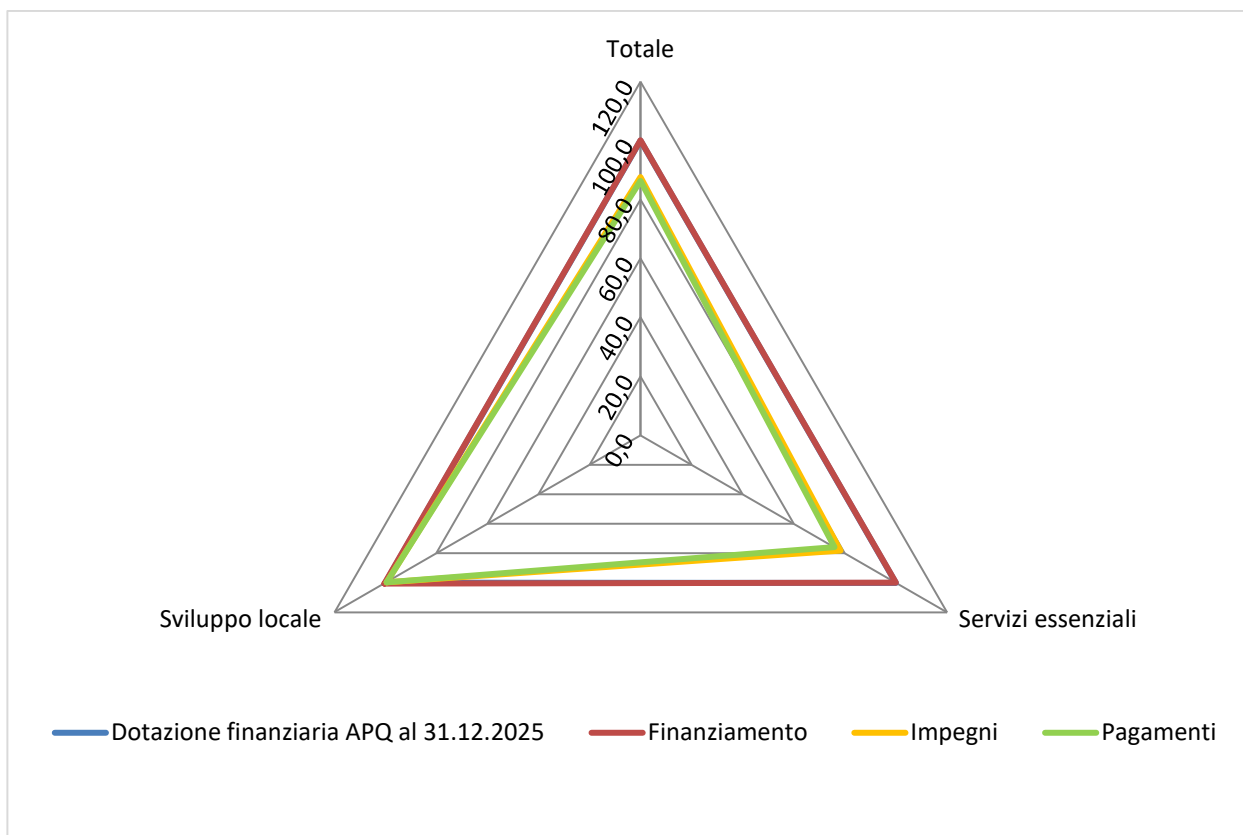


Grafico 3: Capacità di impegno e di spesa degli interventi (servizi essenziali e sviluppo locale) riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis)

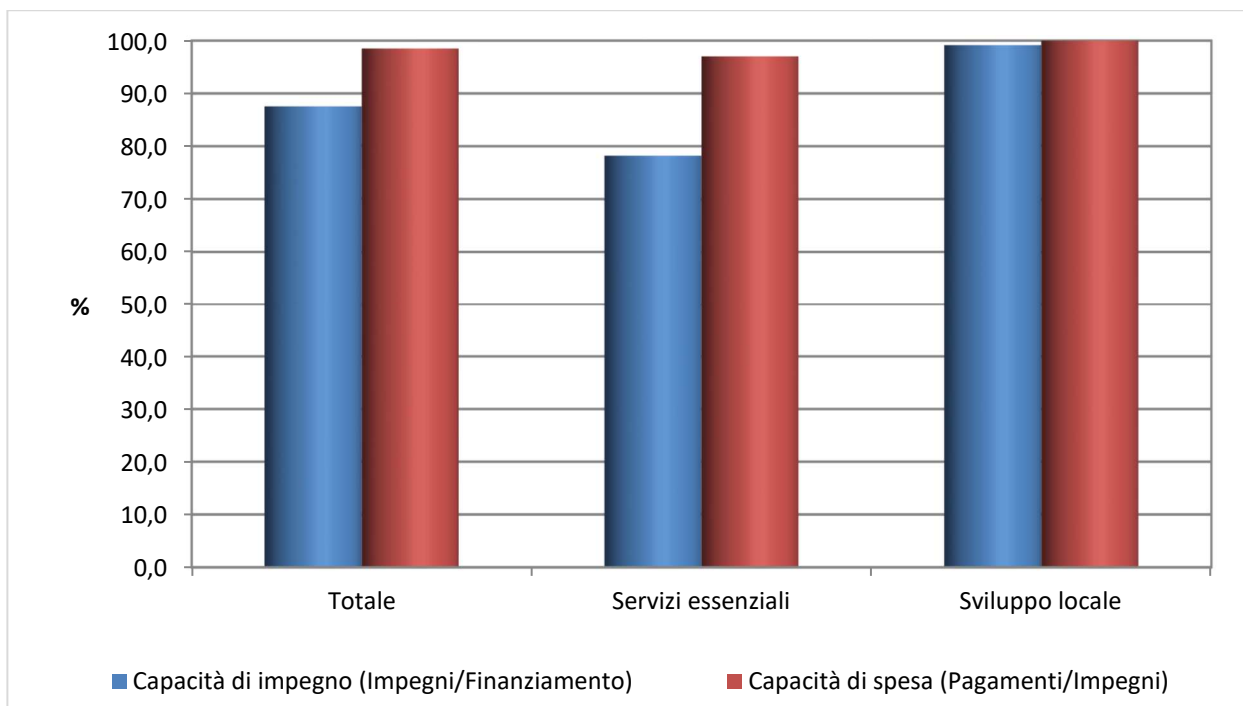


Grafico 4: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per Programma, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis)

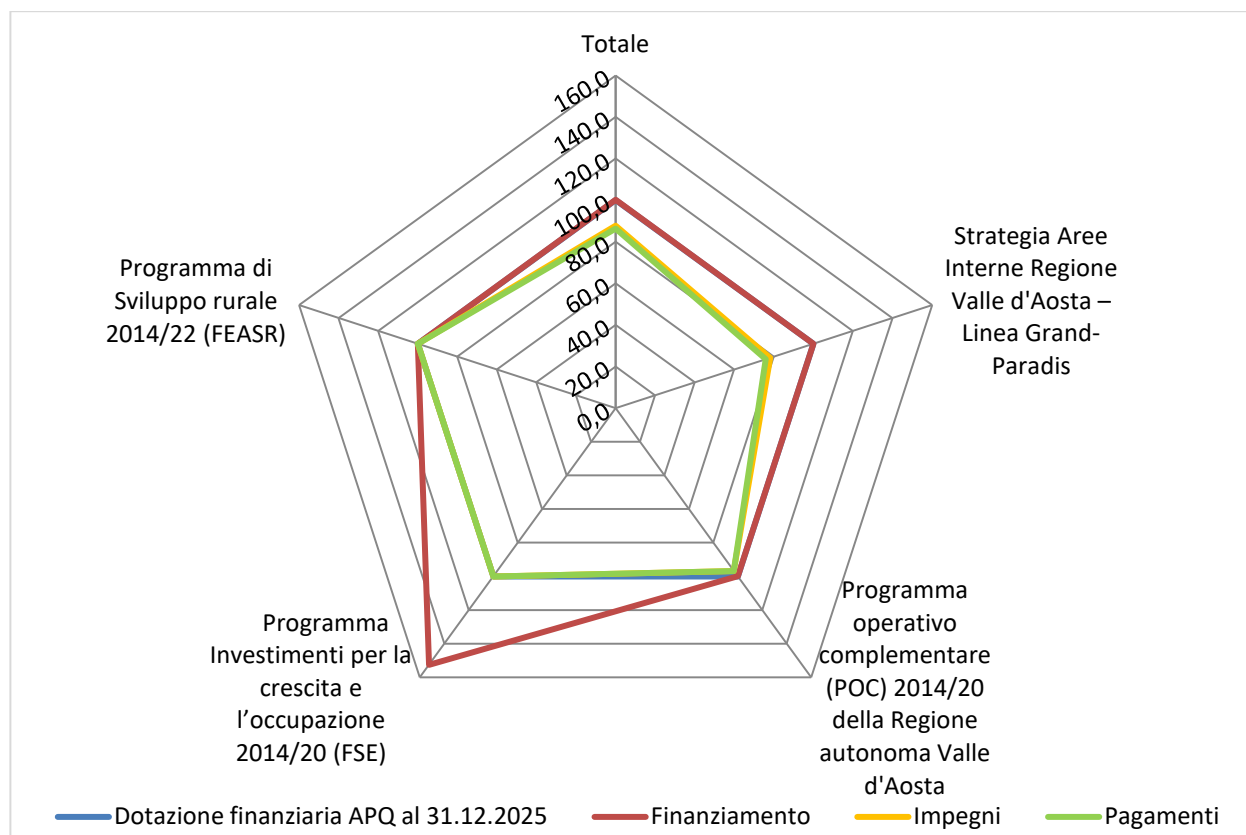


Grafico 5: Capacità di impegno e di spesa dei Programmi riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis)

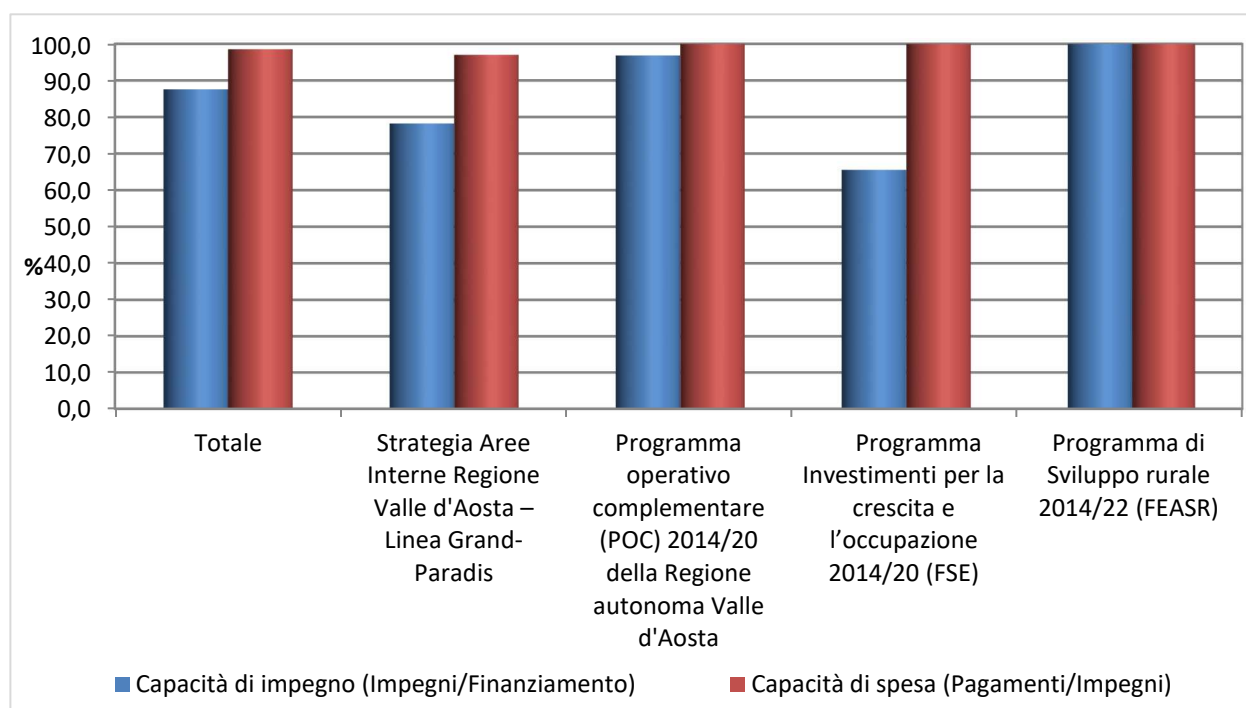


Grafico 6: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per Azione portante, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis)

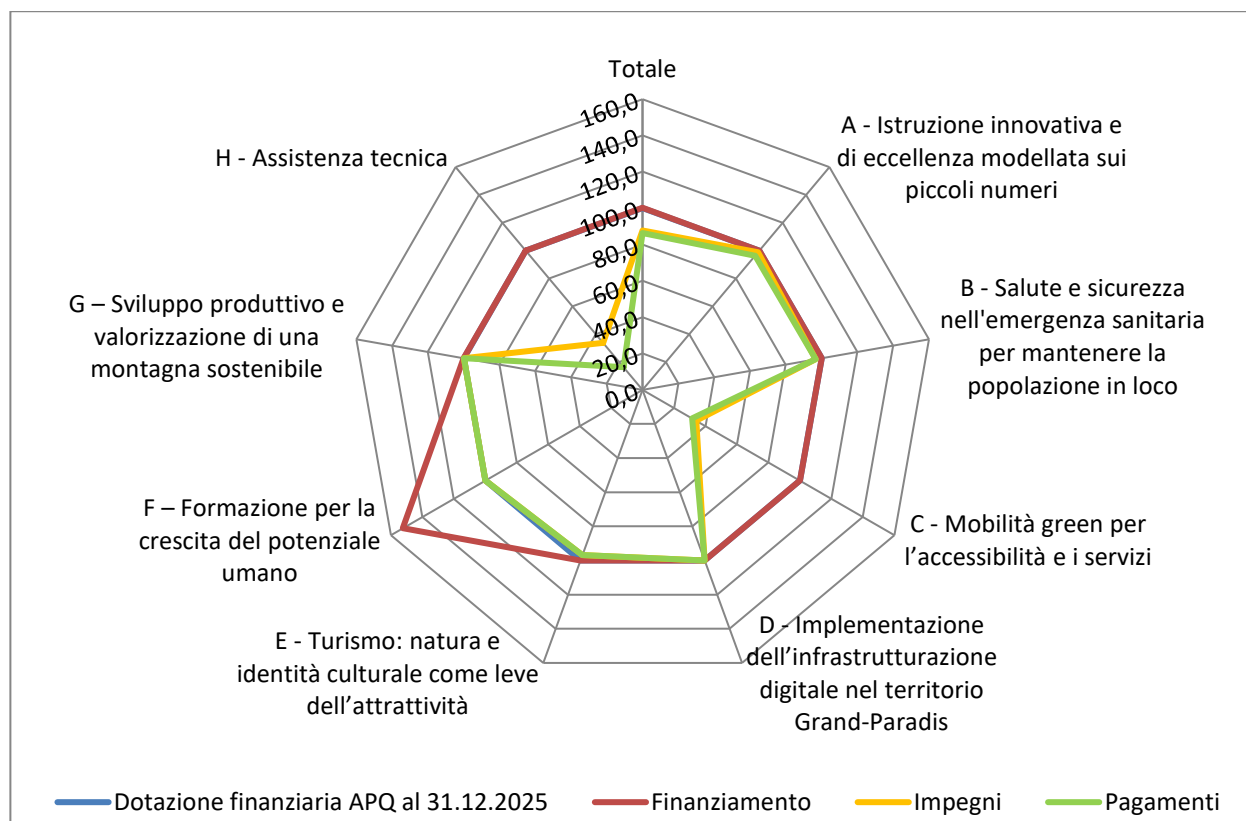


Grafico 7: Capacità di impegno e di spesa delle Azioni portanti riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis)

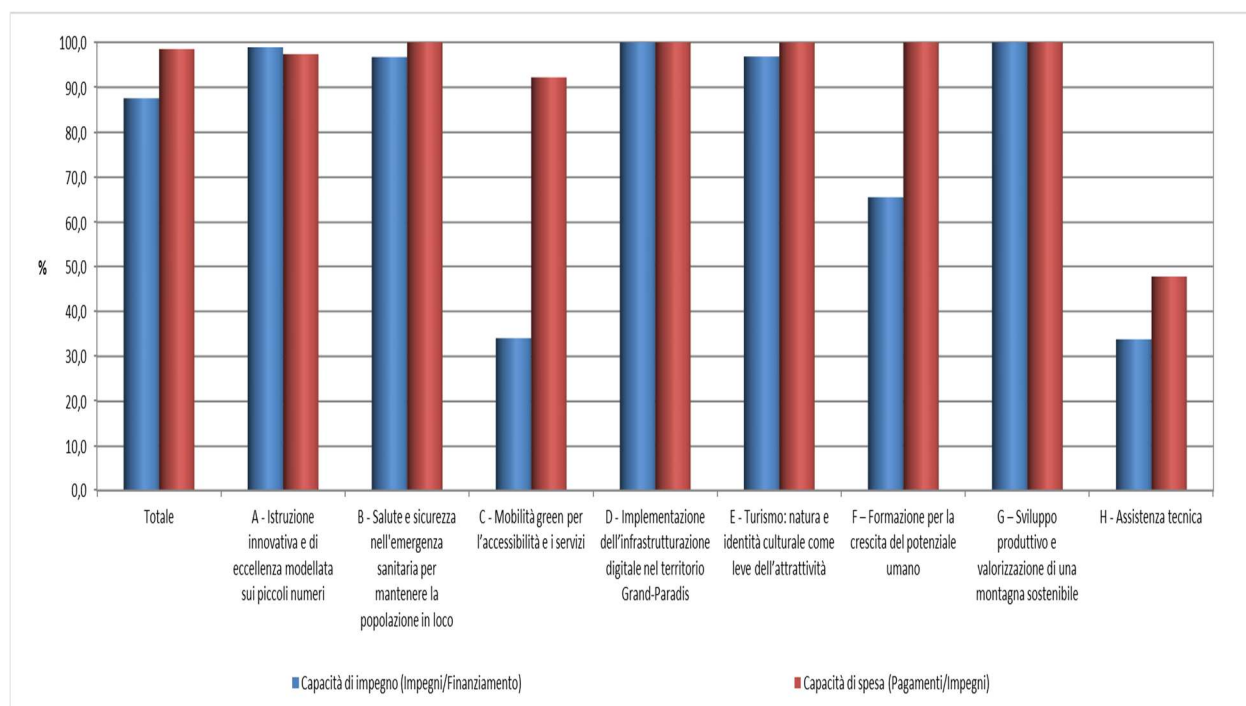


Grafico 8: Percentuale di avanzamento finanziario dell'APQ per i Settori di intervento degli Interventi relativi ai servizi essenziali, rispetto alla dotazione finanziaria dell'APQ al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis)


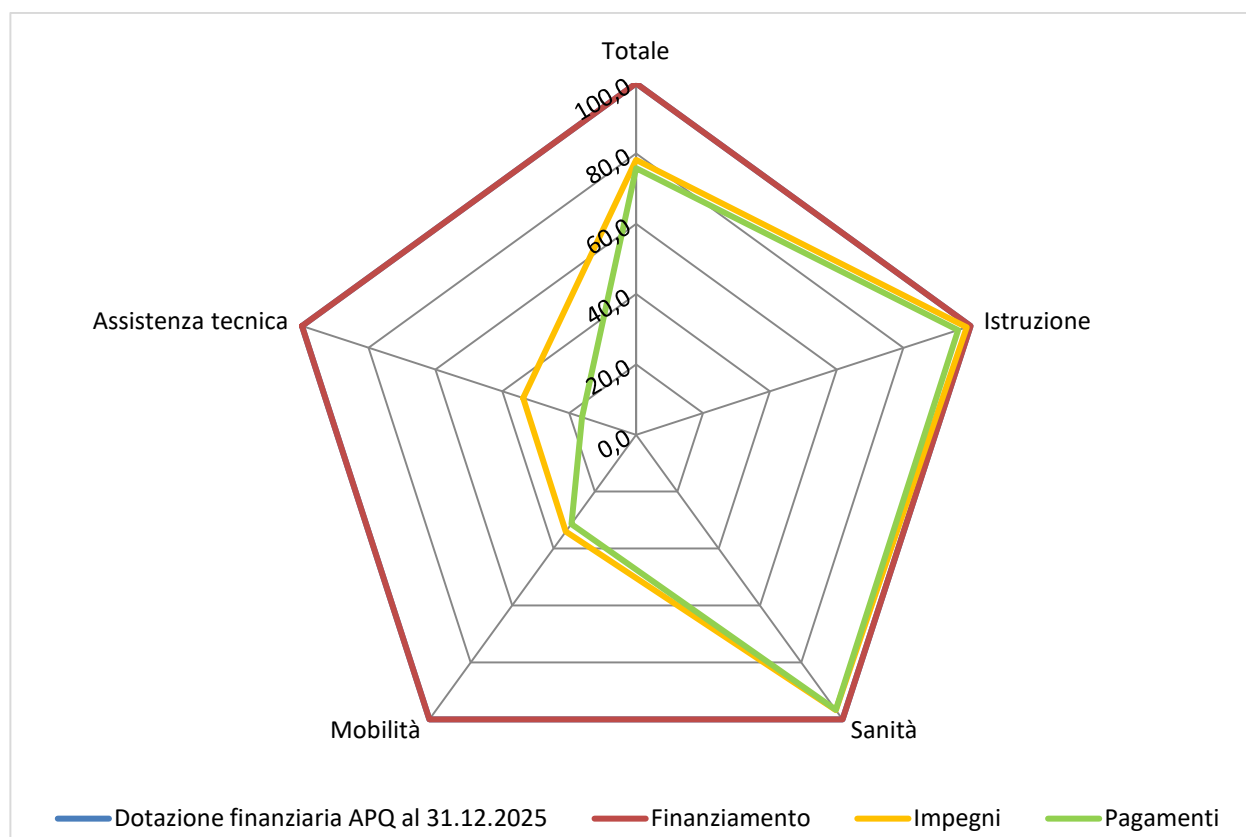


Grafico 9: Capacità di impegno e di spesa dei Settori di intervento degli Interventi relativi ai servizi essenziali riconducibili all'APQ, al 31.12.2025 (dati riferiti alla sola Area interna Grand-Paradis)

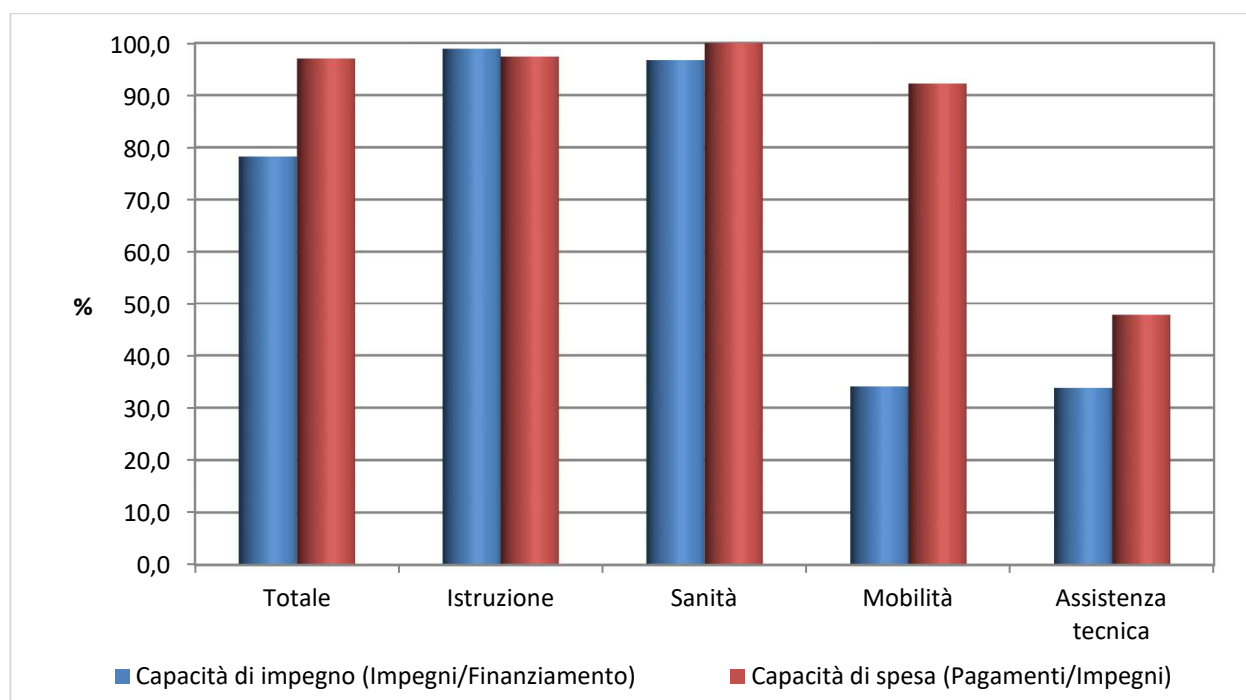

Si riportano, di seguito, le tabelle concernenti l'avanzamento finanziario dell'APQ al 31.12.2025, in relazione alla **Tipologia degli interventi** (cfr. Tabella 4), ai **Programmi di riferimento** (cfr. Tabella 5), alle **Azioni portanti** (cfr. Tabella 6) e ai **Settori di intervento** degli Interventi relativi ai servizi essenziali (cfr. Tabella 7). I dati sono riferiti sia al costo complessivo degli Interventi, sia al costo degli stessi nella sola Area interna Grand-Paradis.

Tabella 4: Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Grand-Paradis" per tipologia degli interventi (servizi essenziali e sviluppo locale), al 31.12.2025

Tipologia interventi	Dotazione finanziaria iniziale APQ	Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2025	Numero Progetti				Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
			Presentati	In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Servizi essenziali												
Totale	5.256.467,00	5.332.199,40	10	0	0	10	5.332.199,40	4.040.000,00	4.358.106,46	3.219.893,21	4.257.725,91	3.119.743,56
di cui Area interna Grand-Paradis	4.193.310,50	4.269.042,90	10	0	0	10	4.269.042,90	4.040.000,00	3.339.185,12	3.219.893,21	3.239.035,47	3.119.743,56
Sviluppo locale												
Totale	42.185.438,35	39.190.647,92	817	0	157	660	39.229.288,71	39.190.647,92	39.174.801,96	39.174.801,96	39.159.150,51	39.159.150,51
di cui Area interna Grand-Paradis	3.436.042,00	3.424.371,65	43	0	7	36	3.437.943,15	3.424.371,65	3.408.525,69	3.408.525,69	3.408.342,28	3.408.342,28
Totale complessivo												
Totale	47.441.905,35	44.522.847,32	827	0	157	670	44.561.488,11	43.230.647,92	43.532.908,42	42.394.695,17	43.416.876,42	42.278.894,07
di cui Area interna Grand-Paradis	7.629.352,50	7.693.414,55	53	0	7	46	7.706.986,05	7.464.371,65	6.747.710,81	6.628.418,90	6.647.377,75	6.528.085,84

Tabella 5: Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Grand-Paradis" per Programma, al 31.12.2025

Programma	Dotazione finanziaria iniziale APQ	Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2025	Numero Progetti				Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
			Presentati	In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Strategia Aree Interne Regione Valle d'Aosta – Linea Grand-Paradis (2018AREAINVALD)												
Totale	5.256.467,00	5.332.199,40	10	0	0	10	5.332.199,40	4.040.000,00	4.358.106,46	3.219.893,21	4.257.725,91	3.119.743,56
di cui Area interna Grand-Paradis	4.193.310,50	4.269.042,90	10	0	0	10	4.269.042,90	4.040.000,00	3.339.185,12	3.219.893,21	3.239.035,47	3.119.743,56
Programma operativo complementare (POC) 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta – (POCVALLAOSTA)												
Totale	500.000,00	500.000,00	1	0	0	1	500.000,00	500.000,00	484.154,04	484.154,04	483.970,63	483.970,63
di cui Area interna Grand-Paradis	500.000,00	500.000,00	1	0	0	1	500.000,00	500.000,00	484.154,04	484.154,04	483.970,63	483.970,63
Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE) – (2014IT05SFOP011)												
Totale	285.003,60	692.235,21	23	0	2	21	730.876,00	692.235,21	692.235,21	692.235,21	692.235,21	692.235,21
di cui Area interna Grand-Paradis	100.000,00	25.845,88	5	0	2	3	39.417,38	25.845,88	25.845,88	25.845,88	25.845,88	25.845,88
Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR) – (2014IT06RDRP013)												
Totale	41.400.434,75	37.998.412,71	793	0	155	638	37.998.412,71	37.998.412,71	37.998.412,71	37.998.412,71	37.982.944,67	37.982.944,67
di cui Area interna Grand-Paradis	2.836.042,00	2.898.525,77	37	0	5	32	2.898.525,77	2.898.525,77	2.898.525,77	2.898.525,77	2.898.525,77	2.898.525,77
Totale complessivo												
Totale	47.441.905,35	44.522.847,32	827	0	157	670	44.561.488,11	43.230.647,92	43.532.908,42	42.394.695,17	43.416.876,42	42.278.894,07
di cui Area interna Grand-Paradis	7.629.352,50	7.693.414,55	53	0	7	46	7.706.986,05	7.464.371,65	6.747.710,81	6.628.418,90	6.647.377,75	6.528.085,84

Tabella 6: Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Grand-Paradis" per Azione portante, al 31.12.2025

Azione portante	Dotazione finanziaria iniziale APQ	Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2025	Numero Progetti				Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
			Presentati	In istruttoria	Non approvati	Approvati						
A - Istruzione innovativa e di eccellenza modellata sui piccoli numeri												
Totale	1.122.909,00	1.122.159,00	3	0	0	3	1.122.159,00	1.122.159,00	1.109.772,24	1.109.772,24	1.080.693,45	1.080.693,45
di cui Area interna Grand-Paradis	1.122.909,00	1.122.159,00	3	0	0	3	1.122.159,00	1.122.159,00	1.109.772,24	1.109.772,24	1.080.693,45	1.080.693,45
B - Salute e sicurezza nell'emergenza sanitaria per mantenere la popolazione in loco												
Totale	2.912.000,00	2.912.000,00	3	0	0	3	2.912.000,00	1.838.700,00	2.806.939,01	1.777.874,68	2.806.572,44	1.777.739,01
di cui Area interna Grand-Paradis	1.848.843,50	1.848.843,50	3	0	0	3	1.848.843,50	1.838.700,00	1.788.017,67	1.777.874,68	1.787.882,00	1.777.739,01
C - Mobilità green per l'accessibilità e i servizi												
Totale	1.034.558,00	1.054.533,90	3	0	0	3	1.054.533,90	835.634,50	359.083,66	249.934,74	331.173,65	222.024,73
di cui Area interna Grand-Paradis	1.034.558,00	1.054.533,90	3	0	0	3	1.054.533,90	835.634,50	359.083,66	249.934,74	331.173,65	222.024,73
D - Implementazione dell'infrastrutturazione digitale nel territorio Grand-Paradis												
Totale	5.784.424,00	5.784.424,00	1	0	0	1	5.784.424,00	5.784.424,00	5.784.424,00	5.784.424,00	5.768.955,96	5.768.955,96
di cui Area interna Grand-Paradis	466.042,00	469.687,61	1	0	0	1	469.687,61	469.687,61	469.687,61	469.687,61	469.687,61	469.687,61
E - Turismo: natura e identità culturale come leve dell'attrattività												
Totale	500.000,00	500.000,00	1	0	0	1	500.000,00	500.000,00	484.154,04	484.154,04	483.970,63	483.970,63
di cui Area interna Grand-Paradis	500.000,00	500.000,00	1	0	0	1	500.000,00	500.000,00	484.154,04	484.154,04	483.970,63	483.970,63
F – Formazione per la crescita del potenziale umano												
Totale	285.003,60	692.235,21	23	0	2	21	730.876,00	692.235,21	692.235,21	692.235,21	692.235,21	692.235,21
di cui Area interna Grand-Paradis	100.000,00	25.845,88	5	0	2	3	39.417,38	25.845,88	25.845,88	25.845,88	25.845,88	25.845,88
G – Sviluppo produttivo e valorizzazione di una montagna sostenibile												
Totale	35.616.010,75	32.213.988,71	792	0	155	637	32.213.988,71	32.213.988,71	32.213.988,71	32.213.988,71	32.213.988,71	32.213.988,71
di cui Area interna Grand-Paradis	2.370.000,00	2.428.838,16	36	0	5	31	2.428.838,16	2.428.838,16	2.428.838,16	2.428.838,16	2.428.838,16	2.428.838,16
H - Assistenza tecnica												
Totale	187.000,00	243.506,50	1	0	0	1	243.506,50	243.506,50	82.311,55	82.311,55	39.286,37	39.286,37
di cui Area interna Grand-Paradis	187.000,00	243.506,50	1	0	0	1	243.506,50	243.506,50	82.311,55	82.311,55	39.286,37	39.286,37
Totale complessivo												
Totale	47.441.905,35	44.522.847,32	827	0	157	670	44.561.488,11	43.230.647,92	43.532.908,42	42.394.695,17	43.416.876,42	42.278.894,07
di cui Area interna Grand-Paradis	7.629.352,50	7.693.414,55	53	0	7	46	7.706.986,05	7.464.371,65	6.747.710,81	6.628.418,90	6.647.377,75	6.528.085,84

Tabella 7: Avanzamento finanziario dell'APQ "Area interna Grand-Paradis" per i Settori di intervento degli Interventi relativi ai servizi essenziali, al 31.12.2025

Settore di intervento	Dotazione finanziaria iniziale APQ	Dotazione finanziaria APQ al 31.12.2025	Numero Progetti				Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
			Presentati	In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Istruzione												
Totale	1.122.909,00	1.122.159,00	3	0	0	3	1.122.159,00	1.122.159,00	1.109.772,24	1.109.772,24	1.080.693,45	1.080.693,45
di cui Area interna Grand-Paradis	1.122.909,00	1.122.159,00	3	0	0	3	1.122.159,00	1.122.159,00	1.109.772,24	1.109.772,24	1.080.693,45	1.080.693,45
Sanità												
Totale	2.912.000,00	2.912.000,00	3	0	0	3	2.912.000,00	1.838.700,00	2.806.939,01	1.777.874,68	2.806.572,44	1.777.739,01
di cui Area interna Grand-Paradis	1.848.843,50	1.848.843,50	3	0	0	3	1.848.843,50	1.838.700,00	1.788.017,67	1.777.874,68	1.787.882,00	1.777.739,01
Mobilità												
Totale	1.034.558,00	1.054.533,90	3	0	0	3	1.054.533,90	835.634,50	359.083,66	249.934,74	331.173,65	222.024,73
di cui Area interna Grand-Paradis	1.034.558,00	1.054.533,90	3	0	0	3	1.054.533,90	835.634,50	359.083,66	249.934,74	331.173,65	222.024,73
Assistenza tecnica												
Totale	187.000,00	243.506,50	1	0	0	1	243.506,50	243.506,50	82.311,55	82.311,55	39.286,37	39.286,37
di cui Area interna Grand-Paradis	187.000,00	243.506,50	1	0	0	1	243.506,50	243.506,50	82.311,55	82.311,55	39.286,37	39.286,37
Totale complessivo												
Totale	5.256.467,00	5.332.199,40	10	0	0	10	5.332.199,40	4.040.000,00	4.358.106,46	3.219.893,21	4.257.725,91	3.119.743,56
di cui Area interna Grand-Paradis	4.193.310,50	4.269.042,90	10	0	0	10	4.269.042,90	4.040.000,00	3.339.185,12	3.219.893,21	3.239.035,47	3.119.743,56

3.1 Stato di attuazione Interventi finanziati con risorse statali

3.1.1 Istruzione

➤ **Formazione e scambi per scuola di eccellenza Grand-Paradis (IS.1)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 277.925,00 euro a valere sulla l. 23 dicembre 2014, n. 190 (l. stabilità 2015), art. 1, commi 674 e 675. L'importo è stato incrementato di 17.250,00 euro, derivanti dalle risorse integrative previste dalla Delibera CIPESS n. 41/2022, portando il costo complessivo dell'Intervento a 295.175,00 euro.

L'Intervento, avviato a partire dall'anno scolastico 2019/20, è proseguito anche nel corso degli anni scolastici successivi e, nello specifico, per il 2025 nei mesi da gennaio a giugno e da novembre a dicembre.

Nel corso del 2025 sono stati proposti percorsi formativi rivolti al personale docente, al fine di rafforzarne le competenze e la motivazione professionale e di sperimentare nuove modalità di lavoro in ambito didattico. In particolare, il corso dedicato alla didattica digitale ha permesso alle insegnanti partecipanti di acquisire strumenti operativi utili alla progettazione e alla realizzazione di nuovi materiali didattici, successivamente impiegati nelle attività in classe.

Anche per gli alunni sono state proposte attività finalizzate a consolidare le competenze linguistiche, alle quali si sono aggiunte le attività dedicate alla cultura locale, per rafforzare il loro legame con il territorio e approfondire la conoscenza delle tradizioni locali.

Tra le diverse azioni, nell'Intervento era previsto anche l'acquisto di attrezzature informatiche, tra cui le LIM. L'introduzione di questi strumenti nelle scuole coinvolte è stata accolta con favore sia dagli insegnanti sia dagli alunni e ha consentito ai docenti di sperimentare modalità didattiche innovative e coinvolgenti, rendendo le attività in classe più dinamiche e partecipate.

Nel mese di luglio 2025 è stata richiesta una modifica della Scheda intervento concernente la proroga della data di fine Intervento (ora prevista al 30.09.2026), al fine di utilizzare le economie di spesa generate nel corso dell'attuazione dello stesso per la prosecuzione dell'attività di potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni, fino a esaurimento delle risorse finanziarie previste. La richiesta ha riguardato anche lo slittamento dei tempi previsti nel Cronoprogramma delle attività, con la conseguente rimodulazione del Cronoprogramma finanziario per anno.

Le modifiche richieste sono state approvate dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud nel mese di settembre 2025, a seguito della consultazione del Tavolo dei sottoscrittori e dell'acquisizione del parere favorevole del Ministero dell'Istruzione e del Merito, competente per materia (per maggiori informazioni cfr. Capitolo 2).

Nel mese di dicembre 2025 l'ARAI, a seguito di una ricognizione delle esigenze dei Soggetti attuatori/Beneficiari, ha richiesto, per l'Intervento in oggetto, l'erogazione di un'ulteriore anticipazione, pari euro 6.900,00. L'importo richiesto è stato accreditato dalla Banca d'Italia in data 22 dicembre 2025.

L'Intervento formativo è strettamente collegato all'Intervento IS.2 "Ambienti di apprendimento innovativi Gran-Paradis", grazie al quale è stato possibile acquistare la strumentazione

informatica, che ha reso più agevole l'attività di insegnamento di alcune discipline da parte del corpo docenti.

Al 31.12.2025 non sono state segnalate criticità particolari, oltre alle difficoltà già segnalate con le relazioni precedenti e riferite ai primi mesi di attuazione dell'Intervento.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	295.175,00	295.175,00	288.160,00	288.160,00	266.141,30	266.141,30
di cui Area interna GP	295.175,00	295.175,00	288.160,00	288.160,00	266.141,30	266.141,30

➤ **Ambienti di apprendimento innovativi Gran-Paradis (IS.2)**

Dotazione finanziaria da APQ: 730.000,00 euro a valere sulla l. 23 dicembre 2014, n. 190 (l. stabilità 2015), art. 1, commi 674 e 675.

L'Intervento è stato avviato nell'estate del 2020; le attività previste, che si sono concluse nel mese di febbraio 2025, riguardavano il miglioramento degli spazi di apprendimento nelle scuole di montagna, per renderle coerenti con una didattica innovativa, basata sulla riqualificazione energetica e biofilica dell'ambiente, sul benessere degli alunni all'interno dello spazio scolastico e sulle modalità di "fare scuola" in natura e in ambiente biofilico.

A seguito della convenzione siglata tra l'Unité, i Comuni interessati, le Istituzioni scolastiche Maria Ida Viglino e Jean-Baptiste Cerlogne e l'Università della Valle d'Aosta è stato realizzato un progetto di *learning ecosystem*, con l'utilizzo di soluzioni di educazione all'aperto combinate con strumenti di progettazione biofila, al fine di migliorare il recupero dalla fatica mentale e le prestazioni scolastiche degli alunni.

Nel corso del progetto, sono state individuate e realizzate le migliori soluzioni per garantire la creazione di ecosistemi di apprendimento rigenerativi, in particolare nelle scuole di Valgrisenche, Cogne e Saint-Nicolas.

La scuola di Saint-Nicolas è stata oggetto di una riqualificazione, che ha previsto interventi edili di efficientamento energetico, attraverso: la realizzazione di un cappotto termico esterno; la sostituzione dei serramenti; il posizionamento di alcuni sistemi filtranti per la protezione dalla luce solare per le classi con esposizione a sud e a ovest; il rivestimento delle pareti con l'utilizzo di materiale naturale; l'installazione di apparecchi illuminanti a led e di ventilradiator a bassa temperatura. Alla scuola, inoltre, sono stati forniti anche nuovi arredi.

Nell'ambito dell'Intervento sono state, inoltre, acquistate e consegnate le attrezzature informatiche alle scuole di Saint-Nicolas e di Cogne.

Nel mese di aprile 2025 è stato inoltrato il rendiconto delle spese sostenute, ma al 31.12.2025 le operazioni di controllo non erano ancora terminate.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	730.000,00	730.000,00	729.805,70	729.805,70	729.292,86	729.292,86
di cui Area interna GP	730.000,00	730.000,00	729.805,70	729.805,70	729.292,86	729.292,86

➤ **Summer School "Una montagna da imparare" (IS.3)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 96.984,00 euro a valere sulla l. 23 dicembre 2014, n. 190 (l. stabilità 2015), art. 1, commi 674 e 675, e 18.000,00 euro di risorse private, per un totale di 114.984,00 euro. A seguito di una rimodulazione le risorse private, pari a 18.000,00 euro, sono state annullate, portando il costo complessivo dell'Intervento a 96.984,00 euro.

L'Intervento è stato avviato nel 2021 e le attività previste dalla relativa Scheda si sono concluse a novembre 2023. L'Intervento prevedeva la realizzazione, nel triennio 2021/23, di n. 8 "Summer school", della durata di 5 giorni ciascuna, rivolte a ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado facenti parte dei Comuni dell'Area interna Grand-Paradis.

Nei tre anni, dal 2021 al 2023, sono stati realizzati otto soggiorni, ai quali hanno preso parte decine di ragazzi alla scoperta delle attività e delle professioni di montagna con un unico obiettivo: educare alla comprensione del proprio territorio.

Le "Summer school" hanno proposto un programma per potenziare le conoscenze linguistiche, la conoscenza del territorio montano e delle sue professioni e le opportunità lavorative. In ogni soggiorno i partecipanti hanno potuto vivere cinque giorni di apprendimento, svago e relazioni, con un programma innovativo ed esperienziale.

I controlli di 1° livello, a seguito della richiesta di saldo, si sono conclusi nel mese di gennaio 2025 e non sono stati applicati tagli alle spese; il saldo è stato accreditato al Beneficiario nel mese di dicembre 2025, ma le operazioni di chiusura finanziaria dell'Intervento su SISPREG2014 sono avvenute all'inizio dell'anno 2026, pertanto i dati finanziari di seguito riportati non sono ancora definitivi.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	96.984,00	96.984,00	91.806,54	91.806,54	85.259,29	85.259,29
di cui Area interna GP	96.984,00	96.984,00	91.806,54	91.806,54	85.259,29	85.259,29

3.1.2 Salute

➤ **Rafforzamento presidio medico Grand-Paradis (SN.1)**

Dotazione finanziaria da APQ: 1.509.000,00 euro a valere sulla l. 23 dicembre 2014, n. 190 (l. stabilità 2015), art. 1, commi 674 e 675, 10.143,50 euro di risorse dell'Unités des Communes valdôtaines Grand-Paradis e 1.063.156,50 euro di risorse dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, per un totale di 2.582.300,00 euro, di cui 1.519.143,50 attribuibili all'Area interna Grand-Paradis.

L'Intervento è stato avviato a gennaio 2022; le relative attività finanziate con i fondi statali si sono concluse nel mese di giugno 2025, ma le stesse stanno proseguendo attraverso il finanziamento dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Il fine era quello di migliorare il livello di assistenza sanitaria nell'Area interna, in particolare riducendo i tempi di intervento in emergenza-urgenza e portando, il più rapidamente possibile, un'équipe di soccorso sul posto, affinché potesse prestare le prime cure, obiettivi che sono stati raggiunti, così come confermato dal tavolo di monitoraggio per la valutazione in itinere dell'Intervento, costituito da rappresentanti dell'Unité Grand-Paradis, dell'Azienda USL Valle d'Aosta e di ANPAS. Il tavolo si è riunito a marzo 2025 e ha confermato gli obiettivi di miglioramento dei tempi di intervento nell'Area interna (< 33 minuti) e l'integrazione tra questa e il sistema regionale di emergenza-urgenza.

Nel 2025 si sono svolti, inoltre, gli ultimi moduli dei corsi specifici relativi al PTC (Prehospital Trauma Care) e PHTLS® (Prehospital Trauma Life Support), destinati all'accrescimento delle competenze degli autisti-soccorritori impiegati nell'Intervento.

Le attività delle postazioni di soccorso nei Comuni di Cogne e Saint-Pierre, attraverso 8 autisti-soccorritori – inizialmente finanziate con risorse SNAI e attuate da "ANPAS Comitato regionale Valle d'Aosta – Federazione volontari soccorso" – sono proseguite nel corso del 2025 con il finanziamento da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, permettendo la perennizzazione dell'Intervento e la riqualificazione dell'offerta dei servizi essenziali sul territorio. Sono, inoltre, proseguite le attività di 3 medici e 6 autisti soccorritori già rientranti tra il personale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Tra i risultati ottenuti dall'Intervento si segnalano, inoltre:

1. l'acquisto di 1 automedica a gennaio 2021;
2. l'acquisto di due ambulanze, nell'anno 2022;
3. l'adeguamento di 5 piazzole per l'atterraggio elicotteri di soccorso nell'Area Grand-Paradis.

Si segnala, infine, che l'Intervento accresce nella comunità una percezione di maggiore sicurezza. I rapidi tempi di risposta in caso di chiamata di soccorso, garantiti dalla presenza dell'ambulanza, sono molto apprezzati. A livello di comunità, si è visto, inoltre, che l'integrazione tra dipendenti e volontari del soccorso, migliora il livello di efficacia delle azioni.

L'Intervento risulta ancora in fase di attuazione in quanto, benché le attività siano concluse, non è stata ancora presentata la rendicontazione delle spese sostenute.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	2.582.300,00	1.509.000,00	2.487.553,60	1.458.489,27	2.487.187,04	1.458.353,61
di cui Area interna GP	1.519.143,50	1.509.000,00	1.468.632,26	1.458.489,27	1.468.496,60	1.458.353,61

➤ **Unité in movimento per la salute Grand-Paradis (SN.2)**

Dotazione finanziaria da APQ: 169.200,00 euro a valere sulla l. 23 dicembre 2014, n. 190 (l. stabilità 2015), art. 1, commi 674 e 675.

L'Intervento è stato avviato nel 2023 e le relative attività, che si sono concluse a ottobre 2025, hanno previsto azioni finalizzate alla promozione dell'attività fisica a scopo preventivo e di mantenimento dello stato di salute rivolte a un target specifico: da un lato, a piccoli gruppi di persone anziane (con e senza patologie croniche) e, dall'altro, agli ospiti delle microcomunità del territorio. Una seconda area di intervento ha riguardato l'individuazione e l'allestimento di percorsi pedonali, facilmente accessibili a tutta la popolazione, della lunghezza di 1 km, in ciascuno dei tredici Comuni dell'Area interna Grand-Paradis, per la promozione del movimento a beneficio del benessere e della salute a tutte le età.

Nel mese di ottobre 2025 il Beneficiario ha richiesto all'ARAI una proroga della data di conclusione dell'Intervento al 31.12.2025, al fine di completare le procedure amministrative e provvedere alla liquidazione delle fatture. La proroga è stata approvata dall'ARAI nel mese di novembre 2025 (per maggiori informazioni cfr. Capitolo 2).

Le attività previste dall'Intervento si sono svolte da giugno 2024 a ottobre 2025 e hanno riguardato nello specifico:

- **Attività motorie per piccoli gruppi di anziani, con e senza patologie croniche:** sono stati svolti, in totale, 55 incontri (30 in estate e in autunno 2024 e 25 in primavera, estate e autunno 2025), per un numero complessivo di 507 partecipanti, che hanno espresso un grado di soddisfazione elevato.
- **Attività motorie per gli ospiti delle microcomunità del territorio in base al loro stato di salute:** i fisioterapisti hanno svolto 4 incontri con gli ospiti di ciascuna microcomunità, preceduti da riunioni con il personale delle strutture per verificarne i modi e i metodi. A supporto di tale attività è stato realizzato anche un servizio di terapia occupazionale, nell'ambito del quale un terapeuta occupazionale ha svolto 150 ore, tra giugno e settembre 2025. In totale sono stati svolti 14 incontri nella microcomunità di Introd, 15 in quella di Sarre, 16 in quella di Saint-Pierre e 11 nella microcomunità di Cogne.
- **Individuazione e allestimento di percorsi pedonali di 1 km in ciascuno dei 13 Comuni dell'Area:** i percorsi sono stati realizzati in ciascuno dei 13 Comuni dell'Unité; per ogni Comune è stata creata una pagina informativa *online*, contenente la mappa e la descrizione del percorso, il quale è stato collegato a una leggenda locale del territorio in formato *podcast*, che il pubblico può ascoltare camminando.
- **Breve percorso formativo sulla fisioterapia di comunità:** il corso si è svolto in 2 giornate (21 e 22 ottobre 2025), ad Aosta, alle quali ha partecipato un gruppo di fisioterapisti dipendenti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Nel percorso formativo sono stati presentati esempi di fisioterapia comunitaria nella Regione Friuli Venezia Giulia e un fisioterapista, ricercatore presso l'Università degli Studi di Firenze, ha portato evidenza dell'efficacia e dell'efficienza della fisioterapia di comunità nel sistema sanitario, attraverso pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

Le azioni di comunicazione sono state concepite come leve per la diffusione, l'inclusione e la fidelizzazione dei partecipanti, in un'ottica di *welfare* culturale integrato (cfr. capitolo 6

"Informazione e pubblicità" per le azioni realizzate e il materiale prodotto nell'ambito dell'Intervento).

Il discostamento rispetto al finanziamento iniziale è dovuto al ribasso proposto dall'aggiudicatario del servizio in fase di gara.

L'Intervento risulta ancora in fase di attuazione in quanto, benché le attività siano concluse, la rendicontazione delle spese sostenute è stata trasmessa nell'anno 2026.

Non sono state segnalate criticità rispetto all'attuazione dell'Intervento.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	169.200,00	169.200,00	161.289,54	161.289,54	161.289,54	161.289,54
di cui Area interna GP	169.200,00	169.200,00	161.289,54	161.289,54	161.289,54	161.289,54

➤ **Assistant de hameau Grand-Paradis (SN.3)**

Dotazione finanziaria da APQ: 160.500,00 euro a valere sulla l. 23 dicembre 2014, n. 190 (l. stabilità 2015), art. 1, commi 674 e 675.

Le attività previste dall'Intervento sono state oggetto di una procedura d'appalto, a conclusione della quale, nel mese di aprile 2023, è stato affidato a una cooperativa valdostana il servizio di prossimità di tipo socio-sanitario rivolto ai residenti dell'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, per una durata di mesi 26, da maggio 2023, a luglio 2025.

Le attività previste dall'Intervento sono regolarmente proseguite da gennaio a luglio 2025.

Nel mese di giugno 2025 è stata richiesta una modifica della Scheda intervento concernente la proroga della data di fine Intervento, la rimodulazione degli importi relativi alle voci di spesa e dei tempi previsti nel Cronoprogramma delle attività e la conseguente rimodulazione del Cronoprogramma finanziario per anno. Le modifiche richieste sono state approvate dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud nel mese di luglio 2025 (per maggiori informazioni cfr. Capitolo 2).

Il progetto ha avuto delle ricadute significative sul territorio in termini di attivazione di interventi tempestivi, professionali e integrati finalizzati a favorire il mantenimento a domicilio delle persone fragili e vulnerabili, evitando laddove possibile l'istituzionalizzazione e/o l'ospedalizzazione, sostenendo in questo modo l'autonomia degli individui ed il supporto ai *caregivers*. Ha contribuito, inoltre, a migliorare la conoscenza dei bisogni e delle risorse territoriali, facilitando l'accesso alle informazioni sui servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, nonché all'accesso diretto ai servizi stessi. Un altro aspetto importante è stato il rafforzamento e la valorizzazione delle reti di relazione presenti sul territorio, nonché il potenziamento dell'integrazione con il servizio di sportello sociale, il servizio sociale territoriale e gli operatori dei servizi sanitari distrettuali.

Non sono state riscontrate particolari criticità nel corso dell'anno 2025.

L'Intervento risulta ancora in fase di attuazione in quanto, benché le attività siano concluse, la rendicontazione delle spese sostenute è stata trasmessa nell'anno 2026.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	160.500,00	160.500,00	158.095,87	158.095,87	158.095,86	158.095,86
di cui Area interna GP	160.500,00	160.500,00	158.095,87	158.095,87	158.095,86	158.095,86

3.1.3 Mobilità

➤ **Riorganizzazione TPL – Trasporto a chiamata (MB.1)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 79.432,00 euro a valere sulla l. 23 dicembre 2014, n. 190 (l. stabilità 2015), art. 1, commi 674 e 675 e 425.167,00 euro a valere sulle risorse finanziarie della Regione, per un totale di 504.599,00 euro. A seguito di una rimodulazione, la dotazione finanziaria a valere sulle risorse regionali è stata diminuita da 425.167,00 euro a 218.899,40 euro, portando la dotazione complessiva dell'Intervento a 298.331,40 euro.

L'Intervento è stato avviato il 1° marzo 2022 e le relative attività si sono concluse nel mese di settembre 2025, secondo le modalità richieste dall'Unité Grand-Paradis e concordate con il vettore, Arriva Italia s.r.l.

Il servizio è intervenuto in sostituzione del servizio di linea, con 3 ore di servizio a chiamata, più precisamente: per la Valsavarenche, in sostituzione delle corse in partenza da Villeneuve alle ore 7.45 e in partenza da Valsavarenche alle ore 8.30; per la Val di Rhêmes, in sostituzione delle corse in partenza da Villeneuve alle ore 9.15 e in partenza da Rhêmes-Notre-Dame alle ore 10.15, dal 1° marzo al 15 giugno e dal 15 settembre al 15 dicembre.

Nella stagione estiva 2025 è proseguito il servizio intervallivo a chiamata, nelle Valli di Cogne, Rhêmes, Valgrisenche e Valsavarenche, grazie al quale turisti e residenti hanno avuto la possibilità di usufruire di un trasporto dedicato in diverse fasce orarie, integrando il servizio di TPL e garantendo una maggiore flessibilità rispetto agli orari fissi dello stesso.

Data l'importanza dei servizi svolti, il Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile della Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis garantiranno la prosecuzione degli stessi anche in futuro.

L'Intervento risulta ancora in fase di attuazione in quanto, benché le attività siano concluse, non è stata ancora presentata la rendicontazione delle spese sostenute.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	298.331,40	79.432,00	128.271,40	19.122,48	128.271,40	19.122,48
di cui Area interna GP	298.331,40	79.432,00	128.271,40	19.122,48	128.271,40	19.122,48

Si precisa che l'avanzamento finanziario dell'Intervento è superiore rispetto ai dati sopra riportati, in quanto il Beneficiario non ha potuto procedere, entro il 31.12.2025, al loro inserimento su SISPREG2014 a causa delle variazioni nell'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale. Tale disallineamento è stato sanato con il monitoraggio del primo bimestre 2026.

➤ **Riorganizzazione TPL – Corse scolastiche (MB.2)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 129.906,00 euro a valere sulla l. 23 dicembre 2014, n. 190 (l. stabilità 2015), art. 1, commi 674 e 675. L'importo è stato incrementato di 100.996,50 euro, derivanti dalle risorse integrative previste dalla Delibera CIPESS n. 41/2022, portando il costo complessivo dell'Intervento a 230.902,50 euro.

L'Intervento mira ad assicurare, ai giovani studenti dell'alta Valle di Rhêmes, di Valgrisenche e Valsavarenche, la possibilità di beneficiare di servizi di trasporto con orari adeguati rispetto a quelli del polo scolastico di Villeneuve. Tale servizio, affidato a operatori di noleggio con conducente, è garantito nel periodo scolastico e può essere fruito anche da altre fasce di popolazione.

Le attività previste nell'ambito dell'Intervento sono state avviate per gli alunni della Valgrisenche e le loro famiglie prima dell'approvazione dell'APQ, per ridurre le forti condizioni di isolamento dell'Area interna e dare risposte concrete ai bisogni emersi durante la fase di concertazione e co-progettazione con il territorio.

Per gli Alunni della Valsavarenche e della Valle di Rhêmes, invece, il servizio è stato attivato a partire dall'anno scolastico 2021/22.

Attualmente il servizio di trasporto è attivo nelle valli di Valsavarenche e Valgrisenche.

Nel mese di luglio 2025 è stata richiesta una modifica della Scheda intervento concernente la proroga della data di fine Intervento (ora prevista al 31.12.2026) e la conseguente rimodulazione del cronoprogramma delle attività e del cronoprogramma finanziario per anno. Le modifiche richieste sono state approvate dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud nel mese di settembre 2025, a seguito della consultazione del Tavolo dei sottoscrittori e dell'acquisizione del parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente per materia (per maggiori informazioni cfr. Capitolo 2).

Nel mese di dicembre 2025 l'ARAI, a seguito di una ricognizione delle esigenze dei Soggetti attuatori/Beneficiari, ha richiesto, per l'Intervento in oggetto, l'erogazione di un'ulteriore anticipazione, pari euro 40.398,60.

L'importo richiesto è stato accreditato dalla Banca d'Italia in data 22 dicembre 2025.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	230.902,50	230.902,50	230.812,26	230.812,26	202.902,25	202.902,25
di cui Area interna GP	230.902,50	230.902,50	230.812,26	230.812,26	202.902,25	202.902,25

➤ **Mobilità sostenibile Grand-Paradis (MB.3)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 400.053,00 euro a valere sulla l. 23 dicembre 2014, n. 190 (l. stabilità 2015), art. 1, commi 674 e 675. L'importo è stato incrementato di 125.247,00 euro, derivanti dalle risorse integrative previste dalla Delibera CIPESS n. 41/2022, portando il costo complessivo dell'Intervento a 525.300,00 euro.

L'Intervento prevede la sostituzione di mezzi inquinanti con mezzi a impatto ambientale basso o nullo personalizzati dal punto di vista grafico, per creare un parco di veicoli dimostrativi, che saranno utilizzati dagli Enti locali per il trasporto scolastico, per servire particolari categorie di utenti svantaggiati e per rafforzare la strategia di mobilità *green* dell'Area interna.

E' previsto l'acquisto di 10 autoveicoli elettrici (1 ciascuno per i comuni di Cogne, Saint-Nicolas, Valsavarenche, Valgrisenche, Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges e 4 per l'Unité Grand-Paradis) che possiedano un adeguato livello di efficienza per l'utilizzo nelle zone di montagna.

Nel 2025 è stata espletata e aggiudicata la seconda procedura di gara (la prima, avviata nel 2024, era andata deserta) per l'acquisto di 5 autoveicoli a 8 posti. La consegna dei mezzi, inizialmente prevista per il mese di dicembre 2025, è stata successivamente posticipata alla primavera del 2026.

Nel mese di luglio 2025 è stata richiesta la modifica della Scheda intervento, con la quale, oltre a richiedere una proroga della data di fine dell'Intervento, è stato proposto di sostituire l'acquisto del minibus destinato al Comune di Cogne, con l'acquisto di ulteriori veicoli elettrici che saranno utilizzati dal Comune e dall'Unité Grand-Paradis, in quanto non è stato possibile trovare un fornitore che garantisse l'uso efficiente di minibus su strade di montagna in condizioni di innevamento (quali quelle che si verificano a Cogne durante l'inverno). I nuovi veicoli elettrici – che saranno utilizzati anche per il trasporto degli utenti del servizio di assistenza domiciliare residenti nei comuni più distanti dai centri di erogazione dei servizi sanitari (in particolare quelli residenti nelle testate di valle e nelle frazioni periferiche) – integreranno quelli acquistati nel corso del mese di maggio 2025. Al fine di raggiungere la somma necessaria all'acquisto di tali veicoli è stato proposto di stralciare dall'Intervento la collocazione delle due postazioni di ricarica multi veicolo a Valgrisenche e a Saint-Nicolas, considerato che negli ultimi anni sono state installate numerose colonnine nell'Area interna.

Nel mese di settembre 2025 le proposte di modifica sono state approvate dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente per materia (per maggiori informazioni cfr. Capitolo 2).

Nel mese di dicembre 2025 l'ARAI, a seguito di una ricognizione delle esigenze dei Soggetti attuatori/Beneficiari, ha richiesto, per l'Intervento in oggetto, l'erogazione di un'ulteriore anticipazione, pari euro 50.098,80.

L'importo richiesto è stato accreditato dalla Banca d'Italia in data 22 dicembre 2025.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	525.300,00	525.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Area interna GP	525.300,00	525.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.4 Associazionismo e assistenza tecnica

➤ **Supporto nella definizione e nell'attuazione della Strategia dell'Area Grand-Paradis (AT.1)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 187.000,00 euro a valere sulla l. 23 dicembre 2014, n. 190 (l. stabilità 2015), art. 1, commi 674 e 675. L'importo è stato incrementato di 56.506,50 euro, derivanti dalle risorse integrative previste dalla Delibera CIPESS n. 41/2022, portando il costo complessivo dell'Intervento a 243.506,50 euro.

L'attuazione della Strategia è assicurata dall'Ufficio di Sviluppo locale dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, composto da due unità di personale a tempo pieno, che sono state affiancate, fino al mese di marzo 2025, da un professionista esterno affidatario di un incarico di supporto tecnico.

Tra le principali attività svolte, si segnalano sessioni di informazione e acquisizione di pratiche e strumenti, di analisi dei dati e di tecniche di comunicazione. L'Intervento è rivolto a tutti i soggetti privati, pubblici e associativi impegnati nell'attuazione della Strategia, con ricadute anche presso i soggetti impegnati nell'esecuzione degli Interventi.

Nel mese di giugno 2025 è stata trasmessa una modifica della Scheda intervento, con la quale è stato richiesto l'utilizzo di economie di spesa, al fine di integrare le risorse finanziarie destinate a coprire il costo del personale dipendente dedicato all'attuazione della Strategia d'Area e degli Interventi a essa complementari. La richiesta di modifica riguarda anche lo slittamento dei tempi del Cronoprogramma delle attività e della data di fine Intervento (ora prevista al 31.07.2027) con conseguente rimodulazione del Cronoprogramma finanziario per anno. La necessità di prolungare la data di conclusione dell'Intervento è dovuta alla proroga di altri Interventi rientranti nella Strategia d'Area, che necessitano dell'accompagnamento da parte dell'Ufficio di Sviluppo locale e dell'assistenza tecnica.

Le proposte di modifica sono state approvate dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud nel mese di settembre 2025 (per maggiori informazioni cfr. Capitolo 2).

Nel mese di dicembre 2025 l'ARAI, a seguito di una ricognizione delle esigenze dei Soggetti attuatori/Beneficiari, ha richiesto, per l'Intervento in oggetto, l'erogazione di un'ulteriore anticipazione, pari euro 22.602,60.

L'importo richiesto è stato accreditato dalla Banca d'Italia in data 22 dicembre 2025.

Rispetto a questo Intervento non sono state segnalate criticità.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	243.506,50	243.506,50	82.311,55	82.311,55	39.286,37	39.286,37
di cui Area interna GP	243.506,50	243.506,50	82.311,55	82.311,55	39.286,37	39.286,37

3.1.5 Interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi

➤ **Saint Nicolas (GP01)**

Dotazione finanziaria: 100.000,00 euro ex art. 4, comma 2, d.l. 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2021, n. 155.

L'Intervento è stato avviato nel 2023 e le attività previste si sono concluse nel mese di luglio 2024.

All'interno dell'Area interna Grand-Paradis, è stato realizzato, come previsto dalla relativa Scheda, un intervento selvicolturale con l'obiettivo di diminuire il carico di incendio, facilitare l'introduzione di latifoglie e promuovere l'adattamento al cambiamento climatico sostenendo la prevenzione e la gestione dei rischi.

In particolare l'Intervento ha riguardato il Comune di Saint-Nicolas il quale, considerata la sua esposizione a sud della Valle centrale, è una zona soggetta a rischio di incendio boschivo elevato.

Nello specifico il Progetto ha previsto due interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione e alla protezione antincendio in aree di interfaccia urbano-rurale, in particolare lungo una viabilità forestale e lungo una viabilità regionale, che sono stati realizzati da operatori economici specializzati nel settore, ai quali sono stati affidati i servizi di progettazione e di esecuzione dei lavori per l'allargamento nei varchi della suddetta viabilità, in modo da trasformare i tracciati esistenti in fasce tagliafuoco di tipo attivo, di larghezza pari a 20/25 metri. Ciò in ottica di proteggere la zona dal rischio di incendi boschivi e mitigare gli effetti del cambiamento climatico, al fine di accrescere in modo sostenibile le condizioni socio-economiche del territorio.

L'Intervento è stato concluso nei tempi previsti e non sono state segnalate particolari criticità.

Il rendiconto delle spese sostenute è stato inoltrato al controllore di 1° livello nel mese di marzo 2025; i controlli si sono conclusi nel successivo mese di maggio senza prevedere tagli alle spese rendicontate.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025, precisando che la differenza tra il costo ammesso e l'importo totale degli impegni e dei relativi pagamenti è dovuta ai ribassi d'asta nell'affidamento dei servizi:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	100.000,00	100.000,00	78.034,73	78.034,73	78.012,30	78.012,30
di cui Area interna	100.000,00	100.000,00	78.034,73	78.034,73	78.012,30	78.012,30

3.2 Stato di attuazione Interventi su altri fondi

Si premette che tra gli Interventi inclusi nell'APQ "Area interna Grand-Paradis", finanziati dai Programmi POC, FSE e FEASR, alcuni sono intesi come "Scheda Azione" (dalla quale derivano i singoli Progetti, selezionati tramite un avviso a evidenza pubblica), mentre altri sono "Progetti ad individuazione diretta", già definiti nei relativi Programmi. Pertanto, per quanto concerne le Schede Azione, si precisa che nelle tabelle concernenti l'avanzamento fisico e finanziario riportate nei seguenti paragrafi i dati relativi al Finanziamento e al Costo ammesso sono riferiti alle sole risorse dei progetti finora approvati e non alla dotazione finanziaria (iniziale o al 31.12.2025) da APQ.

3.2.1 POC

➤ **Promozione partecipata "Gran Paradiso: dai valore alla natura" (SL.1)**

Dotazione finanziaria da APQ: 500.000,00 euro a valere inizialmente sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR), poi transitati sul Programma operativo complementare (POC) 2014/20, ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

L'Intervento era finalizzato a rafforzare l'attrattività dell'Area interna Gran-Paradis nell'ambito di una destinazione turistica unica "Espace Grand-Paradis", integrando le risorse naturali, culturali ed economiche di tutti i comuni facenti parte della relativa Unité.

Le attività previste dall'Intervento si sono concluse nel mese di settembre 2024 e nel successivo mese di ottobre (con deliberazione della Giunta regionale n. 1299/2024), è transitato dal Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20" (FESR), al Programma operativo complementare (POC) Valle d'Aosta 2014/20, che prevedeva un orizzonte temporale di chiusura più ampio; sarà, quindi, rendicontato a valere sul POC 2014/20 della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Nel'ambito di tale Intervento sono stati realizzati:

- la promozione del territorio dell'Unité Grand-Paradis in occasione dell'esposizione dedicata al Gran Paradiso nell'ambito del Progetto fotografico-scientifico "L'adieu des glaciers";
- un video promozionale del territorio;
- l'integrazione del video presso il Castello di Aymavilles;
- un paesaggio sonoro relativo all'ambiente acustico del Parco nazionale del Gran Paradiso;
- la realizzazione di una campagna *social* per la promozione del video di cui sopra;
- il servizio di organizzazione e gestione dei punti informativi territoriali nei comuni di Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas e Valgrisenche e l'acquisto dell'attrezzatura necessaria al funzionamento degli stessi.

Oltre alle difficoltà già segnalate nelle precedenti relazioni, in riferimento ai tempi per l'affidamento dei servizi e di realizzazione delle attività, superiori rispetto a quanto previsto nel contratto, non sono state rilevate particolari criticità.

Il rendiconto finale delle spese è stato trasmesso in data 18 febbraio 2025, ma l'Intervento, in SISPREG2014, risulta in fase di attuazione in quanto al 31.12.2025 le operazioni di controllo di 1° livello non erano ancora concluse.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario dell'Intervento al 31.12.2025:

	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	500.000,00	500.000,00	484.154,04	484.154,04	483.970,63	483.970,63
di cui Area interna GP	500.000,00	500.000,00	484.154,04	484.154,04	483.970,63	483.970,63

3.2.2 FSE

➤ **Interventi per la formazione continua interaziendale del personale delle micro, piccole e medie imprese (SL.2.1)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 35.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis), a valere sul bando del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE). Il costo dell'Intervento a livello regionale non era stato quantificato nella Scheda intervento allegata all'APQ. A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis è stata allineata all'importo del costo ammesso dei 2 progetti conclusi (pari a 5.650,88 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 19 progetti conclusi (pari a 393.181,21 euro).

L'Intervento è stato avviato nel mese di maggio 2021. A seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico per la formazione continua per le annualità 2021/22 (Avviso 21AA), sono stati presentati due progetti interaziendali nel corso dell'anno 2022, che hanno visto coinvolte alcune aziende con sede operativa nei 6 comuni dell'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis: il primo dal titolo "AREV: corso di produzione e trasformazione delle carni Valdostane", valorizzava le potenzialità locali dei sistemi agro-alimentari, il secondo, dal titolo "VALLE 2022-2023 – CUVDA", valorizzava le risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile.

Le attività riconducibili all'Intervento si sono concluse nel 2023, anno in cui non è stato presentato alcun Progetto che abbia coinvolto aziende con sede operativa nei 6 comuni dell'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis.

Nel mese di febbraio 2024 si sono conclusi i controlli di I livello, a seguito dei quali non sono risultate decurtazioni alle spese.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	19	0	0	19	406.056,00	393.181,21	393.181,21	393.181,21	393.181,21	393.181,21
AI GP	2	0	0	2	5.650,88	5.650,88	5.650,88	5.650,88	5.650,88	5.650,88

➤ **Interventi per la formazione di giovani e adulti (SL.2.2)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 30.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis), a valere sul bando del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE). Il costo dell'Intervento a livello regionale non era stato quantificato nella Scheda intervento allegata all'APQ. A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis è stata allineata all'importo del costo ammesso della quota parte dell'unico Progetto concluso (pari a 20.195,00 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dell'intera quota dell'unico Progetto concluso (pari a 79.054,00 euro).

L'Intervento è stato avviato nel mese di giugno 2021 e le relative attività si sono concluse nel mese di giugno 2023.

A seguito dell'approvazione di due Avvisi pubblici (21AC e 21AH) per il finanziamento di iniziative formative finalizzate all'occupabilità e di corsi per l'acquisizione di competenze linguistiche, sono stati presentati 3 Progetti, dei quali è stato approvato soltanto il Progetto "Parole senza frontiere", che ha proposto 9 corsi di lingua (inglese e francese), per un totale complessivo di 400 ore di formazione, organizzati in tutta la Regione e rivolti in particolare ai disoccupati.

Rispetto all'Area interna Grand-Paradis, dopo il primo corso di lingua francese, è stata pubblicizzata l'edizione del corso di lingua inglese, senza però raggiungere il numero di iscritti sufficiente. Al contrario, l'ente di formazione ha ricevuto richieste per l'attivazione di corsi di francese, motivo per cui è stata autorizzata una variazione progettuale in tal senso. Il corso "sostitutivo" è stato realizzato e si è concluso nel mese di marzo 2023.

Il terzo corso relativo all'Area interna Grand-Paradis non è stato svolto per carenza di iscrizioni.

Il Progetto "Parole senza frontiere" si è concluso, quindi, il 13 giugno 2023, avendo realizzato 8 corsi su 9. In data 15 settembre 2023 è stato inoltrato il rendiconto finale alla Struttura Controllo progetti europei e statali che, a seguito della conclusione del controllo di I livello ha disposto una decurtazione pari a 930,00 euro.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	3	0	2	1	104.820,00	79.054,00	79.054,00	79.054,00	79.054,00	79.054,00
Al GP	3	0	2	1	33.766,50	20.195,00	20.195,00	20.195,00	20.195,00	20.195,00

➤ **Interventi di animazione territoriale per la diffusione della cultura di impresa (SL.2.3)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 35.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, sul totale di 220.003,60 euro, riferito all'intero Intervento insistente anche su altri comuni esterni all'Area interna) a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE). La dotazione finanziaria attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis è stata azzerata, poiché l'unico Progetto concluso a livello regionale non ha avuto ricadute in tale Area. A seguito della chiusura dell'Intervento, il costo dello stesso a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dell'unico Progetto concluso (pari a 220.000,00 euro).

Dalla Scheda Azione "Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa (OCC.10205.16AG.0)" è derivato un unico Progetto denominato "Interventi di animazione territoriale per la diffusione della cultura d'impresa", attuato da Vallée d'Aoste Structure s.r.l. che, tuttavia, non ha avuto ricadute nell'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, per l'assenza di partecipazione da parte di soggetti facenti parte di tale Area, per tale ragione l'Intervento risulta non attuabile.

A livello regionale, invece, l'Intervento, nel suo complesso, è stato realizzato nell'annualità 2018 e risulta concluso.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	1	0	0	1	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Al GP	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.3 FEASR

➤ **Banda ultra larga Grand-Paradis (BL.1)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 466.042,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis), sul totale dell'Intervento di 5.784.424,00 euro, a valere sulla misura 7.3, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis è stata allineata all'importo del relativo costo ammesso (pari a 469.687,61 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è rimasto invariato.

L'Intervento è stato avviato nel mese di gennaio 2018 e le attività previste si sono concluse a settembre 2025. Tutti i lavori finalizzati alla riduzione del divario digitale delle aree rurali – realizzati attraverso lo sviluppo della banda ultra larga, sia relativi alla posa della fibra ottica, sia relativi ai collegamenti *wireless* – risultano conclusi in tutti i Comuni della Regione, di cui 5 ricadono nell'Area interna Grand-Paradis (resta escluso il comune di Rhêmes-Saint-George in quanto già raggiunto dalla fibra).

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Intervento:

	Finanziamento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
Totale	5.784.424,00	5.784.424,00	5.784.424,00	5.784.424,00	5.768.955,96	5.768.955,96
di cui Area interna GP	469.687,61	469.687,61	469.687,61	469.687,61	469.687,61	469.687,61

➤ **Sostegno agli investimenti (SL.3.1)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 1.000.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, sul totale dell'Intervento di 16.416.741,65 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis è stata allineata all'importo del costo ammesso dei 22 progetti conclusi (pari a 935.337,90 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 461 progetti conclusi (pari a 18.015.581,44 euro).

L'Intervento – avviato nel mese di luglio 2016 e le cui attività si sono concluse nel mese di dicembre del 2025 – era volto a favorire, tramite il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014/22, investimenti materiali che, sostenendo l'incremento delle produzioni, migliorassero le prestazioni, la sostenibilità globale e la redditività delle aziende agricole, favorendo la vendita diretta in azienda e permettendo di rispondere alla crescente domanda di prodotti locali.

Nel periodo considerato dalla Strategia i bandi pubblicati sono stati 5 (uno nel 2016, due nel 2017, uno nel 2018 e uno nel 2020) con la partecipazione di 23 aziende agricole provenienti dall'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, per un finanziamento complessivo richiesto pari a 1.055.611,40 euro. Delle domande presentate ne sono state approvate 20 per un importo pari a 932.080,67 euro.

Nel 2024 è stato, inoltre, pubblicato il bando 4.1.1 NGEU, che ha visto la partecipazione di 2 aziende agricole provenienti dall'Area interna Grand-Paradis, per un importo complessivo di finanziamento pari a 42.953,99 euro.

Gli interventi sono tutti conclusi e le liquidazioni sono avvenute entro il termine della programmazione.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	563	0	102	461	18.015.581,44	18.015.581,44	18.015.581,44	18.015.581,44	18.015.581,44	18.015.581,44
AI GP	25	0	3	22	935.337,90	935.337,90	935.337,90	935.337,90	935.337,90	935.337,90

➤ **Sostegno ai giovani agricoltori per investimenti nelle aziende agricole (SL.3.2)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 310.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, sul totale dell'Intervento di 8.183.191,10 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis è stata allineata all'importo del costo ammesso dei 6 progetti conclusi (pari a 1.180.566,11 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 48 progetti conclusi (pari a 7.141.864,94 euro).

L'Intervento è stato avviato nel mese di dicembre 2019 e le attività previste si sono concluse nel mese di dicembre 2025. Esso aveva l'obiettivo di incentivare lo sviluppo di nuove aziende agricole

e sostenere il ritorno dei giovani nel settore dell'agricoltura, al fine di assicurare il ricambio generazionale.

Nel complesso sono stati finanziati 6 progetti di giovani agricoltori, inseriti nei Comuni dell'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, per un contributo complessivo pari a euro 1.180.566,11.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	70	0	22	48	7.141.864,94	7.141.864,94	7.141.864,94	7.141.864,94	7.141.864,94	7.141.864,94
AI GP	6	0	0	6	1.180.566,11	1.180.566,11	1.180.566,11	1.180.566,11	1.180.566,11	1.180.566,11

➤ **Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (SL.3.3)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 100.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, sul totale dell'Intervento di 2.200.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). La dotazione finanziaria attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis è stata azzerata, poiché non sono state presentate proposte progettuali in tale Area. A seguito della chiusura dell'Intervento, il costo dello stesso a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 35 progetti conclusi (pari a 2.728.444,28 euro).

L'Intervento era volto a incentivare gli investimenti materiali e immateriali finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola e riguardanti la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli.

Sono stati pubblicati 4 bandi regionali (uno nel 2017, uno nel 2018, uno nel 2019 e uno nel 2022) rivolti alle PMI, rispetto ai quali non sono state presentate proposte progettuali da parte di Beneficiari provenienti dai Comuni dell'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, pertanto l'Intervento non risulta attuato in tale Area.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario, a livello regionale, a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	41	0	6	35	2.728.444,28	2.728.444,28	2.728.444,28	2.728.444,28	2.728.444,28	2.728.444,28
AI GP	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

➤ **Investimenti non produttivi - Recupero e manutenzione dei tradizionali muretti a secco (SL 3.4)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 80.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, sul totale dell'Intervento di 900.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). La dotazione

finanziaria attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis è stata azzerata, poiché l'unico Progetto presentato non è stato approvato. A seguito della chiusura dell'Intervento, il costo dello stesso a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 44 progetti conclusi (pari a 763.007,70 euro).

In relazione a questo Intervento è stato pubblicato un unico bando regionale a maggio 2019, rispetto al quale sono state presentate 52 domande di sostegno, di cui una proveniente da un Beneficiario dell'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis che, tuttavia, è stata esclusa dalla concessione dell'aiuto non avendo perfezionato la documentazione necessaria. La graduatoria dei progetti è stata approvata in data 12 dicembre 2019 e in data 14 maggio 2020 è stato concesso l'aiuto a 44 Beneficiari.

L'Intervento è da considerarsi concluso a livello regionale e, non avendo avuto ricadute nell'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, risulta non attuabile in tale Area.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario, a livello regionale, a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	52	0	8	44	763.007,70	763.007,70	763.007,70	763.007,70	763.007,70	763.007,70
Al GP	1	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- **Manutenzione, restauro e riqualificazione di alpeggi nell'Area Grand-Paradis (SL.3.5)**
Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 300.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, sul totale dell'Intervento di 1.816.078,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis è stata allineata all'importo del costo ammesso dell'unico Progetto concluso (pari a 118.074,99 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 12 progetti conclusi (pari a 1.615.890,24 euro).

Per questo Intervento, riguardante la manutenzione, il restauro e la riqualificazione degli alpeggi, è stato pubblicato un unico bando regionale ad agosto 2017, rispetto al quale sono state presentate 16 domande di sostegno (di cui 12 approvate, per un importo complessivo pari a poco più di 1,6 milioni di euro). Di tali domande una era proveniente da un Beneficiario dell'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis (per un importo pari a circa 118 mila euro).

Dai 12 progetti approvati sono attese ricadute positive sull'ambiente, grazie ai pascoli in quota che contribuiranno alla conservazione dell'equilibrio vegetativo e alla valorizzazione dei relativi fabbricati rurali pertinenziali, che diverranno elementi paesaggistici di pregio.

Non essendo prevista la pubblicazione di ulteriori bandi, le ricadute in termini finanziari sull'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis sono inferiori rispetto a quanto inizialmente previsto (circa 118 mila euro anziché 300 mila euro).

Le attività previste sono state realizzate e l'Intervento risulta concluso.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	16	0	4	12	1.615.890,24	1.615.890,24	1.615.890,24	1.615.890,24	1.615.890,24	1.615.890,24
AI GP	1	0	0	1	118.074,99	118.074,99	118.074,99	118.074,99	118.074,99	118.074,99

➤ **Creazione e sviluppo di filiere corte (SL.3.6)**

Dotazione finanziaria da APQ: 150.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, sul totale dell'Intervento di 1.000.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del GAL Valle d'Aosta, finanziato dal Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). La dotazione finanziaria attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis è stata azzerata, poiché non sono state presentate proposte progettuali in tale Area. A seguito della chiusura dell'Intervento, il costo dello stesso a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dell'unico Progetto concluso (pari a 68.356,77 euro).

Per tale Intervento è stato pubblicato un solo bando promosso dal GAL Valle d'Aosta, riconducibile alla sottomisura 16.4.1 della propria Strategia di sviluppo locale, con scadenza il 10 maggio 2021. A livello regionale sono state presentate 3 proposte progettuali, nessuna delle quali riconducibile all'Area interna Grand-Paradis.

L'Intervento risulta concluso, non essendo prevista la pubblicazione di ulteriori bandi e, non essendo state presentate proposte progettuali da parte di aziende aventi sede nell'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, risulta non attuabile in tale Area.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario, a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	3	0	2	1	68.356,77	68.356,77	68.356,77	68.356,77	68.356,77	68.356,77
AI GP	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

➤ **Supporto alla cooperazione tra piccoli operatori agroalimentari e turistici (SL.3.7)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 150.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, sul totale dell'Intervento di 1.000.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del GAL Valle d'Aosta, finanziato dal Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis è stata allineata all'importo del costo ammesso dell'unico Progetto concluso (pari a 120.381,71 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 9 progetti conclusi (pari a 747.997,76 euro).

L'Intervento era finalizzato a sostenere la cooperazione tra piccoli operatori, per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, e per lo sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

Nell'ambito del bando 16.3 sotto intervento 2 "Cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e la commercializzazione del turismo", pubblicato nel 2019, sono stati presentati, complessivamente, 13 Progetti, di cui 2 nell'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis.

Dei progetti presentati ne sono stati approvati 9, di cui solo 1 in tale Area: il Progetto "Green Vallée d'Aoste", che propone un percorso agroalimentare, coinvolgendo sette aziende agricole e diversi operatori turistici nel quadro di una modalità di vacanza ecosostenibile.

Più nel dettaglio, il Progetto offre, in abbinamento ai servizi alberghieri, un'autovettura elettrica, ritirabile presso stazioni ferroviarie e aeroporti di prossimità per raggiungere la Valle d'Aosta e spostarsi durante il soggiorno. È, inoltre, possibile inserire nel pacchetto le esperienze *green* proposte dalle aziende aderenti alla rete, come il *trekking* nei vigneti, le visite alle aziende per scoprire le erbe medicinali, la produzione di aceti, o ancora visite agli orti, agli allevamenti e alle cantine con degustazioni.

Nell'ambito dell'Intervento è stato realizzato il sito *web* e *social* con dominio "Alpine Green Experience", sono state create e lanciate le pagine *social* (Facebook e Instagram) e sono stati realizzati gli itinerari e i circuiti comprendenti anche aree protette.

Le attività previste dall'Intervento si sono concluse nel mese di dicembre 2023, ma al 31 dicembre 2025 la rete di imprese risulta attiva e prosegue nelle attività previste con risorse proprie.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	13	0	4	9	747.997,76	747.997,76	747.997,76	747.997,76	747.997,76	747.997,76
AI GP	2	0	1	1	120.381,71	120.381,71	120.381,71	120.381,71	120.381,71	120.381,71

➤ **Gestione e valorizzazione delle foreste – Stesura piani di gestione forestale (SL.3.8)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 30.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, sul totale dell'Intervento di 600.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito di una rimodulazione del piano finanziario del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR), l'Intervento è stato soppresso.

L'Intervento è riconducibile alla sottomisura 16.8 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti" del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR).

Il bando, pubblicato a fine novembre 2019, è andato deserto, sebbene siano stati realizzati una serie di incontri sul territorio con i portatori di interesse (proprietari, imprese, professionisti) per coinvolgerli nella creazione di una filiera legno tramite la partecipazione alle sottomisure forestali del PSR 2014/22 (in particolare le sottomisure 8.5, 16.6 e 16.8).

Nel 2022 la dotazione finanziaria è stata ridotta da 600.000,00 euro a 200.000,00 euro.

Nel 2023, a seguito della modifica del piano finanziario del PSR 2014/22, l'Intervento è stato soppresso, di conseguenza la relativa dotazione finanziaria è stata azzerata, trattasi quindi di Intervento non attuato.

➤ **Gestione e valorizzazione delle foreste – Valorizzazione degli ecosistemi forestali (SL.3.9)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 210.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, sul totale dell'Intervento di 2.500.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). A seguito della chiusura dell'Intervento, la dotazione finanziaria attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis è stata allineata all'importo del costo ammesso dell'unico Progetto concluso (pari a 74.477,45 euro), mentre il costo dell'Intervento a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 10 progetti conclusi (pari a 684.750,98 euro).

L'Intervento è riconducibile alla sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR).

Dal 2016 al 2022 sono stati pubblicati 7 bandi (uno per ogni annualità dal 2016 al 2022), rispetto ai quali sono state presentate complessivamente 16 domande di sostegno, di cui una riconducibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis (presentata a valere sul bando dell'anno 2019). Rispetto alle 16 domande presentate ne sono state approvate 10, di cui una riferibile all'Area interna Grand-Paradis (Comune di Cogne), mentre le restanti 6 non sono state approvate.

L'Intervento si è concluso nel mese di ottobre 2025 e tutti i pagamenti sono stati effettuati.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	16	0	6	10	684.750,98	684.750,98	684.750,98	684.750,98	684.750,98	684.750,98
AI GP	1	0	0	1	74.477,45	74.477,45	74.477,45	74.477,45	74.477,45	74.477,45

➤ **Gestione e valorizzazione delle foreste – Valorizzazione dei prodotti forestali e tecnologie silvicole (SL.3.10)**

Dotazione finanziaria iniziale da APQ: 40.000,00 euro (quota stimata, attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, sul totale dell'Intervento di 1.000.000,00 euro), a valere sul bando, necessariamente a scala regionale, del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR). La dotazione finanziaria attribuibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis è stata azzerata, poiché non sono state presentate proposte progettuali in tale Area. A seguito della chiusura dell'Intervento, il costo dello stesso a livello regionale è stato allineato all'importo del costo ammesso dei 17 progetti conclusi (pari a 448.094,60 euro).

L'Intervento è riconducibile alla sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del Programma di Sviluppo rurale 2014/22 (FEASR).

Dal 2017 al 2022 sono stati pubblicati 5 bandi (per le annualità 2017, 2019, 2020, 2021 e 2022), rispetto ai quali sono state presentate complessivamente 18 domande di sostegno (nessuna riconducibile all'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis), delle quali 17 sono state approvate.

Le attività previste dal Progetto si sono concluse nel mese di maggio 2025 e tutti i pagamenti sono stati effettuati.

Non essendovi imprese forestali nei comuni dell'Area interna Grand-Paradis che abbiano le caratteristiche per presentare progetti ai sensi della sottomisura 8.6, l'Intervento non risulta attuabile in tale Area.

Si riporta, di seguito, l'avanzamento finanziario, a livello regionale, a conclusione dell'Azione:

	Numero Progetti				Finanzia- mento	Costo ammesso	Impegni	Impegni ammessi	Pagamenti	Pagamenti ammessi
	Presen- tati	Di cui:								
		In istruttoria	Non approvati	Approvati						
Totale	18	0	1	17	448.094,60	448.094,60	448.094,60	448.094,60	448.094,60	448.094,60
Al GP	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. GESTIONE E CONTROLLO

In termini generali, per quanto concerne l'attuazione, a livello regionale, della Strategia nazionale per le aree interne, si evidenzia quanto segue:

- in relazione agli Interventi sui servizi essenziali si applicano le disposizioni e gli obblighi inseriti nel relativo Accordo di Programma quadro (APQ) e quanto stabilito nel relativo Si.Ge.Co. riferito ai servizi essenziali, approvato, nella sua prima versione, con deliberazione della Giunta regionale n. 32 in data 31 gennaio 2020;
- rispetto agli Interventi di sviluppo locale valgono le disposizioni dettate dai regolamenti (UE) di riferimento e le regole proprie di ciascun Programma, definite negli appositi Si.Ge.Co.

Nell'ambito di tale quadro di riferimento, in considerazione delle criticità riscontrate nell'attuazione degli Interventi relativi ai servizi essenziali delle due Aree interne valdostane ("*Bassa Valle*" e "*Grand-Paradis*") – che hanno comportato la necessità di intervenire ripetutamente sulle Schede intervento già approvate, al fine di garantirne la realizzazione e la sostenibilità – il Dipartimento politiche strutturali e affari europei – ora Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili – in qualità di Struttura di riferimento del Responsabile unico dell'attuazione degli APQ "*Area interna Bassa Valle*" e "*Area interna Grand-Paradis*", nel 2021, ha curato la predisposizione di una nuova versione del Si.Ge.Co. con l'obiettivo di introdurre semplificazioni procedurali. In tale versione – approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1413 in data 8 novembre 2021 – oltre a un puntuale aggiornamento del quadro di riferimento normativo e amministrativo alla luce delle ultime novità introdotte:

- sono state inserite delle semplificazioni in merito alla disciplina delle fasi di attuazione, modifica e possibilità di proroga degli Interventi (a titolo esemplificativo, con riguardo alle modifiche, è stato previsto di non attivare la procedura di consultazione del Tavolo dei sottoscrittori per le sole riprogrammazioni tra voci di spesa esistenti di valore inferiore al 20% del costo totale dell'Intervento, nel caso in cui le stesse non modifichino il valore complessivo dell'Intervento, mentre, con riferimento alla proroga, è stato previsto il mero invio di una nota di richiesta al RUA per tutti quei casi in cui non si ricada nelle fattispecie per le quali è richiesta l'attivazione del Tavolo dei sottoscrittori);
- è stata allineata la disciplina in materia di informazione e pubblicità alle indicazioni fornite dall'Agenzia per la coesione territoriale;
- sono stati meglio precisati gli aspetti inerenti il controllo di primo livello degli Interventi (definendo gli elementi su cui verte il controllo in loco);
- sono stati implementati i paragrafi relativi al trattamento delle irregolarità e ai pagamenti.

Sempre nella logica di semplificazione delle modalità procedurali, il Dipartimento politiche strutturali e affari europei ha, altresì, ritenuto necessario e opportuno predisporre un documento di indirizzo finalizzato a fornire delle linee guida utili ad agevolare la gestione delle Schede intervento da parte dei Beneficiari/Attuatori degli Interventi relativi ai servizi essenziali nel caso in cui dette Schede siano oggetto di proposta di modifiche.


Nel 2024 il documento è stato ulteriormente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, n. 780 in data 8 luglio 2024, al fine di meglio precisare gli obblighi specifici in capo ai beneficiari degli Interventi, il trattamento delle irregolarità e dei recuperi delle somme indebitamente corrisposte, gli aspetti concernenti l'informazione e la pubblicità e per aggiornare i relativi allegati.

Al fine di garantire uniformità di trattamento agli Interventi finanziati con risorse SNAI, con la medesima deliberazione, è stato altresì deciso di estendere l'applicazione del "*Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) degli Interventi relativi ai servizi essenziali nelle Aree interne della Valle d'Aosta*" anche agli Interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle Aree interne, di cui al decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.

Per quanto concerne il sistema di monitoraggio utilizzato per gli Interventi inclusi nell'APQ si rimanda a quanto riportato all'inizio del Capitolo 3.

5. LA GOVERNANCE DELL'ATTUAZIONE

Come riportato nel documento "Monitoraggio del sistema intercomunale permanente – Analisi dello stato di avanzamento del processo di associazione delle funzioni e servizi e del modello organizzativo per la realizzazione della SNAI – Area interna Grand-Paradis" – predisposto a dicembre 2021 da Formez PA per conto del CTAI – la governance per l'attuazione dell'APQ "Area interna Grand-Paradis" può essere rappresentata dal seguente modello e analizzata in relazione alle tre macro-dimensioni di seguito riportate.

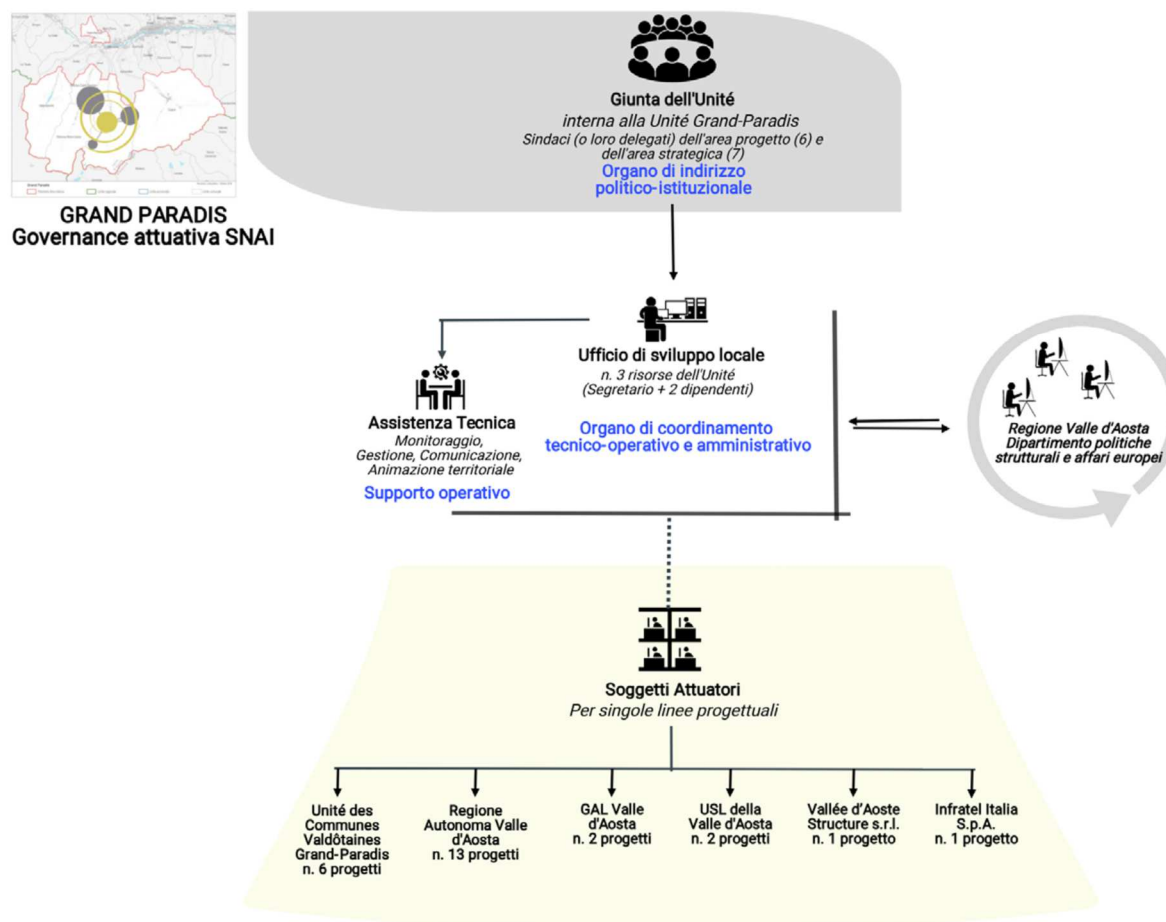

- Rappresentatività politico-istituzionale:** tale rappresentatività, intesa come capacità di coinvolgimento degli attori comunali nei processi decisionali e di indirizzo della Strategia d'Area, si concentra nell'ambito della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, cui appartengono i 13 comuni dell'Area interna. Il processo decisionale interno alla Giunta prevede un coinvolgimento selettivo dei comuni – dell'Area progetto o dell'area complessiva – sulla base della specificità e dell'ampiezza di impatto delle tematiche affrontate. La coincidenza del territorio dell'intera Area interna con quello dell'Unité trova, quindi, nella Giunta un sistema di rappresentanza, di coinvolgimento e di ricomposizione degli interessi territoriali molto stabile, grazie anche alla lunga esperienza associativa.
- Coordinamento tecnico-operativo:** l'attività di coordinamento amministrativo e tecnico-operativo – sia verticale (verso l'organo decisionale), sia orizzontale (tra i soggetti attuatori e i

relativi Interventi) – è svolta attraverso il preesistente Ufficio di sviluppo locale, composto dal Segretario e da un funzionario dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, con l'aggiunta di una risorsa di nuova assunzione grazie all'impulso della Strategia d'Area. Oltre al supporto dell'Ufficio tecnico per la parte di progettazione, attraverso gara, è stata individuata un'Assistenza tecnica per le attività di monitoraggio, animazione territoriale, comunicazione, supporto al coordinamento e accompagnamento metodologico al personale coinvolto nell'attuazione della Strategia d'Area. Nelle attività dell'Ufficio, le singole tecnostrutture comunali vengono coinvolte per le parti di competenza tecnica specifica del territorio di riferimento. A questo nucleo attoriale si aggiunge il rilevante contributo della Regione attraverso l'Ufficio Aree interne del Dipartimento politiche strutturali e affari europei – ora Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili – (il cui Coordinatore riveste il ruolo di Autorità responsabile per le Aree interne), all'interno del quale è stato strutturato un apposito Ufficio Aree interne, di supporto all'attuazione delle Strategie delle Aree interne valdostane.

3. **Gestione operativa:** l'APQ prevede la realizzazione di 25 Interventi, di cui tre quarti concentrati tra la Regione (13) e l'Unité (6)⁵. In questo quadro, il fattore di successo della Strategia d'Area, sia a livello di coordinamento che di attuazione, sembra rintracciarsi nella relazione sinergica tra l'Unité e la Regione. Tale relazione potrà contribuire a rafforzare una *vision* territoriale multilivello, a sviluppare logiche di progettazione integrata, a potenziare la capacità di intervenire e risolvere le criticità emergenti.

Al fine di rafforzare la governance complessiva, con deliberazione della Giunta regionale n. 1669, in data 13 dicembre 2021, è stato riorganizzato il Comitato per lo sviluppo locale⁶, che è così composto:

- dal Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei – ora Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili – con funzione di Presidente del Comitato;
- dalle Autorità di gestione dei Programmi regionali FESR, FSE+ e FEASR;
- dal Responsabile regionale dei Programmi di Cooperazione territoriale europea;
- dal componente esperto esterno del NUVAL in sviluppo rurale e locale, nonché in sviluppo 7 sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici e rischi;
- dal componente esperto esterno del NUVAL in sviluppo territoriale, con particolare riferimento alla Cooperazione territoriale europea e ai partenariati multilivello;
- dai Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines coinvolte nelle Aree interne;
- dai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta ricompresi nelle Aree interne interessate;
- dal Dirigente della Struttura regionale Sistemi tecnologici, relativamente alla tematica *Smart Villages*.

Il Comitato per lo sviluppo locale assicura, con tale composizione, il processo partecipativo – anche come strumento di riflessione condivisa sul futuro del territorio regionale – e permette di rilevare i fabbisogni, raccogliere e far convergere le istanze e la volontà dei diversi attori territoriali

5 I restanti interventi sono ripartiti tra GAL (2), Azienda USL della Valle d'Aosta (2), Infratel Italia S.p.A. (1) e Vallée d'Aoste Structure s.r.l. (1).

6 Il Comitato per lo sviluppo locale svolge anche le attività residue poste in capo al Comitato per lo sviluppo locale previsto nell'ambito del Quadro strategico regionale 2014/20 e costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 369 in data 18 marzo 2016.

coinvolti; favorisce, inoltre, la gestione della Strategia in corso, sia in una logica prospettica, per cogliere le nuove opportunità del PNRR, sia per sviluppare una progettazione territoriale integrata.

Rispetto alle figure regionali e locali previste dall'APQ "*Area interna Grand-Paradis*" sottoscritto in data 4 marzo 2020, si segnala che – a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale – la competenza relativa alle Aree interne, incardinate nell'ambito del Dipartimento politiche strutturali e affari europei – ora Dipartimento affari europei, innovazione e politiche per la montagna e giovanili – sono passate dall'allora Assessorato agli affari europei, politiche del lavoro inclusione sociale e trasporti, all'Assessorato all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate e, infine, all'Assessorato agli affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna, ora ridenominato Assessorato agli affari europei, innovazione, PNRR, politiche nazionali per la montagna e politiche giovanili.

Si segnala, infine, che la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella *governance* dell'APQ ha consentito di far fronte alle criticità emerse sui vari Interventi e, in particolare, su quelli per i quali è stato necessario attivare la procedura di consultazione del Tavolo dei sottoscrittori (cfr. Capitolo 2).

6. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, dalla seconda metà del 2021, si è dotata, come già evidenziato, di una risorsa esterna che ha consentito, tra l'altro, di attivare una pagina informativa sul proprio sito *web* (vedi [link](#)), dedicata alla Strategia dell'Area interna Grand-Paradis, con informazioni sintetiche sui singoli Interventi, nonché notizie e fotografie rispetto alle principali iniziative in corso di attuazione. Le notizie sono state riportate, attraverso appositi post, sulla pagina *Facebook* dell'Unité (vedi [link](#)).

Un'attività di comunicazione continua è stata svolta in modo diretto da parte dei responsabili dei singoli Interventi, attraverso canali propri e per mezzo di strumenti di comunicazione tradizionali e *social*. Tale attività ha avuto ricadute nella stampa e nei media locali, anche grazie ai comunicati rilanciati dall'Ufficio stampa della Regione o da canali di settore (es.: il canale tematico "Europa" del sito regionale, curato da Europe Direct Vallée d'Aoste, il sito "[Webécole](#)" curato dal Dipartimento Sovrintendenza agli studi, ecc.).

In particolare, rispetto agli Interventi relativi ai servizi essenziali si segnala quanto segue:

- per l'Intervento "*Formazione e scambi per scuola di eccellenza Grand-Paradis (IS.1)*", sul sito istituzionale dell'Unité è stato dato conto delle attività di formazione per gli insegnanti per il potenziamento dell'insegnamento plurilingue, indicando le sessioni di formazione realizzate, i Comuni interessati e il numero degli insegnanti che vi hanno preso parte (vedi [link](#)). Le informazioni sono state, inoltre, veicolate sulla pagina di *Facebook*.
Le famiglie degli alunni coinvolti nelle attività sono state informate periodicamente sulle stesse grazie alla collaborazione delle Istituzioni scolastiche (circolari e comunicazioni degli insegnanti);
- per l'Intervento "*Ambienti di apprendimento innovativi Grand-Paradis (IS.2)*", nella citata sezione del sito istituzionale, sono state dedicate tre pagine ai progetti realizzati e nello specifico: "*Didattica digitale e scambi per la scuola di montagna*" (vedi [link](#)), riguardante le azioni svolte per favorire la didattica digitale e gli scambi tra gli alunni; "*Dal design naturale all'orto di classe, la biofilia nelle scuole di montagna*" (vedi [link](#)), che riporta le attività realizzate presso le scuole dell'infanzia e primaria di Cogne, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Valgrisenche e Valsavarenche; è stata, inoltre, dedicata un'apposita pagina al Progetto "*Dal design naturale all'orto di classe, la biofilia nelle scuole di montagna*", messo in atto presso la scuola primaria di Saint-Nicolas, dove si è voluto ottimizzare gli spazi dell'edificio scolastico in direzione innovativa ed esperienziale, al fine di promuovere un maggiore contatto degli allievi con la natura e migliorarne le prestazioni scolastiche e il comportamento (vedi [link](#));
- per l'Intervento "*Summer School – Una montagna da imparare (IS 1.3)*", si sono svolte riunioni congiunte tra il Dipartimento Sovrintendenza agli Studi, l'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis e la Cooperativa individuata per l'organizzazione dell'iniziativa, nonché riunioni *online* rivolte alle famiglie dei ragazzi partecipanti per presentare l'organizzazione e il programma delle "*Summer School*".

L'apertura delle iscrizioni per le 3 edizioni delle "*Summer School*" del 2022 è stata pubblicizzata anche nel Canale tematico Europa del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta. L'edizione del 2023 è stata promossa anche attraverso il sito di Webécole (vedi [link](#)). Gli esiti delle "*Summer School*" tenutesi nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023 sono stati diffusi nella sezione del sito istituzionale dell'Unité, nella pagina dedicata all'Intervento (vedi [link](#));

- per l'Intervento "*Rafforzamento presidio medico Grand-Paradis (SN.1)*" non sono state avviate specifiche attività di informazione e di comunicazione, ma sono stati utilizzati i canali di comunicazione istituzionale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e gli strumenti di comunicazione condivisi tra i *partner* della Strategia d'Area. Gli obiettivi dell'Intervento sono stati diffusi anche tramite una notizia ANSA Valle d'Aosta (vedi [link](#)) e un articolo dedicato sulla stampa locale (vedi [link](#));

- per l'Intervento "*Unité in movimento per la salute (SN.2)*", oltre all'utilizzo dei canali di comunicazione istituzionale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, è stata creata un'apposita pagina sul sito istituzionale dell'Unité Grand-Paradis (vedi [link](#)) per promuovere le attività e gli appuntamenti in programma.

Sono stati organizzati, inoltre, eventi culturali e azioni di sensibilizzazione pensati per valorizzare il paesaggio (spettacoli teatrali itineranti, sessioni di yoga all'aperto, camminate accompagnate da performance musicali) ed è stato realizzato un *podcast* sulla base delle leggende scelte legate al territorio. Gli appuntamenti e le varie attività previste sono stati diffusi tramite rilanci periodici sulla stampa regionale *online*.

E' stato, inoltre, elaborato un logo dell'Intervento, utilizzato per il materiale di comunicazione e sono stati realizzati: dei *gadget* (magliette e sacche brandizzate, consegnate a tutti i partecipanti durante gli eventi); un pieghevole e la locandina dedicati all'Intervento e al calendario delle passeggiate previste.

In ognuno dei 13 Comuni dell'Unité sono stati posizionati altrettanti pannelli per segnalare il percorso delle passeggiate, riportanti la grafica coordinata utilizzata per tutti i materiali del progetto;

- per l'Intervento "*Assistant de hameau Grand-Paradis (SN3)*" sul sito istituzionale dell'Unité sono state realizzate tre diverse pagine dedicate alle attività realizzate nell'ambito della sanità e, nello specifico: "*Sanità: postazioni a Saint-Pierre e a Cogne per ridurre i tempi degli interventi d'urgenza*" (vedi [link](#)); "*Assistant de hameau: il nuovo servizio socio-sanitario*" (vedi [link](#)); "*Movimento e salute nelle comunità di montagna – Fare attività motoria come strumento di prevenzione*" (vedi [link](#)).

Sono stati realizzati, inoltre, volantini informativi/promozionali del servizio diffusi attraverso i canali istituzionali delle singole Amministrazioni comunali coinvolte, nonché lasciati presso punti strategici del territorio e presso le abitazioni dei nuclei familiari.

Il servizio è stato, anche, presentato e promosso direttamente presso alcuni nodi della rete del territorio quali le farmacie, i medici di base distrettuali, i volontari del soccorso, i Comuni, ecc. Nel mese di giugno 2025 è stato organizzato un evento di restituzione finale dell'Intervento, nel corso del quale è stato proiettato il video realizzato nell'ambito dell'Intervento, per restituire le esperienze raccolte durante il percorso progettuale, nonché per valorizzare il lavoro svolto e riflettere sulle prospettive future dei servizi di prossimità;

- per l'Intervento "*Riorganizzazione TPL – Trasporto a chiamata (MB.1)*" l'Unité Grand-Paradis ed Arriva Italia s.r.l. si sono occupate della pubblicità, promozione, divulgazione ed informazione del servizio. E' stata organizzata una conferenza stampa e sono state veicolate le informazioni mediante cartoncini pubblicitari e altre forme divulgative, tra cui il sito internet dell'Unité Grand-Paradis;

- per l'Intervento "*Riorganizzazione TPL- Corse scolastiche (MB.2)*", invece, è stata effettuata un'attività di comunicazione rivolta direttamente alle famiglie interessate.

Nella sezione del sito istituzionale dell'Unité sono state realizzate tre diverse pagine dedicate alle attività messe in atto nell'ambito dei trasporti e, nello specifico: "*Il trasporto a chiamata e*

la mobilità" (vedi [link](#)); "*La riorganizzazione delle corse scolastiche*" (vedi [link](#)); "*Nella Grand-Paradis si viaggia green*" (vedi [link](#)).

Per la promozione degli Interventi relativi allo sviluppo locale sono state predisposte diverse pagine nella sezione del sito istituzionale dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, dedicata alla SNAI e, nello specifico: "*Dare forza allo sviluppo locale*" (vedi [link](#)), nella quale sono indicate sommariamente le azioni svolte con il cofinanziamento dei Fondi europei; "*La connettività Internet come fattore di sviluppo*" (vedi [link](#)); "*Come procede la banda ultralarga Internet*" (vedi [link](#)); "*Valorizzare e rafforzare le competenze*" (vedi [link](#)); "*Turismo: dare forza alla natura e alle reti*" (vedi [link](#)); "*Più forza all'agricoltura*" (vedi [link](#)).

Si riportano, inoltre, le seguenti informazioni, suddivise per Programma di riferimento.

Programma FESR 2014/20:

Per l'Intervento "*Promozione partecipata Gran Paradiso: dai valore alla natura (SL.1)*" è stato realizzato un video per la promozione del territorio, presentato agli Amministratori e sulla pagina Facebook dell'Unité grazie ad una campagna in italiano, francese e inglese.

Programma FSE 2014/20:

Per presentare e promuovere le nuove opportunità di finanziamento relative agli "*Interventi per la formazione continua interaziendale del personale delle micro, piccole e medie imprese (SL.2.1)*" e agli "*Interventi per la formazione di giovani e adulti (SL.2.2)*", prima dell'approvazione dei relativi avvisi, sono stati organizzati incontri con gli enti di formazione valdostani accreditati e con le associazioni di categoria per recepire eventuali suggerimenti e/o necessità da mettere in atto. Ad avvenuta approvazione, gli avvisi sono stati promossi tramite locandine, attraverso il sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta, comunicati stampa e presso i Centri per l'impiego.

Programma FEASR 2014/22:

- per gli Interventi "*Sostegno agli investimenti (SL.3.1)*", "*Sostegno ai giovani agricoltori per investimenti nelle aziende agricole (SL.3.2)*", "*Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (SL.3.3)*" e "*Investimenti non produttivi – Recupero e manutenzione dei tradizionali muretti a secco (SL.3.4)*", l'azione è stata pubblicizzata sui principali canali di informazione (giornali, TV, testate online) tramite comunicati stampa. Per l'Intervento SL.3.4, inoltre, si sono svolti incontri di presentazione relativi agli avvisi e bandi, presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali, che hanno visto la partecipazione di associazioni e portatori di interesse;
- per l'Intervento "*Creazione e sviluppo di filiere corte (SL.3.6)*" il GAL Valle d'Aosta ha effettuato una capillare attività di animazione su tutto il territorio regionale finalizzata a invitare i potenziali Beneficiari a presentare proposte progettuali;
- l'attività di animazione e divulgazione dei bandi relativi all'Intervento "*Supporto alla cooperazione tra piccoli operatori agroalimentari e turistici (SL.3.7)*" è stata svolta dal GAL Valle d'Aosta, con il supporto di consulenti esterni, nel corso di 8 serate realizzate sul territorio regionale, rispetto alle quali una è stata realizzata nell'Area interna Grand-Paradis (a Introd il 14 febbraio 2019). Sono state, inoltre, diramate comunicazioni alle principali testate giornalistiche e ai mezzi di informazione e acquistati dei *banner* permanenti sulle principali testate *online*, per la durata dei bandi. In particolare, rispetto all'unico Progetto sul territorio

dell'Area progetto dell'Area interna Grand-Paradis, denominato "Green Vallée d'Aoste", si segnala che:

- sono stati predisposti un sito *internet* (vedi [link](#)) e una pagina *Facebook* (vedi [link](#)), in cui sono pubblicati aggiornamenti, foto e video rispetto alle attività realizzate dalla rete di imprese che attua il Progetto;
- nell'ambito della fiera *TTG Travel Experience 2020* di Rimini, il Progetto si è aggiudicato il 1° premio come "Miglior destinazione di turismo eno-gastronomico 2020", per la seguente motivazione: "Un esempio virtuoso di cooperazione fra il GAL e i piccoli operatori per l'utilizzo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale";
- oltre a promuovere il Progetto attraverso i propri canali, la rete di imprese ha realizzato un video e una brochure promozionali e dei *post* dedicati alle aziende e ha posto la propria attenzione alla promozione del territorio regionale (musei, castelli, centri benessere, ecc.). Nel corso del 2024 le attività di comunicazione e di promozione dell'Intervento sono proseguite con risorse proprie della rete di imprese e al 31 dicembre risultavano attivi e aggiornati: il sito internet della rete, la pagina Facebook e il profilo Instagram;
- i bandi relativi agli Interventi concernenti la gestione e la valorizzazione delle foreste (Interventi SL.3.9 e SL.3.10) sono stati pubblicizzati sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta e sui quotidiani locali. Sono stati realizzati, inoltre, una serie di incontri sul territorio al fine di coinvolgere i portatori di interesse (proprietari, imprese e professionisti) nella creazione di una filiera legno.
